



Raporti i vitit 2019

Gusht, 01.-31.08.2019

1. Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave

Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave gjatë muajit gusht 2019, ka kryer këto aktivitete: Kërkesat për hartimin e detyrave projektuese dhe identifikimin e nevojave, shqyrtimi i kërkesave të banorëve të bashkësive lokale dhe inkorporimi i tyre në planet e Komunës, njoftimi me kohë i kompanive publike dhe subjekteve relevante, me qëllim të koordinimit të punëve, incizimi i gjendjes ekzistuese të infrastrukturës në qytetin e Prishtinës, si dhe kompletimi i dokumentacionit teknik për procedimin e tyre në organet kompetente, mbikëqyrja e realizimit të projekteve konform marrëveshjes etj.

1.1. Shqyrtimi i kërkesave

Gjatë muajit gusht 2019, Drejtoria ka proceduar 148 kërkesa të ndryshme të bashkësive lokale dhe banorëve: për ndërtimin e rrugëve, trotuareve dhe kanalizimeve, kërkesa për rregullimin e rrugëve dhe kanalizimeve, kërkesa nga kompanitë publike - leje për gropim dhe intervenime për sanimin e defekteve të ndryshme, kërkesa nga kompanitë për formime të komisioneve për kontrollimin e punëve, kërkesa të natyrave të ndryshme rreth definimit të zgjidhjes në terren etj. Nga numri i përgjithshëm prej 148 kërkesave të pranuar, 4 janë të papërfunduara.


1.2. Dërgimi i kërkesave për hartimin e detyrave projektuese dhe identifikimi i nevojave

Duke marrë për bazë Ligjin mbi planifikimin hapësinor, Ligjin mbi ndërtimin e objekteve investive, si dhe Ligjin për projektim, e në veçanti planet rregulluese, janë dërguar kërkesat për hartimin e detyrave projektuese për këto rrugë në zonat urbane dhe rurale.



1.3. Raportimi i menaxherëve të projekteve infrastrukturore

Drejtoria	Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave
Sektori	Menaxhimi i kontratave (Ndërtimi i ulët)
Drejtori	Gëzim Mehmeti, jurist
Raportoi	Dukagjin Buçaj, idn. – UD i shefit të Sektorit
Kontrolloi – Përpunoi	Muhamed Emra, idn - zyrtarë i lartë për ndërtim urban
Periudha raportuese	01- 31.08.2019, muaji gusht
Menaxhëret e projekteve	Ibrahim Gervalla Muhamed Emra Afërdita Hasimi Zyhrie Pllana Fevzi Jetullahu Irfete Zejneli Fatmir Uka Halil Fejziu Imer Mavriqi Syzana Pllana Qazim Bajrami Besim Qelaj Jeton Zherka Krenar Xhaferi
Organi mbikëqyrës	Azem Buzuku Aferdita Sopi Behxhet Gashi Ramadan Nebiu Hazir Krasniqi Amire Krasniqi

 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 01					
Projekti :	Ndërtimi i parkut në lagjen “Mati”	Vlera e projektit: 153.787,24 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik 80 ditë					
Operatori :	<i>NTP “Ulpiana”</i>	Nr.616 18 076 521 dt. 05.10.2018					
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra, idn	Projekti i vitit : 2018					
Organi mbikëqyrës	Bujar Rama, idgj. Zyhrije Pllana, ida. Amire Krasniqi, ide. Krenar Xhaferi, idh.						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> Gërmimi, planifikimi i terrenit te fushës afër xhamisë; Tamponizimi i fushës dhe shtigjeve të këmbësorëve me tampon 0-63mm; Vendosja e skajoreve 10/20cm të fushës dhe shtegut për këmbësor; Ndërtimi i rampave nga pllaka betonarme C-25/30. 					
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> Përgatitja e skajoreve 10/20 cm dhe kubzeve të betonit 					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
Vonesat Shkalla e cilësisë		--			Mesatar		
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë		<p>Punimet tash për tash janë ndërprerë për kohësisht, përshkak të pengesave të banorëve të lagjes, kontestit pronëso- juridik, uzurpimit të pronës shoqerore.</p> <p>Më 02.05.2019, kemi kërkuar, përmes shkresës zyrtare, përkrahje nga njësitë policor përmes Drejtorisë së Inspeksionit, mirëpo nuk kemi marrë përgjigje.</p> <p>Më 16.07.2019, operatori ka tentuar që të rifillojë punimet, mirëpo pa sukses, prap kemi hasur në pengesa te banorëve.</p> <p>Më 16.07.2019, përmes shkresës elektronike, kemi kërkuar asistencë në terren nga Drejtoria Rajonale e Policisë në Qendër dhe Dardani, mirëpo nuk kemi marrë përkrahje me arësye përshkak të kontestit gjyqësor.</p> <p>Më 22.07.2019, përmes shkresës zyrtare kemi kërkuar përsheptimin e lëndës, gjegjësisht kontestit gjyqësor përmes Zyres ligjore –Sektorit ligjor</p>					
Vlerësimi i progresit në projekt		Punimet tash për tash janë ndërprerë për kohësisht përshkak të pengesave të banorëve të lagjes.					
































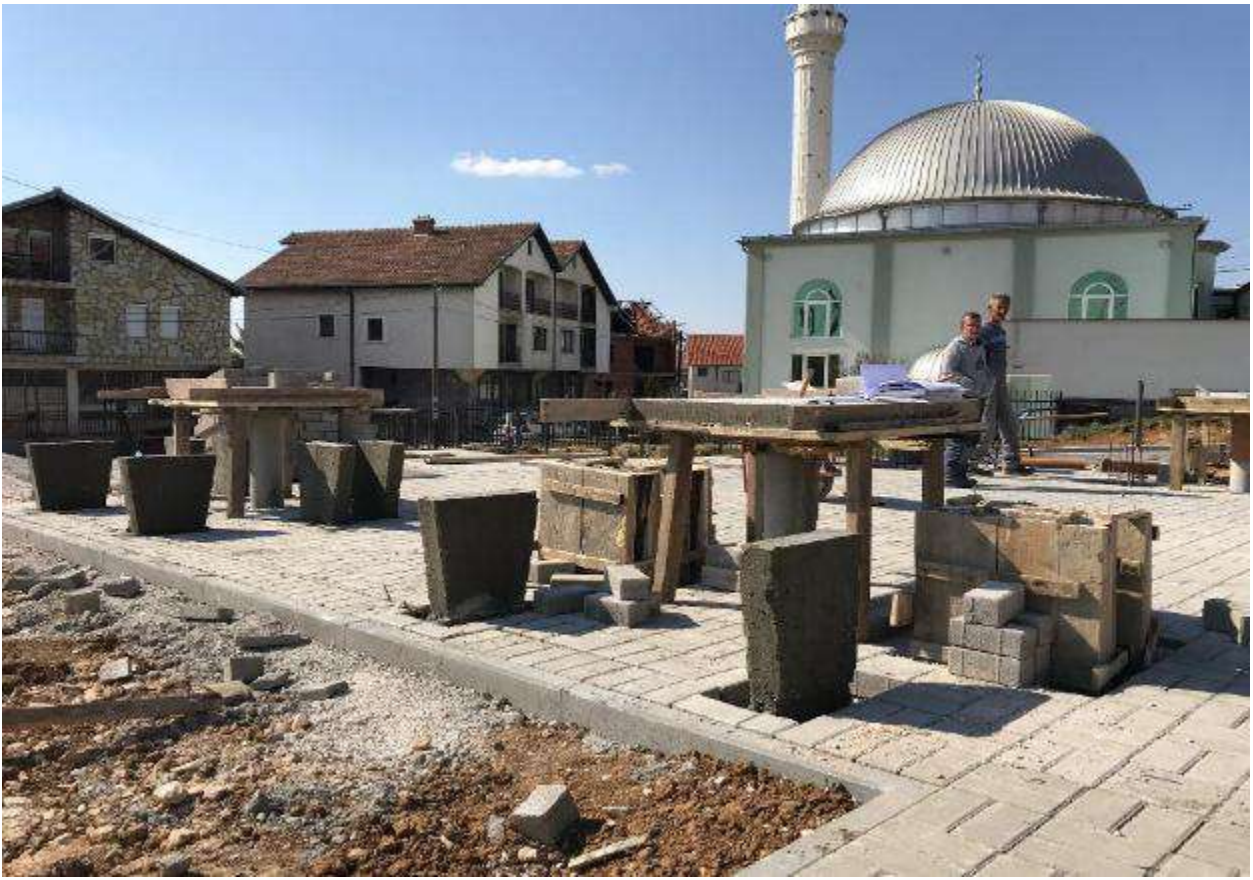






RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 02					
Projekti :	<i>Ndërtimi i rrugës “Elez Berisha“ te qendra tregtare “Avori”</i>	Vlera e projektit: 80.506,30 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik 60 ditë					
Operatori :	SHPK “Rexha”	Nr.616 18 140 521 dt. 01.03.2019					
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra idn ;	Projekti i vitit: 2019					
Organi mbikëqyrës	Behxhet Gashi, tek.i ndert. Hazir Krasniqi, tek.gjeod.						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara						
	Punët në realizim						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
Vonesat Shkalla e cilësisë		--			Mesatar		
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë		<p><i>Ju njoftojmë se është nënshkruar kontrata për ndërtimin i infrastrukturës nëntokësore, gjegjësisht rrjeti i kanalizimit fekal, rrjeti i kanalizimit atmosferik, si dhe rrjeti i ujësjellësit.</i></p> <p><i>Me rastin e përfundimit të kontratës (rrjetit të kanalizimit fekal, atmosferik dhe atë të ujësjellësit) në fjalë, atëherë ne do të fillojmë me zbatimin e kontratës:</i></p> <p>“Ndërtimi i rrugës “Elez Berisha “ te qendra tregtare “Avori “</p> <p><i>Sipas projektit të paraparë në bazë të paramasës dhe paralogarisë.</i></p>					
Vlerësimi i progresit në projekt		Punimet nuk kanë filluar ende për ekzekutim.					

RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 03					
Projekti :	Sanimi me zhavorr i rrugëve sekondare në territorin e komunës së Prishtinës	Vlera e projektit: 89.160,00€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik: Kontratë njëvjeçare					
Operatori :	NTP "Bashkimi", Koliq - Prishtinë	Inspektimi: Mjaft i shpeshtë					
Menaxheri i projektit :	*Imer Mavriqi idn ;	Projekti i vitit : 2019					
Organi Mbikëqyrës	Behgjet Gashi, tek. i ndërt., Azem Buzuku, tek. i ndërt.						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Gjatë muajve prill, maj, qershor dhe korrik, kanë përfundue disa rrugë me zhavorr dhe është realizuar situacioni i parë, kurse në muajin maj janë kryer disa rrugë, pastaj është realizuar sit. i dytë në qershor dhe situacioni i tretë në muajin korrik.					
	Punët në realizim	Gërmime, ngjeshje, pastaj mbushje me zhavorr, planifikim dhe ngjeshje të rrugëve sekondare					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		€16.800,00	14.800€	8.820€	000.0€	000.0€	000.0€
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë		Projekti është duke u realizuar sipas planit dinamik dhe është kontratë kornizë njëvjeçare. Ky raport dërgohet për muajin korrik.					

 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 04					
Projekti :	Zhvendosja vertikale e gypit metalik të sistemit të ujitjes "Iber Lepenc" në lagjen "Kalabria"	Vlera e projektit: 43,893.60 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik 15 ditë					
Operatori :	"K-ing" SHPK	Nr 616-18-7780-5-2-1 dt. 11.12.2018					
Menaxheri i projektit :	Syzana Pllana	Projekti i vitit 2019					
Organi mbikëqyrës :	Zyrije Pllana, Behxhet Gashi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Pastrimi dhe thellimi i kolektorit, prerja e gypit, si dhe përgatitja e hapësirës për vendosjen e gypit të ri.					
	Punët në realizim						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	
		0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	
		Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	
Vonesat Shkalla e cilësisë		--			Mesatar		
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë	<input checked="" type="checkbox"/> Është obliguar operatori nga organi mbikëqyrës që të rritë kapacitetin dinamik të punimeve, si dhe të bëjë sigurimin e punishtës.						
Vlerësimi i progresit në projekt	<input checked="" type="checkbox"/> Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik						

*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve



 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 05					
Projekti :	<i>Ndërtimi i rrugëve në brendësi të fshatit Slivovë</i>	Vlera e projektit: 99,385.36 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik 60 ditë					
Operatori :	<i>NTP "BASHKIMI" Koliq, Prishtinë</i>	<i>Nr.616 17 146 521</i> <i>dt. 12.02.2018</i>					
Menaxheri i projektit :	Qazim Bajrami nga DIKMK	Projekti i vitit : 2018					
Organi mbikëqyrës:	Bujar Rama, Ramadan Nebihi nga DIKMK						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Piketimi i trasesë sipas projektit, gërmimi, mbushja, tamponi, lëshesat, asfaltimi i shtresës së parë, asfaltimi i shtresës së dytë, sinjalizimi horizontal dhe vertikal					
	Punët në realizim	-					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni I	Situacioni II	Situacioni III	Situacioni IV	Situacioni V	Situacioni VI
		50,000.00 30/05/19	43,833.31€				
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt		Janë përfunduar të gjitha punimet, është mbyllur kontrata. Vlera totale e punëve të përfunduara: 93,833.31€					









PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 06
Projekti :	Asfaltimi iu rrugës Matiqan-Butovc-Kolovicë	Vlera e projektit: 782.656,12 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik 90 ditë					
Operatori :	NPSH "Bageri"	<i>616 18 3470 512 dt. 09.11.2018</i>					
Menaxheri i projektit :	Qazim Bajrami nga DIKMK	Projekti i vitit : 2018					
Organi mbikëqyrës :	Sevdije Drenovci , Afërdita Sopi nga DIKMK						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Piketimi i trasesë sipas projektit kryesor, piketimi i trasesë sipas projektit të ekzekutuar, gërmimi, furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit fr.0-63mm, hapja e kanaleve, ndërtimi i kanalizimit atmosferik, furnizimi, planifikimi dhe ngjeshja e tamponit fr.0-31mm. Asfaltimi i shtresës së parë, asfaltimi i shtresës së dytë, muri mbrojtës, skajoret dhe rigolla, sinjalizimi horizontal dhe vertikal.					
	Punët në realizim	-----					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni I	Situacioni II	Situacioni III	Situacioni IV	Situacioni Perfundimt.	
		400,000.00 10/04/2019	100,000	100,000	80,000.00	94,143.66€	
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt		Janë përfunduar punimet, është mbyllur kontrata. Vlera e punëve të realizuara: 774,143.66€					









PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 07	
Projekti :	Rikonstruktimi i rrugëve “Drenica”, “Ukshin Hoti”, “Robert Doll” dhe asfaltimi i shtresës së fundit të mbistrukturës së rrugës “Enver Maloku”					Vlera e projektit: 165,185.50 €		
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik : 100 ditë		
Operatori :	“Rahovica Commerce” SHPK, rr. “Ahmet Kaçiku”, Ferizaj					616 18 070 521 dt. 05.03.2019		
Menaxheri i projektit :	Qazim Bajrami nga DIKMK					Projekti i vitit : 2018		
Organi mbikëqyrës:	Fevzi Jetullahu ,Hazir Krasniqi nga DIKMK							
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Janë asfaltuar rrugët “Ukshin Hoti”, “Robert Doll”, “Enver Maloku” dhe “Drenica”						
	Punët në realizim	-----						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni I	Situacioni II	Situacioni Përfund.				
		50,000.00 31/05/2019	50,000.00	60,152.50€				
Vonesat Shkalla e cilësisë								
Rekomandime masat për tu ndërmarrë								
Vlerësimi i progresit në projekt		Janë përfunduar punimet, është mbyllur kontrata, vlera totale e punëve të realizuara: 160,152.50€						









RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 08				
Projekti :	Rikonstruktimi i rrugëve "Holger Petersen" dhe "Ulëza"	Vlera e projektit: 153,598.30 €				
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 60 ditë				
Operatori :	NPSH "Bageri"	Nr.identifikues: 616 18 068 521				
Menaxheri i projektit :	Jeton Zherka	Projekti i vitit 2018				
Organi mbikëqyrës :	Bujar Rama, Behxhet Gashi					
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë						
Vëllimi fizik	Punët e parapara	-Rikonstruktimi i rrugës "Holger Petersen" në gjatësi prej 995m', dhe rrugës "Ulëza", në gjatësi prej 990m'; - Demolimi, heqja e asfaltit të vjetër, pllakëzave të trotuarit, ngritja e kapakëve të pusetave; -Shtrimi dhe ngjeshja e zhavorrit, shtrimi i asfaltit.				
	Punimet në realizim-vërejtjet	- Ngjeshja e bankinave në rrugën "Ulëza"; - Pastrami i ujëmbledhësve; - Nivelimi i kapakëve të pusetave.				
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni i pare qershor 2019	Situacioni I dytë korrik 2019	Situacioni	Situacion	Situacioni
		50,.000.00	50,.000.00			
Vonesat Shkalla e cilësisë	/		Mesatare			
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë	Është obliguar OE të zbatojë paramasën e punëve – kontratën					
Vlerësimi i progresit në projekt	Mesatar					





RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 09					
Projekti :	Vazhdimi i ndërtimit të rrugës Sharban - Koliq	Vlera e projektit: 402,097.12€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë					
Operatori :	„Beni Construction” SHPK dhe „Saba Belca” Dega në Kosovë, me lider „Beni Construction” SHPK	nr.identifikues: 616 18 109 511					
Menaxheri i projektit :	Jeton Zherka	Projekti i vitit 2018					
Organi mbikëqyrës	Zyhrije Pllana, Sevdije Drenovci						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e parapara	<ul style="list-style-type: none"> - Ndërtimi-asfaltimi i rrugës, në gjatësi prej 6259 m; - Punimi i lëshesave, pjesëve kaluese, kanaleve të mbyllura, rigolave prej asfaltit; - Planifikimi dhe ngjeshja e asfaltit; - Realizimi i sinjalizimit horizontal – vija e mesit të rrugës; - Montimi i shenjave të trafikut. 					
	Punimet në realizim-vërejtjet						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduar a)	Situacioni i parë	Situacioni i dytë	Situacioni i tretë	Situacioni I katërt	Situacioni	
		50,000.00	50,000.00	150,000.00	151,262.20€		
Vonesat Shkalla e cilësisë		/			Mesatare		
Rekomandime masat për tu ndërmarrë		Është obliguar OE të zbatojë paramasën e punëve - kontratën					
Vlerësimi i progresit në projekt		Mesatar					





RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 10				
Projekti :	Rrethrotullimi "Lakrishta" - Rrethrotullimi "Arbëria"	Vlera e projektit: 1,149,998.87€				
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë				
Operatori :	OE "RSM Company" SHPK	nr.identifikues: 616 18 3326 512 616 18 010 512				
Menaxheri i projektit :	Jeton Zherka	Projekti i vitit 2018				
Organi mbikëqyrës :	Imer Mavriqi, Amire Krasniqi, Krenar Xhaferi, Ramadan Nebihi, Hazir Krasniqi					
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë						
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	- Mihja e dheut – pjesërisht.				
	Punët në realizim e sipër – vërejtjet	Vërejtje: Punët kanë filluar më 04.03.2019 dhe janë ndërprerë me 11.03.2019 për shkak të pengesave nga ndërhyrja e Hekurudhave të Kosovës				
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacionet e paguara	Situacioni	Situacioni	Situacioni	Situacioni
Vonesat Shkalla e cilësisë	/			Mesatare		
Rekomandime masat për t'u ndërmarrë	Është njoftuar Drejtorati i Prokurimit për probleme pronësore-juridike.					
Vlerësimi i progresit në projekt	Projekti është ndërprerë për shkak problemeve pronësore juridike					

RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 11					
Projekti:	Rikonstruktimi i rrugës dhe trotuareve në rrugën "Sheshi i Arbrit"	Vlera e projektit: 127,035.84€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë					
Operatori :	SHPK "Rexha Company"	nr.identifikues: 616 18 134 521					
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla	Projekti i vitit 2019					
Organi mbikqyrës :	Besim Qelaj, Behgjet Gashi						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e parapara	-Demolimi i shtresës së vjetër të rrugës (kubzet) dhe zëvendësimi i tyre me shtresa asfalti, si dhe rregullimi i trotuarëve të dëmtuar.					
	Punët në realizim e sipër	-Punimet janë në fazën përmbyllëse.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduar a)	Situacioni 1	Situacioni 2	Situacioni 3			
		30,000.00€	30,000.00€	30,000.00€			



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 12				
Projekti :	Ndërtimi i rrugës “Dëshmorët e Sharbanit”	Vlera e projektit: 184.538.08€				
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik: 90 ditë				
Operatori :	NTP,,Bashkimi”	nr.identifikues: 616 18 151 521				
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla	Projekti i vitit 2019				
Organi mbikëqyrës :	Irfete Zeneli, Syzana Pllana					
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë						
Vëllimi fizik	Punët e parapara	-Rregullimi i rrugës (me shtresa asfalti) me gjithë infrastrukturën përcjellëse				
	Punët në realizim e sipër	-Punimet janë në realizimin e infrastrukturës nëntoksore dhe murit mbrojtës nga betoni				
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni 1				
		50,000.00€				




RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 13				
Projekti :	Ndërtimi i rrugës „Dëshmorët e Gollakut” në Hajvali	Vlera e projektit: 85.092.25€				
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 60 ditë				
Operatori :	NTP “Co- Ing”	nr.identifikues: 616 19 058 521				
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla	Projekti i vitit 2019				
Organi mbikëqyrës:	Sevdije Drenovci, Behgjet Gashi					
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë						
Vëllimi fizik	Punët e parapara	-Rikonstruktimi i trotuarëve dhe rigollës				
	Punët në realizim e sipër	- Punimet janë në realizimin rikonstruimeve të trotuarëve				
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni 1				




RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 14				
Projekti :	Sanimi i rrugëve dhe ndërtimi i mureve në lagjet “Vreshta” dhe “Kodra e Trimave”	Vlera e projektit: 138.637.61€				
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë				
Operatori :	SHPK “Saba Belqe”	nr.identifikues: 616 18 9240 521				
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla	Projekti i vitit 2019				
Organi mbikqyrës :	Besim Qelaj, Ramadan Nebihi					
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë						
Vëllimi fizik	Punët e parapara	-Rikonstruktimi i rrugëve dhe ndërtimi i mureve mbrojtëse				
	Punët në realizim e sipër	-Punimet janë në realizimin e rikonstruktimit (asfaltimit) të rrugëve në lagjen “Vreshta”				
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni 1				
		50,000.00€				




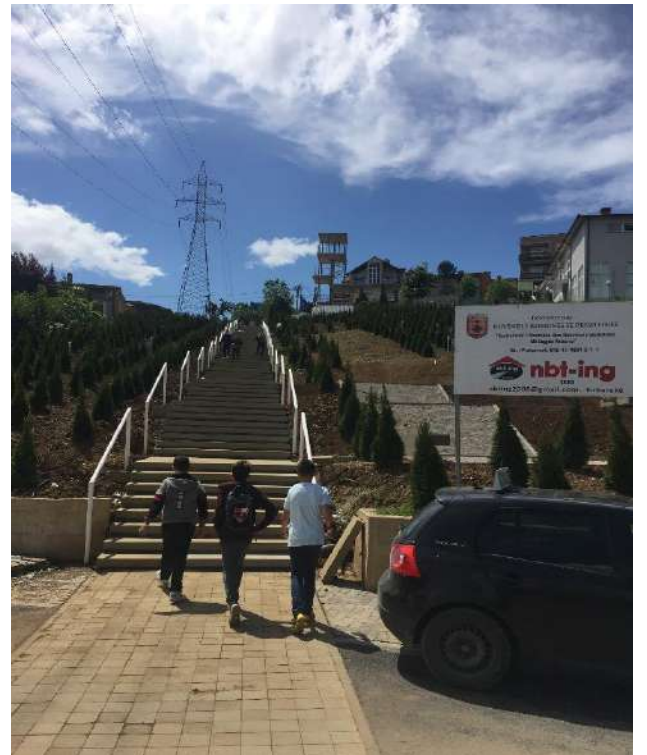
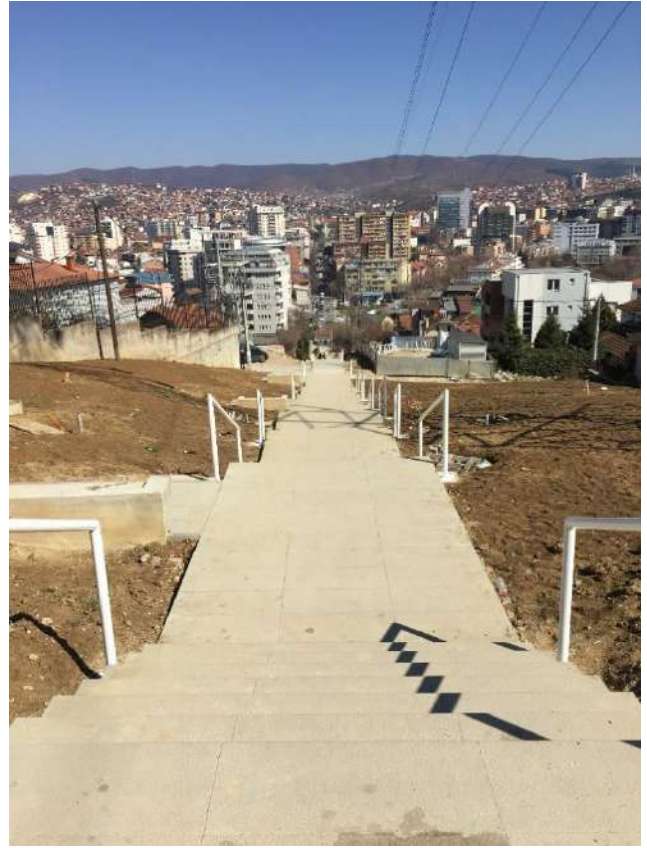
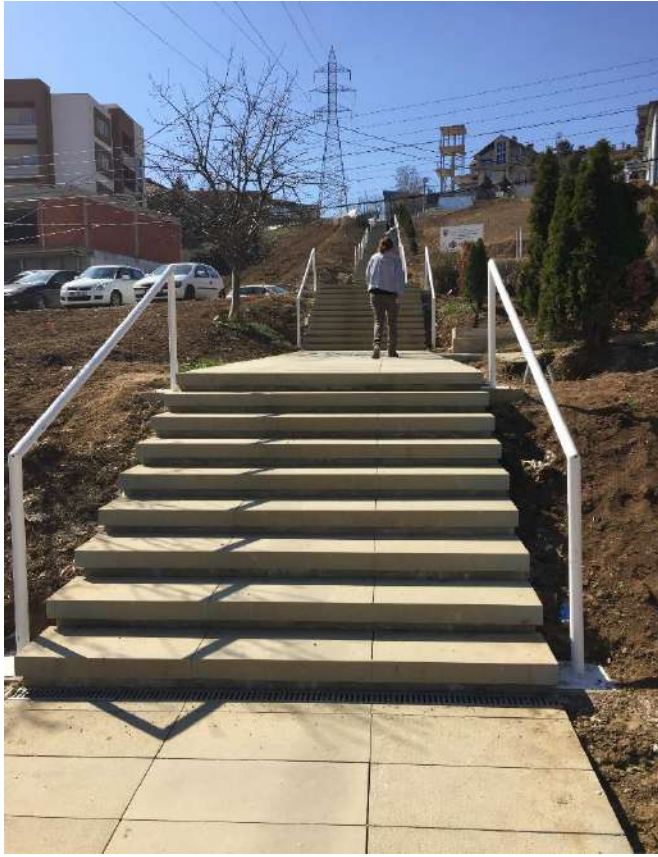
 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 15					
Projekti :	Ndërtimi i rruges nga Flotacioni, lagja “Vakoc”, Marevc	Vlera e projektit: 572,778.14 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë					
Operatori :	NTP “Bashkimi”, NT “Rahovica Commerce”, “ECO GROUP” SHPK	Nr 616 18 108 511 dt. 23.11.2018					
Menaxheri i projektit :	Afërdita Hasimi	Projekti i vitit 2018					
Organi mbikëqyrës :	Besim Qelaj, Sevdije Drenovci						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Shtresim i trasesë me zhavorr 0-32mm.					
	Punët në realizim	Ngjeshje e trasesë, përgaditje për asfalt.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
		Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	Situacioni (XII)
Vonesat Shkalla e cilësisë	Punimet janë duke u kryer me një intensitet të dobët						
Rekomandime masat për tu ndërmarrë	☞ Vërejtje me shkrim për dinamikën e punimeve: ditarët ndërtimor, email.						
Vlerësimi i progresit në projekt	☞						

 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 16					
Projekti :	Ndërtimi i rrugës në Marevc, Vidime - Lumi i Marevcit, te xhamia e fshatit	Vlera e projektit: 85,161.24 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 60 ditë					
Operatori :	“EUROFAMIS” SHA	Nr 616 19 056 521 dt.27.05.2019					
Menaxheri i projektit :	Afërdita Hasimi	Projekti i vitit 2019					
Organi mbikëqyrës :	Besim Qelaj, Sevdije Drenovci						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Shtresim i trasesë me zhavorr 0-32mm.					
	Punët në realizim	Ngjeshje e trasesë, përgaditje për asfalt.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		20,000.00€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
		Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	Situacioni (XII)
Vonesat Shkalla e cilësisë	Punimet janë duke u kryer sipas paramasës dhe paralogarisë						
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë	☞ Vërejtje me shkrim për dinamikën e punimeve: ditarët ndërtimorë, email.						
Vlerësimi i progresit në projekt	☞						

 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 17					
Projekti :	Ndërtimi i bazës së monumentit “New Born”	Vlera e projektit: 14,347.08 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë					
Operatori :	NTSH “MEGRANT ING”	Nr 616 19 001 521 dt.11.03.2019					
Menaxheri i projektit :	Afërdita Hasimi	Projekti i vitit 2019					
Organi mbikëqyrës :	Ramadan Nebihi, Azem Buzuku						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Asnjë aktivitet nuk ka filluar					
	Punët në realizim						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
		Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	Situacioni (XII)
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt							

		<h1 style="text-align: center;">RAPORTI MBIKËQYRËS</h1>					SHIFRA <h1 style="text-align: center;">18</h1>	
Projekti :	Ndërtimi i rrugëve ne Bardhosh, te FSK-ja dhe rreth hekurudhës					Vlera e projektit: 74,610.35 €		
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik : 60 ditë kalend.		
Operatori :	KNPSH “Papenburg & Adriani Company”					Nr 616 19 033 511 dt.25.07.2019		
Menaxheri i projektit :	Afërdita Hasimi					Projekti i vitit 2019		
Organi mbikëqyrës :	Sevdije Drenovci, Ramadan Nebihi							
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Pritja e marrjes se lejes nga DU						
	Punët në realizim							
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)	
		0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	
		Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	Situacioni (XII)	
Vonesat Shkalla e cilësisë								
Rekomandime masat për tu ndërmarrë								
Vlerësimi i progresit në projekt								

 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 19					
Projekti :	Revitalizim i shkallëve dhe ndërtimi i mbikalimit në lagjen “Arbëria”	Vlera e projektit: 463 262.41 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 120 ditë					
Operatori :	“NBT-ING” SHPK	Nr.616-17-4891-511 dt. 05.02.2018					
Menaxheri i projektit :	Dukagjin Buçaj	Projekti i vitit 2018					
Organi mbikëqyrës :	Fevzi Jetullahu, Hazir Krasniqi, Jeton Zherka, Azem Buzuku, Abdurrahman Krasniqi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> • Punët përgatitore; • Punët e gurit; • Punët metalike; • Kanalizimi atmosferik dhe rrjeti i furnizimit me ujë për ujitje për projektin e shkallëve dhe mbikalimit; • Rrjeti i ujësjellësit dhe sistemi i ujitjes; • Punët e ndërtimit të rezervuarit 1 dhe 2; • Punët e elektrikes, pjesërisht; • Punët e gjelbërimit; • Punët e lodrave, ulëseve janë në perfundim. 					
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> • Vazhdimi i punimeve në këndin e lodrave; • Vazhdimi i punëve elektrike; • Punët e mbjelljes së barit; • Punët e montimit të lodrave dhe ulëseve. 					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50 000.0€	52 875.15€	50 000.0€	50000.0€	0.0€	0.0€
Vonesat Shkalla e cilësisë		Punimet kanë përfundur, cilësia e kënaqeshme.					
Rekomandime, masat për t'undërmarrë		<ul style="list-style-type: none"> ☞ Punimet të cilat kanë mundur të realizohen kanë përfunduar; ☞ Duhet të bëhen matjet dhe të pregaditet dokumentacioni për përfundimin e kontratës. 					
Vlerësimi i progresit në projekt		Kanë përfunduar të gjitha punimet të cilat kanë mundur të realizohen.					





 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 20				
Projekti :	Ndërtimi i rrugës Butovc - Mramor, rruga "Azem Sopi", faza I	Vlera e projektit: 117,656.44 €				
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë kalendarike				
Operatori :	NNT "Burimi "	Nr.616 19 1823 521 dt. 14.06.2019.				
Menaxheri i projektit :	Dukagjin Buçaj	Projekti i vitit 2019				
Organi mbikëqyrës :	Hazir Krasniqi, Bashkim Statovci					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara						
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Janë bërë punët e demolimit, piketimi i trasesë, gërmimi, si dhe mbushja me material guror.				
	Punët në realizim	Vendosja e gjeotekstitit, lëshesat tërthore, si dhe tamponizimi.				
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)
		0.00€	0.00€	0.00€		
Vonesat Shkalla e cilësisë	Nuk ka vonesa, duke marrë parasysh punimet që janë duke u zhvilluar. Cilësia është e kënaqshme					
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë	☞ Ngjeshja, tamponizimi i rrugës si dhe asfaltimi.					
Vlerësimi i progresit në projekt	Progresi i punëve është i kënaqshëm.					

*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve





Komuna e Prishtinës
RAPORTI MUJOR

Drejtoria	Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave
Sektori	Menaxhimi i kontratave për ndërtimit të lartë
Periudha raportuese	Gusht, 2019
Emri dhe mbiemri i raportuesit	Ferit Fazliu, udhëheqës i Sektorit

- PËRMBLEDHJE**

Ky sektor në bazë të detyrave programore, kryesisht është marrë me përpunimin e lëndëve me problematikë të ndërtimit, hartimin e detyrave projektuese, mbikëqyrjen e projekteve, mbikëqyrjen e objekteve, hapjen dhe vlerësimin e tenderëve , pjesëmarrje në komisionet e caktuara nga Kryetari i Komunës dhe drejtori i Drejtorisë për lëmin e ndërtimit dhe veprimtari të tjera që kanë të bëjnë me këtë sektor.

- AKTIVITETET E PLANIFIKUARA PËR VITIN 2019**

Për vitin 2019, janë planifikuar këto aktivitete të Sektorit për menaxhimin e kontratave të ndërtimit të lartë, e që janë dhe pjesë e aktiviteteve të Drejtorisë:

- Pjesëmarrje në hapjen dhe vlerësimin e tenderëve;
- Mbikëqyrje e kontratave të ndërtimit të lartë të projekteve që investon Komuna, ose investues të tjerë për nevoja të Komunës:
 - Rritja e efikasitetit dhe kualitetit në realizimin e kontratave,
 - Realizimi i planit dinamik dhe ruajtja e buxhetit;
- Përgatitja e raportit mujor dhe vjetor;
- Këshillimi i drejtorit dhe sektorëve të tjerë për çështjet e ndërtimit dhe
- Aktivitete të paplanifikuara, me kërkesë të organeve të Komunës.

- **AKTIVITETET E REALIZUARA**

Gjatë këtij muaji janë ekzekutuar këto aktivitete:

- Zgjedhja e lëndëve sipas kërkesave të palëve:
 - të pranuarra gjatë këtij muaji - 12 lëndë,
 - të zgjidhura - 12 lëndë;
- Vlerësim të kontratave - 4.

Gjithsej vlera e kontratave që janë në menaxhim të këtij sektori është 5.077.962,62 €

3,479,922.37 €


të paguara deri më tani janë

1,598,040.25 €

Nga këto:

- 9 projekte kanë përfunduar, 3 projekte nuk kanë filluar fare, për shkak të pronës, 1 kontratë “Renovimi i objekteve të trashëgimisë kulturore: Shtëpi banimi Sali Savqi dhe Shkolla e parë shqipe”; Shkolla e parë shqipe është përfunduar, ndërsa objekti-shtëpia e Sali Savqit nuk është punuar për shkak të jo stabilitetit të objektit.

KONTRATAT KORNIZË

1. Mirëmbajtja e elektrikës në shkolla, kontratë kornizë 3-vjeçare	
Gjatë muajit mars 2019, sipas kontratës “Mirëmbajtja e elektrikës në shkolla” është intervenuar në këto institucione:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SHFMU “Hilmi Rakovica” dhe 2. SHFMU. “Tefik Qanga”. 	
Nr. i kontratës dhe data:	Nr. 616 16 099 211, dt. 02.09.2016.
Vlera e projektit:	63,228.30€ për tri vjet (21,076.10 € për një vit)
Investuesi:	Komuna e Prishtinës
Kontraktori:	Konzorciumi “Light and More” SHPK dhe NTSH “Monting” me lider “Light and More” SHPK nga Prishtina
Të paguara:	60,086.34 €
Fotot e ekzekutimit të punimeve	
	



2. "Furnizimi, montimi dhe servisimi i gjeneratorëve", kontratë kornizë 3-vjeçare	
Gjatë muajit prill 2019, përmes kontratës "Furnizimi, montimi dhe servisimi i gjeneratorëve", është punuar në këto institucione:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SHFMU "Nëna Terezë" - Teneshdoll, 2. SHFMU "7 Marsi" - Prishtinë, 3. SHFMU "Model" - Prishtinë. 	
Nr. i kontratës dhe data:	Nr. 616 18 147 211, dt. 05.03.2019.
Vlera e projektit:	95,499.76€ (kontrate njevjeçare)
Investuesi:	Komuna e Prishtinës
Kontraktori:	"Contanti Generators" SHPK, Fushë-Kosovë
Vlera e projektit e realizuar:	Ende nuk është proceduar asnjë pagesë
Fotot e ekzekutimit të punimeve	

Bazamentet e vendosjes se gjeneratoreve



KONTRATAT QË VAZHDOJNË NGA VITET PARAPRAKE DHE TË KËTIJ VITI

3. Rregullimi i oborreve të shkollave: SHFMU "Elena Gjika" dhe SHFMU "Dardania"	
Janë realizuar punime në rregullimin e oborreve të shkollave SHFMU "Elena Gjika" dhe SHFMU "Dardania".	
Vlera e projektit:	107,777.77€, për 90 ditë
Nr i kontratës dhe data.	Nr. 616 18 105 521, dt. 03.10.2018
Operatori ekonomik:	"ULPIANA", Prishtinë
Të paguara	31,850.90 €
Mbarëvajtja e punimeve:	Projekti ka përfunduar
FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE	



4. Ndërtimi i sallës së edukates fizike të shkollës "Avni Rrustemi", Mramor	
Janë realizuar punime në ndërtimin e sallës së edukates fizike të shkollës Avni Rrustemi në Mramor	
Vlera e projektit:	167,257.80€, për 150 ditë
Nr. i kontratës dhe data.	Nr. 616 18 095 521, dt. 23.10.2018
Operatori ekonomik:	"A-CON", Prishtinë
Të paguara	167,215.00€
Mbarëvajtja e punimeve:	
<p>Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara:</p> <p>- Suvatimi i mureve të brendshme në tërësi dhe plafonit me llaq të vazhduar, si dhe me llaq cimentoje; Betonimi i shtresës rrafshuese të dyshemesë t=6 cm; Vendosja e dyshemesë prej dërrasavenë në gjithë sipërfaqen e kulmit; Furnizimi dhe instalimi i dýerve nga PVC profil, 80/210; Furnizimi dhe instalimi i dritarevenga PVC profil, 560/80; Punët dhe vendosja e gardhit në shkallët dhe rampa; Furnizimi me material, si dhe punimi i dyshemesë me masë nivelizuese, me trashësi deri në 2 cm; Furnizimi me material, si dhe punimi i dyshemesë me epoksit; Furnizimi me material, si dhe shtruarja e dyshemesë hetrogjene PVC, me trashësi 6.7mm në sallën e sportit; Furnizimi me material, si dhe punimi i vijave për basketëboll dhe volejboll; Furnizimi dhe montimi i pllakave të qeramikës me ngjitës në dysheme dhe mure të toaleteve dhe banjove; Furnizimi dhe montimi i pllakave të granitit natyral në platonë në hyrje të objektit, rampë për hendikep dhe shkallë, trashësia t=20mm; Gletimi i mureve dhe tavaneve me glet masë në min dy shtresa; Ngjyrosja me bazë në dy shtresa për mure dhe tavane; Ngjyrosja për mure dhe tavanit në tri shtresa; Punimi i fasadës termike me stiropor N3, me trashësi 10cm-mveshja e brezit shtangues.</p> <p>PUNËT E ELEKTRIKES:</p> <p>-Kabloja furnizuese NAYY4x16mm² +P 1x10mm²; Kuadri shpërndarës kryesor; FID-ndërprerësin te prodhuesit ETL; Siguresa automatike; Punimi i qarkut rrymor të dritës me kabëll PP-Y 3x1.5mm²; Punimi i qarkut rrymor të prizës njëfazore; Instalimi i alarmit të zjarrit (komplet); Instalimi i internetit; Instalimi i trupave ndriçues; Instalimi i përtokëzimit mbrojtës dhe rrëfepritësit.</p> <p>PUNËT E MAKINERISË:</p> <p>-Furnizimi dhe montimi i radiatorëve të kompletuar me tapë mbyllëse dhe tapë për qasje mekanike; Mbjtëse të radiatorëve, gypat e Bakër-plast CU; Fitingu për gypa të bakrit, gasi, teli për saldim etj, Kolektorë njishe, Kaloriferë 25 Kw me ujë, Rrjeti gypor; Sistemi i gypave të paraizoluar; Sistemi i ventilimit ne toalete etj., të gjitha sipas situacionit të tretë.</p> <p>PUNËT HIDROTEKNIKE</p> <p>-Gërmimi i dheut për kanalet 1.5m dhe gjërësi b=0.6m; Sigurimi dhe vendosja e rërës së imët në kanal për vendosjen e gypave; Mbulimi i kanalit me dheun e gërmuar në shtresa me ngjeshje; Largimi i dheut të tepërt. Punët e betonit; Punët e ujësjellësit; Punët e kanalizimit të brendshëm; Punët e instalimeve hidrosanitare dhe Hidrantet.</p>	
FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE	











5. Renovime dhe rindërtime të objekteve shëndetësore	
Gatë këtij muaji janë zhvilluar punimet në:	
<ul style="list-style-type: none"> • QMF 5, renovim; • Gëlqerosja e zyrave të ndërmarrjes “Sport-Marketingu”; • QKMF - lura (rampa); • Gëlqerosja e zyrave të DMS; • Sanimi te sheshi “Bill Klinton” 	
Vlera e projektit	334.267,50€
Nr i kontratës dhe data	Nr. 616-18-104-521, dt. 1.11.2018
Investuesi	Komuna e Prishtinës
Plani dinamik	14,638.76 €
Operatori ekonomik	NTP Ulpiana dhe “Mati” SHPK
Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara	
Foto gjatë ekzekutimit të punimeve	
Kuzhina Popullore	
	





6. Ndërtimi i këndeve të lodrave dhe fushave sportive	
Vlera e projektit:	341.717,45€
Nr. i kontratës dhe data.	616 18 89 521
Investuesi	Komuna e Prishtinës
Plani dinamik	120 ditë
Operatori ekonomik	NTP "Ulpiana", NPT "DAQA"
Të paguara	84,484.38 €
Disa foto gjatë punimeve te Kodra e Diellit I	
	
	



Disa foto te shkolla Zenel Hajdini



7. Punët përfundimtare për çerdhen në Tophane – faza II

Vlera e projektit:	18.735,86 €,
Nr i kontratës dhe data.	Nr. prokurimit 616-19-461-5-2-1; nr. i brendshëm i prokurimit 616 19 005 521, dt. 29.03.2019
Investuesi	Komuna e Prishtinës
Plani dinamik	60 ditë
Operatori ekonomik	ECM "Engineering" SHPK & "Astraplan" SHPK
Vlera e paguar deri më tani:	10,000.00€

Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Foto nga terreni





8. Renovime dhe mirëmbajtja e nyjave sanitare ne institucione shkollore dhe objekte të tjera komunale	
Vlera e projektit:	162 290.00€
Nr. i kontratës dhe data	616-19-085-521 dt.26.07.2019
Investuesi	Kuvendi Komunal Prishtinë
Të paguara deri më tani	
Operatori ekonomik	OE "TRIANGLE SHPK" dhe "AAB CONSTRUCTION" Suhareke
Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara	
Zhvillimi i punimeve në renovimin e nyjave sanitare në SHFMU "Ismajl Qemajli"	
Foto gjatë ekzekutimit të punimeve	
Renovimi i nyjave sanitare në SHFMU "Ismajl Qemajli"	












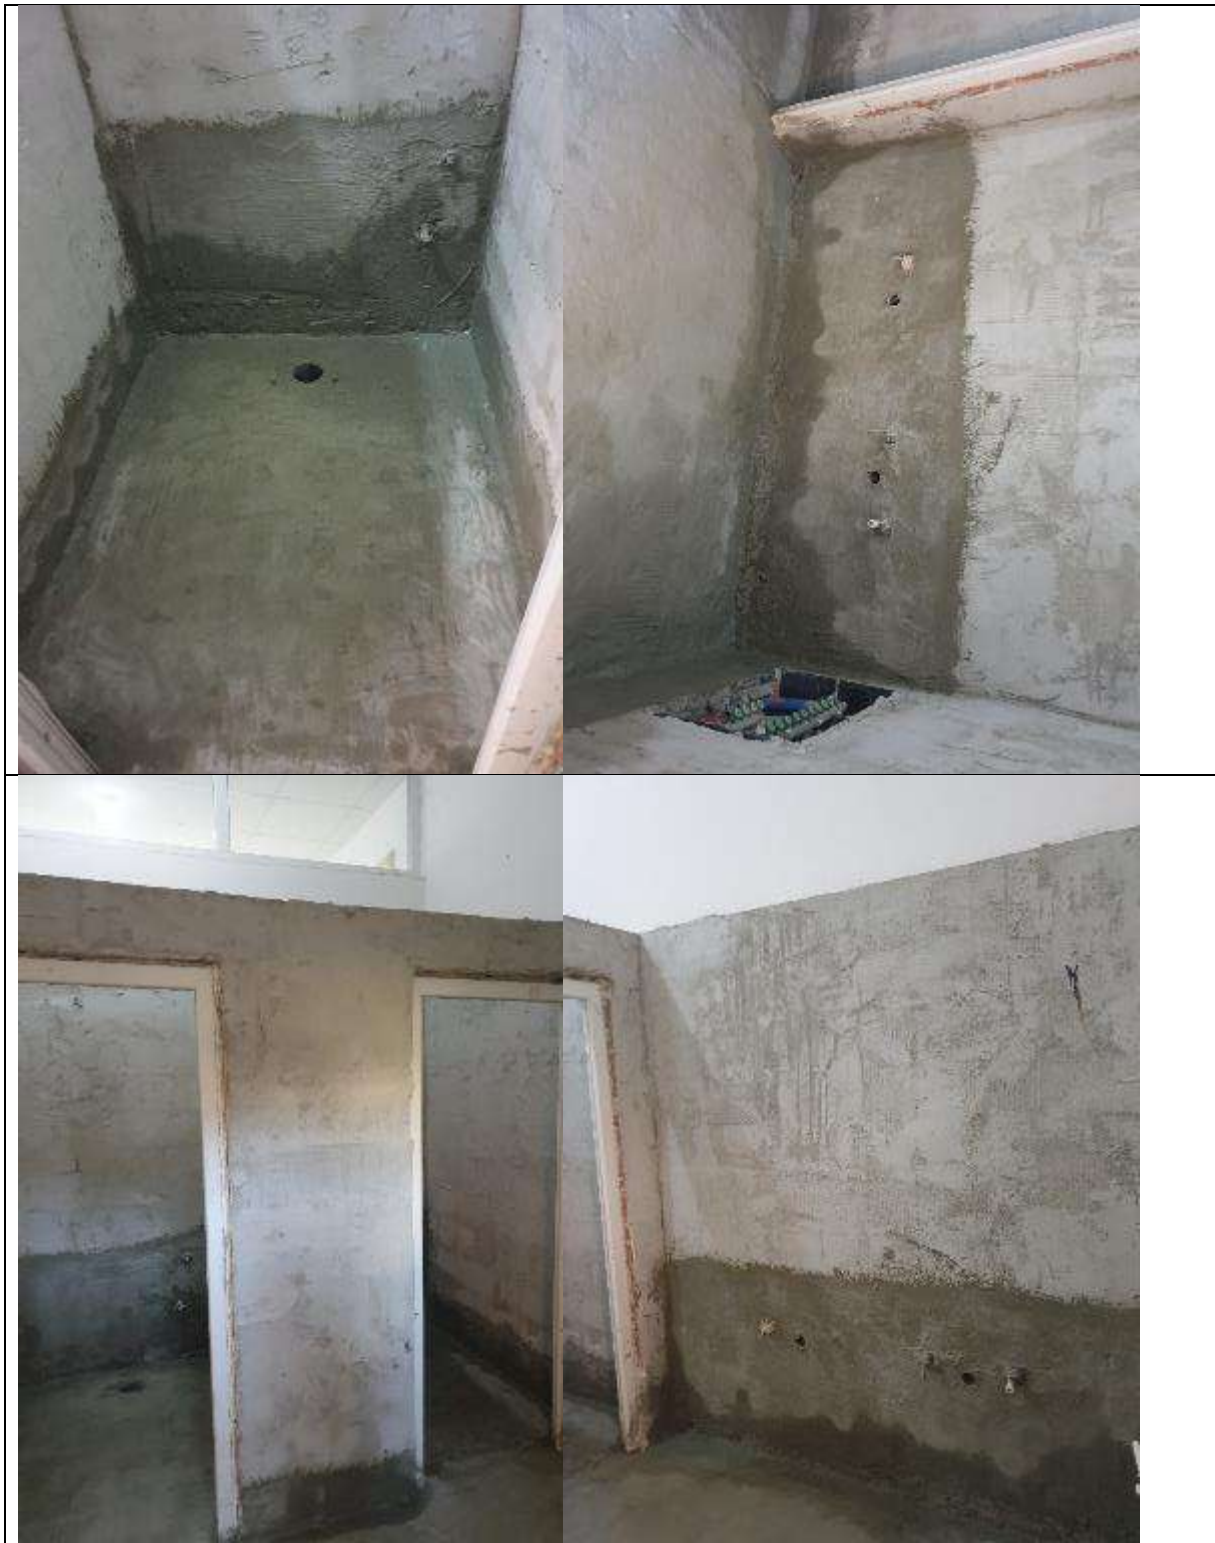







9. Rregullimi i oborreve dhe terreneve sportive 2

Vlera e projektit	197,287.00€
Nr. i kontratës dhe data	616-19-2303-521 dt.09.07.2019
Investuesi	Komuna e Prishtinës
Të paguara deri më tani	55,641.00€
Operatori ekonomik	OE "NBT ING ", me numër biznesi 70477229
Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara	
Punët përgatitore, punët e demolimeve, punimet e dheut dhe mbushjet, punimet e kallupimit, punimet e asfaltit, hapja e gropave të shtyllave, furnizimi me material dhe punimi i rrethojës	
Foto gjatë ekzekutimit të punimeve	
Oborri i shkollës në Llajshec	





10. Hartim i projektit të detajuar QMF në lagjen “Prishtina e Re” – Zona Perëndim	
Gatë këtij muaji janë zhvilluar punimet në:	
<ul style="list-style-type: none"> • Fillimi i punimit të projektit 	
Vlera e projektit:	9.850.00 €
Nr. i kontratës dhe data.	Nr. 616-19-018-421, dt.04.07.2019
Investuesi	Komuna e Prishtinës
Plani dinamik	45 ditë
Operatori ekonomik	“PH-ARCHDESING” NSH

11. Konkurs për punimin e projektit ideor arkitektonik Tregu i Ulpianës	
Gatë këtij muaji janë zhvilluar punimet ne:	
<ul style="list-style-type: none"> • Fillimi i punimit të projektit 	
Vlera e projektit	35000,00
Nr. i kontratës dhe data	Nr. 616-19-018-421, dt.04.07.2019
Investuesi	Komuna e Prishtinës
Plani dinamik	60 ditë
Operatori ekonomik	Alfa Produkt + Blerim Lutolli

PROJEKTET E KONTRAKTUA DHE TË PAFILLUARA

1. Ndërtimi i shkollës fillore në lagjen "Mati 1", vlera e projektit është 1,458,452.95€, nr. id. 61615061511, dt. 23.07.2015, punimet nuk kanë filluar, është në procedurë gjyqësore për çështje pronësore.
2. Ndërtimi i sallës së edukatës fizike të shkollës "Shtjefën Gjeqovi", vlera e projektit është : 238,564.24€, nr. id 616 15 156 521, dt. 22.10.2015, punimet janë ndërprerë për shkak të kontesteve pronësore.
3. Ndërtimi i shkollës në lagjen "Kalabria", vlera e projektit është 1,458,452.95 €; nr. id. 61615135511, dt. 30.10.2015, punimet nuk ka fillua për shkak të kontesteve pronësore.

✓ KERKESAT E SEKTORIT

Kërkesa shumë të nevojshme:

- Sigurimi i pajisjeve për sigurinë e stafit në punishte (helmata, këpuca, syze etj.);
- Trajnime të stafit për menaxhim të projekteve-kontratave;
- Pjesëmarrje në panairët e ndërtimit, me qëllim të njoftimit me materialet e reja të ndërtimit;
- 1. Server për komplet drejtorinë, min. 10 Tera bajt;
- Sigurimi i pajisjeve mobile :
 - a. për matjen e lagështisë së betonit, drurit dhe llaqit;
 - b. kamerë termike;
 - c. Matjen e glykollit;
 - d. Matjen e temperaturës së ujit dhe
 - e. 5 metra llaserike me gjatësi matëse deri 50 m.

Drejtori:
Gëzim Mehmeti
