



Republika e Kosovës
 Republika Kosova – Republic of Kosovo
Komuna e Prishtinës
 Opština Priština – Municipality of Prishtina



Raporti i vitit 2020

Gusht 01- 31.08.2020

1. Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave

Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave gjatë muajit gusht 2020, ka kryer këto aktivitete: Kërkesat për hartimin e detyrave projektuese dhe identifikimin e nevojave, shqyrtimin e kërkesave të banorëve të bashkësive lokale dhe inkorporimi i tyre në planet e Komunës, njoftimi me kohë i kompanive publike dhe subjekteve relevante, me qëllim të koordinimit të punëve, incizimi i gjendjes ekzistuese të infrastrukturës në qytetin e Prishtinës, si dhe kompletimi i dokumentacionit teknik për procedimin e tyre në organet kompetente, mbikëqyrja e realizimit të projekteve konform marrëveshjes etj.

1.1. Shqyrtimi i kërkesave

Gjatë muajit gusht 2020, Drejtoria ka proceduar 143 kërkesa të ndryshme të bashkësive lokale dhe banorëve: për ndërtimin e rrugëve, trotuareve dhe kanalizimeve, kërkesa për rregullimin e rrugëve dhe kanalizimeve, kërkesa nga kompanitë publike-leje për gropim dhe intervenime për sanimin e defekteve të ndryshme, kërkesa nga kompanitë për formime të komisioneve për kontrollimin e punëve, kërkesa të natyrave të ndryshme rreth definimit të zgjidhjes në teren etj. Nga numri i përgjithshëm, prej 143 kërkesave të pranuar, 114 kërkesa janë të përfunduara.

1.2. Dërgimi i kërkesave për hartimin e detyrave projektuese dhe identifikimi i nevojave

Duke marrë për bazë Ligjin mbi planifikimin hapësinorë, Ligjin mbi ndërtimin e objekteve investive, si dhe Ligjin për projektim, e në veçanti planet rregullative, janë dërguar kërkesat për hartimin e detyrave projektuese në zonat urbane dhe rurale.



1.3. Raportimi i menaxhereve të projekteve infrastrukturore

| | |
|-------------------------|--|
| Drejtoria | Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave |
| Sektori | Menaxhimi i Kontratave (Ndërtimi i ulët) |
| Drejtori | Gëzim Mehmeti |
| Raportoi | Dukagjin Buçaj, idn., u.d. i shefit të Sektorit |
| Kontrolloi – Përpunoi | Muhamed Emra, idn., zyrtar i lartë për ndërtim urban |
| Periudha raportuese | 01-31.08.2020, muaji gusht |
| Menaxhëret e projekteve | Ibrahim Gervalla Muhamed Emra Afërdita Hasimi Zyhrie Pllana Irfete Zejneli Fatmir Uka Halil Fejziu Imer Mavriqi Syzana Pllana Qazim Bajrami Jeton Zherka Sevdije Drenovci |
| Organi mbikëqyrës | Azem Buzuku Aferdita Sopi Behxhet Gashi Ramadan Nebiu Hazir Krasniqi Amire Krasniqi Bujar Rama |

| PRISHTINA | | RAPORTI MBIKËQYRËS | | | | | SHIFRA 01 | |
|--|--|---|-------------------|--------------------|-------------------|---|---------------------|--|
| Projekti : | <i>Ndërtimi i rrugës “ Elez Berisha “ te qendra tregtare Avori</i> | | | | | Vlera e projektit: 80.506,30€ | | |
| Investuesi : | Komuna e Prishtinës | | | | | Plani dinamik 60 ditë | | |
| Operatori : | SHPK “Rexha” | | | | | Nr.616 18 140 521 dt. 01.03.2019 | | |
| Menaxheri i projektit : | Muhamed Emra, idn. | | | | | Projekti i vitit: 2019 | | |
| Organi mbikëqyrës : | Behxhet Gashi, tek. i ndërt., Hazir Krasniqi, tek. i gjeod. | | | | | | | |
| Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara | | | | | | | | |
| Vëllimi fizik | Punët e realizuara | - Furnizimi, montimi i shtyllave të ndriçimit Vendosja e shenjezimit horizontal. | | | | | | |
| | Punët në realizim | Ju njoftojm se meë 22.07.2020, kemi përfunduar të gjitha punimet sipas kontratës | | | | | | |
| Vëllimi financiar | Situacionet (Pagesat e proceduara) | Situacioni (I) | Situacioni (II) | Situacioni (III) | Situacioni (IV) | Situacioni (V) | | |
| | | 26.275,38 | 54.076,07 | | | | | |
| Vonesat | -- | | | Mesatar | | | | |
| Shkalla e cilësisë | | | | | | | | |
| Rekomandime, masat për t’u ndërmarrë | Për shkak të gjendjes aktuale – përhapjes së pandemisë Coronavirus (Covid-19), nuk është duke u punuar me kapacitet të plotë | | | | | | | |
| Vlerësimi i progresit në projekt | | | | | | | | |



| PRISHTINA | | RAPORTI MBIKËQYRËS | | | | | | SHIFRA 02 | |
|--|---|--|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---|----------------------|--|
| Projekti : | <i>Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në Lagjen e Ramabajve-Hajvali</i> | | | | | | Vlera e projektit: 207.977,00€ | | |
| Investuesi : | Komuna e Prishtinës | | | | | | Plani dinamik 90 ditë | | |
| Operatori : | “Noti – Beton” SHPK, Llazarevë | | | | | | Nr.616 019 151 521 dt. 24.12.2019 | | |
| Menaxheri i projektit : | Muhamed Emra, idn ; | | | | | | Projekti i vitit: 2019 | | |
| Organi mbikëqyrës : | Behxhet Gashi, tek. ndërt. Azem Buzuku, tek. ndërt. | | | | | | | | |
| Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara | | | | | | | | | |
| Vëllimi fizik | Punët e realizuara | Vendosja e kapakëve të pusetave | | | | | | | |
| | Punët në realizim | Përgatitja për vednosjen e grillave – ujëmbledhësve | | | | | | | |
| Vëllimi financiar | Situacionet (Pagesat e proceduara) | Situacioni (I) | Situacioni (II) | Situacioni (III) | Situacioni (IV) | Situacioni (V) | Situacioni (VI) | | |
| | | 50.000.00 | 50.000.00 | 50.000.00 | 40.000.00 | | | | |
| Vonesat Shkalla e cilësisë | | -- | | | Mesatar | | | | |
| Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë | | Për shkak të gjendjes aktuale – përhapjes së pandemisë Coronavirus (Covid-19), nuk është duke punuar operatori. | | | | | | | |
| Vlerësimi i progresit në projekt | | | | | | | | | |




| PRISHTINA | | RAPORTI MBIKËQYRËS | | | | | SHIFRA 03 |
|--|--|---|-----------------|------------------|-----------------|--|---------------------|
| Projekti : | <i>Rikonstruktimi i rrugës "Agim Ramadani"</i> | | | | | Vlera e projektit: 398.092,40€ | |
| Investuesi : | Komuna e Prishtinës | | | | | Plani dinamik 180 ditë | |
| Operatori : | SHPK "RSM Company" | | | | | Nr.616 019 028 511 dt. 21.04.2020 | |
| Menaxheri i projektit : | Muhamed Emra, idn | | | | | Projekti i vitit: 2020 | |
| Organi mbikëqyrës : | Syzana Pllana ing.hidro. , Bujar Rama ing gjeod., Sevdije Drenovci, ing.komunikacion., Bashkim Statovci, ing.elektros | | | | | | |
| Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara | | | | | | | |
| Vëllimi fizik | Punët e realizuara | - Furnizimi dhe shtresimi i trupit të rrugës me asfaltbeton AB-11 t=5.0cm Prej stacionazhes P0 prej 0+00 deri te stacionazha P27, në gjatësi +450.0 | | | | | |
| | Punët në realizim | - Përgatitja për vendosjen e skajoreve 18/24 cm në stacionazhen Prej P32 prej +504.21 deri te profili P68, me gjatesi 0+991.55. | | | | | |
| Vëllimi financiar | Situacionet (Pagesat e proceduara) | Situacioni (I) | Situacioni (II) | Situacioni (III) | Situacioni (IV) | Situacioni (V) | Situacioni (VI) |
| | | 50.410,0€ | | | | | |
| Vonesat | -- | | | Mesatar | | | |
| Shkalla e cilësisë | | | | | | | |
| Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë | Për shkak të gjendjes aktuale – përhapjes së pandemisë Coronavirus (Covid-19), nuk është duke u punuar me kapacitet të plotë | | | | | | |
| Vlerësimi i progresit në projekt | - Punimet kane filluar të ekzekutohen më 08.06.2020 | | | | | | |







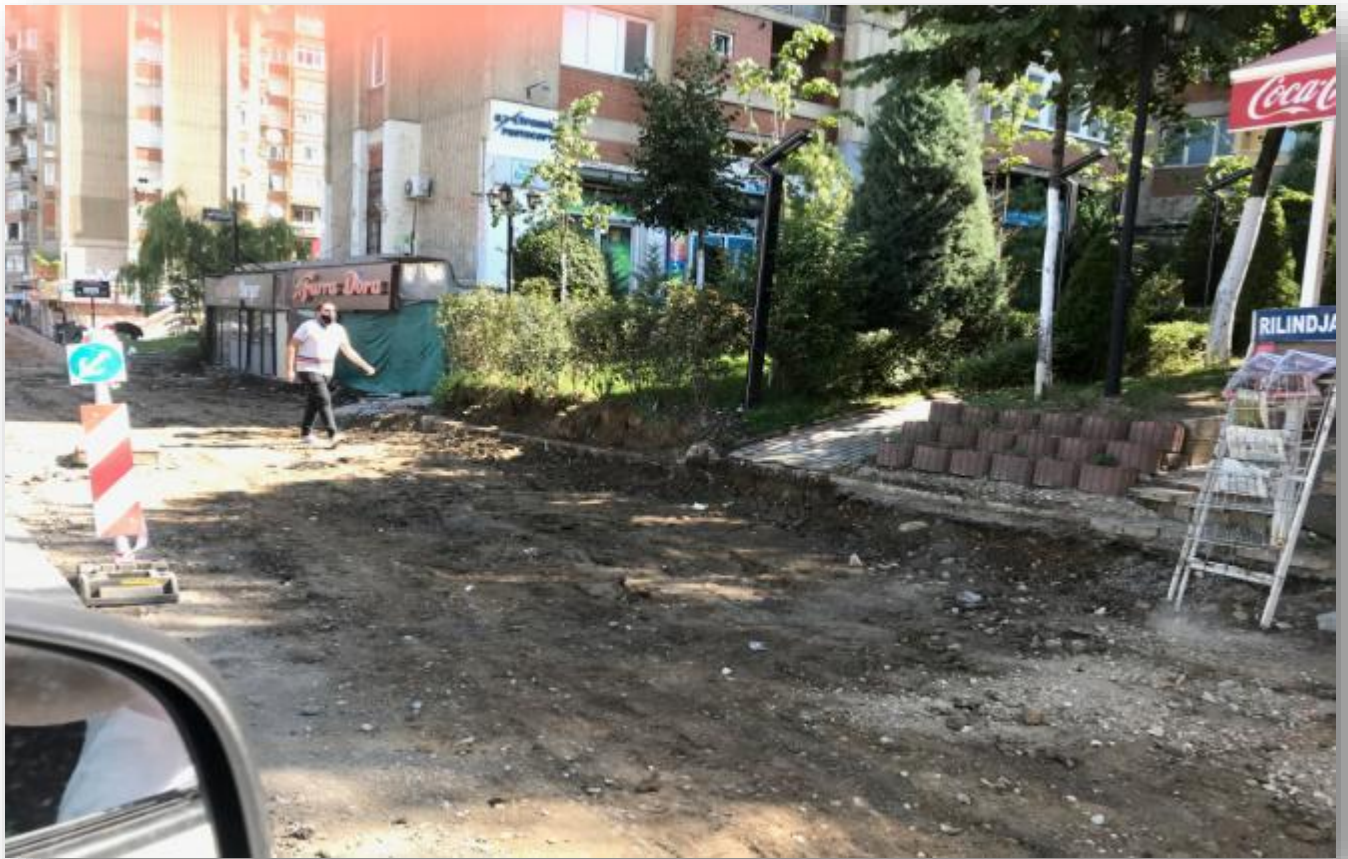
























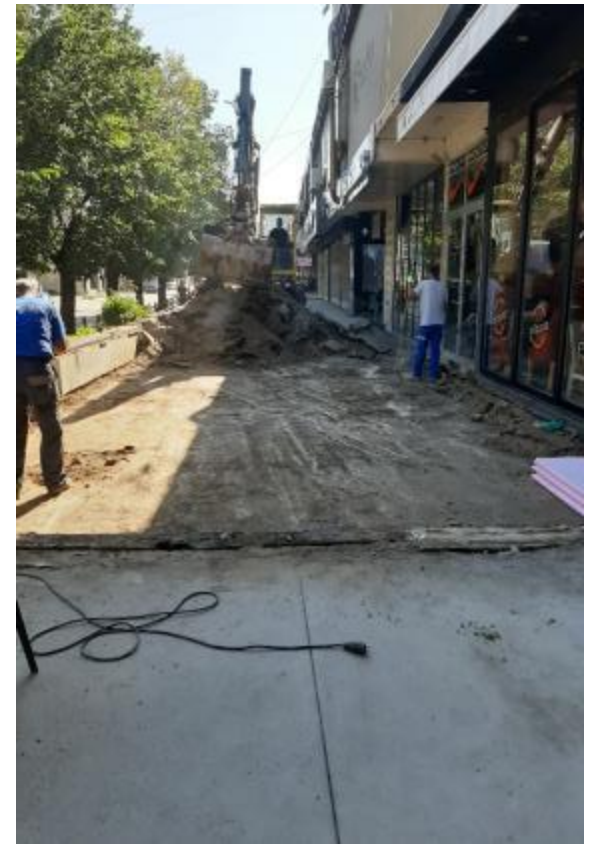
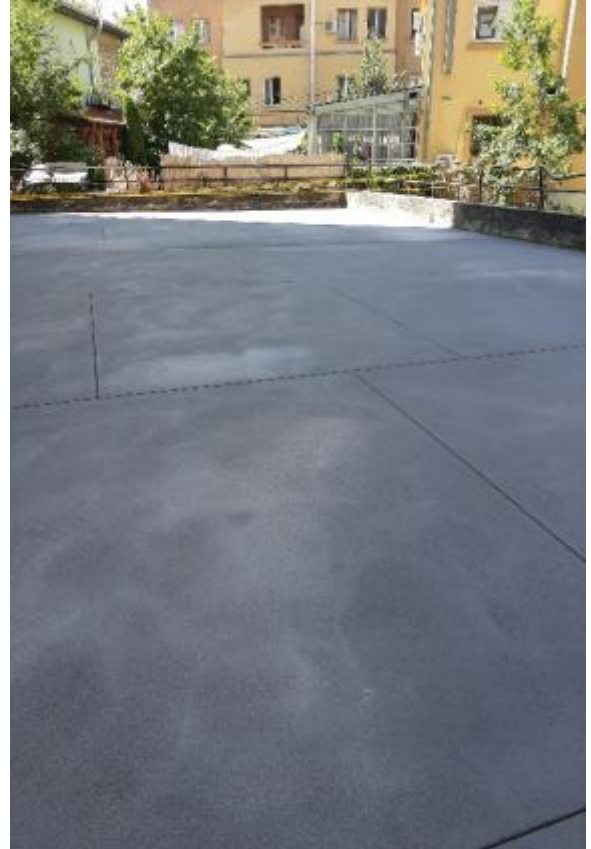









|  RAPORTI MBIKËQYRËS | | SHIFRA 04 | | | | | |
|---|--|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------|--|
| Projekti : | <i>"Ndërtimi i parqeve rekreativo-sportive -renovimi I kompleksit "Qafa"</i> | | | | | Vlera e projektit: 883,783.42 € | |
| Investuesi : | Komuna e Prishtinës | | | | | Plani dinamik :210 Ditë | |
| Operatori: | "Rexha" SHPK | | | | | Nr. 616 19110 511 dt.17/09/2019 | |
| Menaxheri i projektit : | Irfete Zejneli | | | | | Projekti i vitit 2019 | |
| Organi mbikëqyrës : | Bujar Rama , Bashkim Statovci , Behxhet Gashi, Burbuqe Agushi, Ylber Jashari dhe Syzana Pllana . | | | | | | |
| Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara | | | | | | | |
| Vëllimi fizik | Punët e realizuara | <ul style="list-style-type: none"> ● Demolimi i asfaltit ekzistues në zonën 1, ● Demolimi i hidroizolimit ekzistues në zonën 1 , ● Punimi i estrihut në zonën 1, ● Demolimi i asfaltit ekzistues në zonën 3 , ● Punimi i estrihut në zonën 3, | | | | | |
| | Punët në realizim | Punimet kanë filluar në zonën 1 dhe 3 , kurse në zonën 2 dhe 4 akoma nuk është liruar hapësira nga Drejtoria e Inspeksionit. | | | | | |
| Vëllimi financiar | Situacionet (Pagesat e proceduara) | Situacioni (I) | Situacioni (II) | Situacioni (I II) | Situacioni (IV) | Situacioni (V) | |
| | | 50,000.00€ | 50,000.00€ | 00,000.00€ | 00,000.00€ | 00,000.00€ | |
| | | | | | | | |
| Vonesat Shkalla e cilësisë | <input type="checkbox"/> Vonesado të ketë përshkak se te problemeve ne banoret. | | | | | | |
| Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë | Është njoftuar operatori ekonomik që punimet të zhvillohen sipas kontratës. | | | | | | |
| Vlerësimi i progresit në projekt | <input type="checkbox"/> Shpresojmë të zgjidhen problemet me banorët për zonën 2 dhe 4 . | | | | | | |



|  RAPORTI MBIKËQYRËS | | SHIFRA 05 | | | | |
|---|---|--|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| Projekti : | Ndërtimi i rrugës paralel me rrugën "B" | Vlera e projektit 298,327.13 | | | | |
| Investuesi : | Komuna e Prishtinës | Plani dinamik :150 ditë kalendarike | | | | |
| Operatori : | "Beni-Com" SHPK & "All Stone" SHPK | Nr. 616 19 211 521 Dt. 08.05.2020. | | | | |
| Menaxheri i projektit : | Dukagjin Buçaj | Projekti i vitit 2020 | | | | |
| Organi mbikëqyrës : | Syzana Pllana, Afërdita Sopi, Bashkim Statovci, Ramadan Nebihu | | | | | |
| Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara | | | | | | |
| Vëllimi fizik | Punët e realizuara | <p>Është bërë shënimi gjeodezik i trasesë së rrugës; Është bërë gërmimi i gjerë, pastrimi, dhe demolimet e rrethojave egzistuese; Është bërë gërmimi në trupin e rrugës; Është bërë hapja e kanalit, vendosja e gypave të kanalizimit fekal, atmosferik; Është bërë punimi i pusetave të kanalizimit fekal dhe atmosferik; Është bërë mbushja me material guror e kanaleve dhe ngjeshja në shtresa; Është bërë mbushja e pjesërishme e trupit të rrugës me zhavorr, fraksion 0-60mm,ngjeshja në shtresa.</p> | | | | |
| | Punët në realizim | Është bërë identifikimi i instalimeve nëntokësore dhe më pas pritjet të fillojë realizimi i kanalizimit fekal sipas projektit. | | | | |
| Vëllimi financiar | Situacionet (Pagesat e proceduara) | Situacioni (I) | Situacioni (II) | Situacioni (III) | Situacioni (IV) | Situacioni (V) |
| | | 50,000.00 € | | | | |
| Vonesat Shkalla e cilësisë | Nuk ka vonesa. Cilësia është e kënaqshme | | | | | |
| Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë | ☞ Duhet të përfilllet në tërësi plani dinamik për kryerjen e punimeve | | | | | |
| Vlerësimi i progresit në projekt | Progresi i punëve ka qenë i kënaqshëm. | | | | | |

*Foto gjat ekzekutimit të punimeve

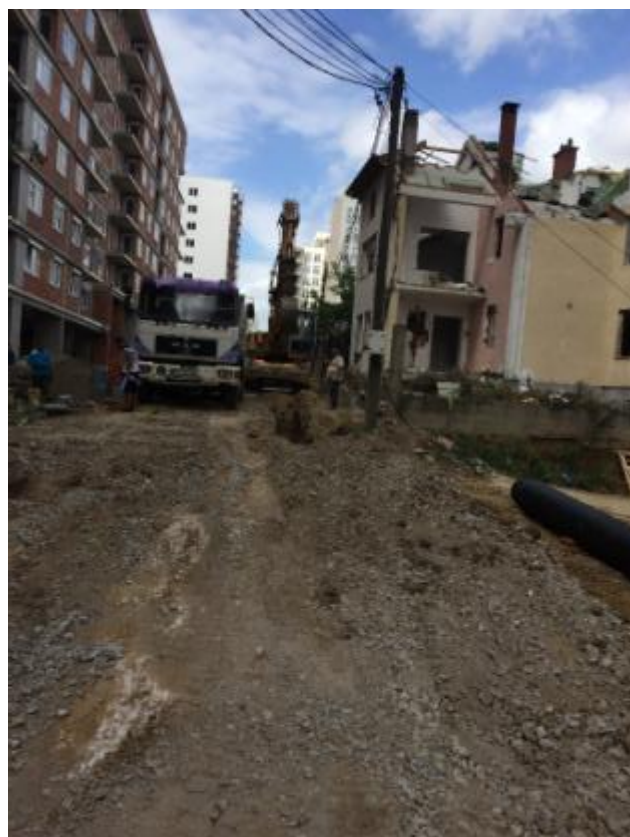

| PRISHTINA | | RAPORTI MBIKËQYRËS | | | | SHIFRA 06 | |
|--|--|---|------------------------|-------------------------|--|-----------------------|--|
| Projekti : | Implementimi i Planit të mobilitetit - sanimi, rekonstruimi i rrugëve - Loti II | | | | Vlera e projektit 500,000.00 | | |
| Investuesi : | Komuna e Prishtinës | | | | Plani dinamik :120 ditë kalendarike | | |
| Operatori : | “Papenburg” & “Adrianicompany” | | | | Nr. 616 19 026 511 Dt. 28.10.2019. | | |
| Menaxheri i projektit : | Dukagjin Buçaj | | | | Projekti i vitit 2019 | | |
| Organi mbikëqyrës | Liridon Kabashi, Sevdije Drenovci, Behxhet Gashi | | | | | | |
| Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara | | | | | | | |
| Vëllimi fizik | Punët e realizuara | Rruga te Tregu me shumice (te hyrja e EULEX-it dhe Tregut me shumicë); Sanimi i shiritit të rrugës kryesore “Bill Clinton”; Rruga “Xhevë Lladrovci”; Shtegu i këmbësorëve në dardani; Rruga mbrapa Tregut me shumicë-sanimi me zhavorr; Asfaltimi i rrugës te Banesat e Tregtise, afër rruges “Tirana”; Sanimi i kanalit në rrugën “Qëndresa”, Mmat; Asfaltimi i parkingut tek Qendra e Mjeksisë Familjare në Bregun e Diellit; Asfaltimi i parkingut tek Qendra e Mjeksisë Familjare në Dardani; Asfaltimi i parkingut tek Qendra e Mjeksisë Familjare në Qendër; Asfaltimi i parkingut tek Objekti i Emergjencës në Ulpianë; Asfaltimi i rrugëve “ShaipKamberi”, “1 Tetori” dhe “Demir Vitia”; Asfaltimi i rrugës “Naim Frashëri” (Lagjja Muhaxhirëve); Asfaltimi i rrethit në Ulpianë; Asfaltimi i rrugës “Rrustem Statovci” (te varrezat e Dëshmorëve); Sanimi me zhavorr i rrugës lidhëse me rrugën “Tomori” në Prishtinë; Sinjalizimi horizontal te Parkingu i Objektivit të Emergjencës në Ulpianë; Asfaltimi i rrugës te hyrja kryesore e QKUK-së, rruga “Arbnor e Astrit Dehari”, Prishtinë; Asfaltimi i rrethrotullimit tek hyrja sekondare e QKUK- së nga Veterniku, Prishtinë; Asfaltimi i parkingut te shkolla “Xhemajl Mustafa”, Prishtinë; Asfaltimi te rruga “28 Nëntori” (Dardani); Asfaltimi i rrugës “Mehmet Bushi” Bregu i Diellit; Asfaltimi i krahut të rrugës “Braina” në Bardhosh, Prishtinë. | | | | | |
| | Punët në realizim | Kanë përfundua të gjitha punimet në këto vende. Pritet të caktohen vende të reja për rikonstruktim, sipas kërkesës nga Plani i mobilitetit. | | | | | |
| Vëllimi financiar | Situacionet (Pagesat e proceduara) | Situacioni (I) | Situacioni (II) | Situacioni (III) | Situacioni (IV) | Situacioni (V) | |
| | | 111,264.92€ | 41,067.26€ | 121,095.05€ | 83,612.83€ | | |
| Vonesat Shkalla e cilësisë | Nuk ka vonesa. Cilësia është e kënaqshme | | | | | | |
| Rekomandime, masat për t’u ndërmarrë | <input type="checkbox"/> Të gjitha punimet kanë përfunduar; <input type="checkbox"/> Pritet të caktohen vende të reja për rikonstruktim, sipas kërkesës nga Plani i mobilitetit, në koordinim me stafin profesional nga Kabineti i Kryetarit. | | | | | | |
| Vlerësimi i progresit në projekt | Progresi i punëve ka qenë i kënaqshëm. | | | | | | |


*Foto pas ekzekutimit të punimeve




RRUGA "XHEVË LLADROVCI"



RRUGA MBRAPA TREGUT ME SHUMICË-Sanimi me zhavorr

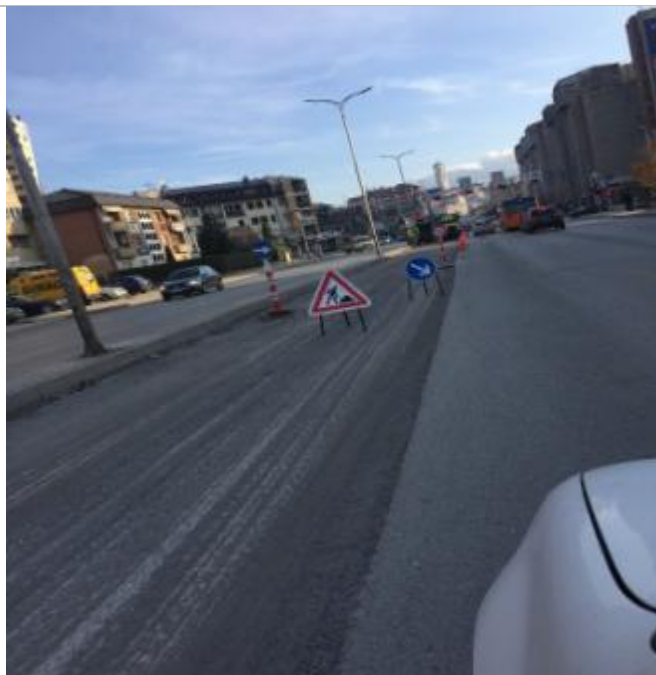

SANIMI I SHIRITIT TË RRUGËS KRYESORE "BILL KLINTON"

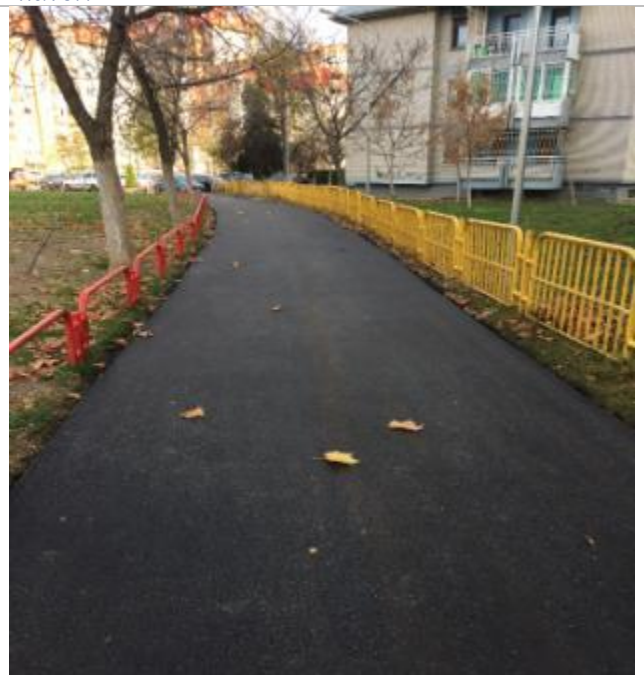

SHTEGU I KËMBËSORËVE NË LAGJEN "DARDANIA"



ASFALTIMI I RRUGES TE BANESAT E TREGTISE AFER RRUGES "TIRANA"



SANIMI I KANALIT NE RRUGËN "QËNDRESA", MAT



RRUGA TE TREGU ME SHUMICE(TE HYRJA E EULEKSIT DHE TREGUT ME SHUMICE)



RRUGA TE TREGU ME SHUMICE (TE HYRJA E EULEX-IT DHE TREGUT ME SHUMICE)



Asfaltimi i parkingut tek Qendra e Mjekësisë Familjare në Dardani




Asfaltimi i parkingut tek Objekti i Emergjencës në Ulpianë



Asfaltimi i parkingut tek Qendra e Mjekësisë Familjare në Bregun e Diellit



Asfaltimi i parkingut tek Qendra e Mjekësisë Familjare në Bregun e Diellit

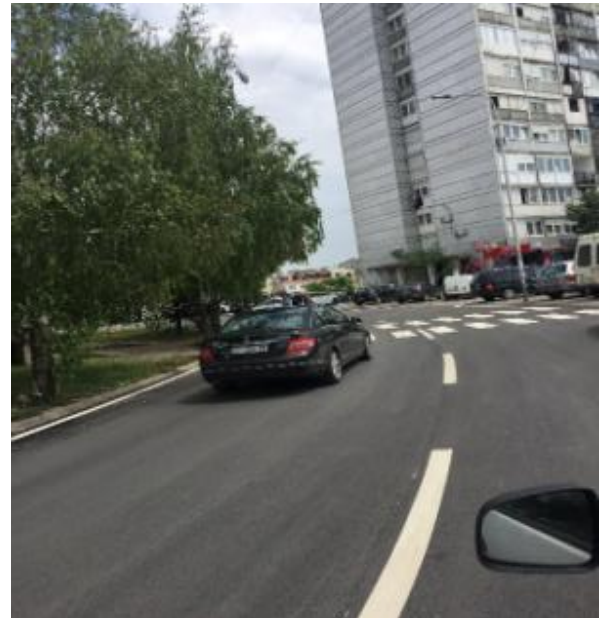

Rrethrotullimi te fontana në Ulpianë




Rruga "Shaip Kamberi" Velani, sanim me zhavorr, krah i rrugës "Tomori"

Rrethrotullimi te hyrja sekondare e QKUK-së, Veternik




| PRISHTINA | | RAPORTI MBIKËQYRËS | | | | | SHIFRA 07 |
|--|--|---|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Projekti : | Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në rrugën “Llapi” | Vlera e projektit: 112 340, 00 € | | | | | |
| Investuesi : | Komuna e Prishtinës | Plani dinamik : 60 ditë | | | | | |
| Operatori : | N.P.N “LINDI” | Nr616-19-1118-5-1-1 | | | | | |
| Menaxheri i projektit : | Syzana Pllana | Projekti i vitit 2019 | | | | | |
| Organi mbikëqyrës : | Aferdita Sopi, Avdirrahman Zuka | | | | | | |
| Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara | | | | | | | |
| Vëllimi fizik | Punët e realizuara | Pas zgjidhjes së problemeve pronësore me ndihmën e Bashkësisë Lokale, kemi vazhduar punimet; Sipas kontratës, punët janë në fazën përfundimtare dhe pritet të përfundojnë së shpejti. | | | | | |
| | Punët në realizim | Ndërtimi i kanalizimit fekal | | | | | |
| Vëllimi financiar | Situacionet (Pagesat e proceduara) | Situacioni (I) | Situacioni (II) | Situacioni (III) | Situacioni (IV) | Situacioni (V) | Situacioni (VI) |
| | | 28,149.60€ | 50,000.00€ | 0.0€ | 0.0€ | 0.0€ | 0.0€ |
| | | Situacioni (VII) | Situacioni (VIII) | Situacioni (IX) | Situacioni (X) | Situacioni (XI) | Situacioni (XII) |
| Vonesat Shkalla e cilësisë | -- | | | Mesatar | | | |
| Rekomandime masat për tu ndërmarë | ☞ | | | | | | |
| Vlerësimi i progresit në projekt | <p>☞ Kontrata nuk ka arritur të realizohet sipas projektit, pas ndërtimi të urës nga Ministria e Infrastrukturës, andaj menaxheri paraprak ka definuar trasenë e re e cila është në përfundim;</p> <p>☞ Problemet pronësore e kanë ngadalësuar shumë ecurin e punimeve, ku në bashkëpunim me kryetarin e Bashkësisë Lokale, Mramor, kemi zgjidhur të gjitha mosmarrëveshjet, jemi në pritje të vazhdimin të kontratës dhe përfundimit të saj sa më parë.</p> | | | | | | |


*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve

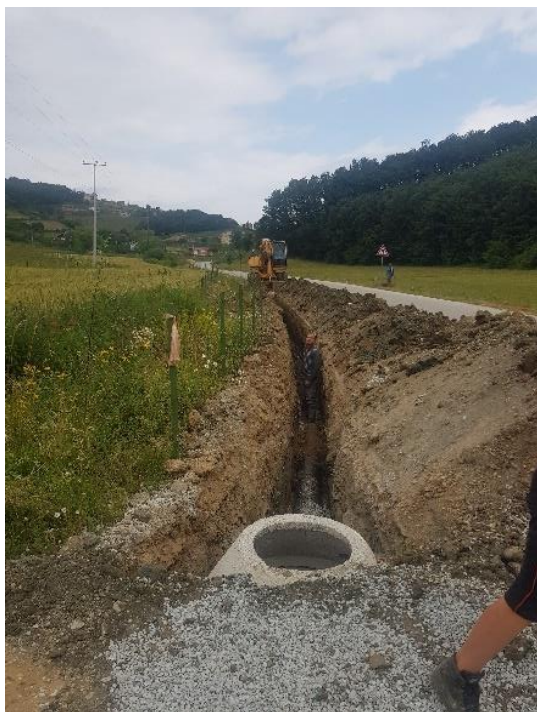

|  RAPORTI MBIKËQYRËS | | SHIFRA 08 | | | | | |
|---|--|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Projekti : | Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në rrugën “Llapi” | Vlera e projektit: 194 438, 90 € | | | | | |
| Investuesi : | Komuna e Prishtinës | Plani dinamik : 90 ditë | | | | | |
| Operatori : | SHPK “NOTI – BETON “ | Nr.616-19-115-521 | | | | | |
| Menaxheri i projektit : | Syzana Pllana | Projekti i vitit 2019 | | | | | |
| Organi mbikëqyrës : | Aferdita Sopi, Ramadan Nebihi | | | | | | |
| Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara | | | | | | | |
| Vëllimi fizik | Punët e realizuara | Është bërë ndërtimi i rrjetit të kanalizimit fekal dhe atmosferik, punimet janë ndërprerë për kohësisht në realizimi e rrjetit të instalimeve elektrike nga KEDS, si dhe ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit nga K Prishtina, në bashkëpunim me Komunën e Prishtinës. | | | | | |
| | Punët në realizim | Nuk ka. | | | | | |
| Vëllimi financiar | Situacionet (Pagesat e proceduara) | Situacioni (I) | Situacioni (II) | Situacioni (III) | Situacioni (IV) | Situacioni (V) | Situacioni (VI) |
| | | 50,000.00€ | 0.0€ | 0.0€ | 0.0€ | 0.0€ | 0.0€ |
| | | Situacioni (VII) | Situacioni (VIII) | Situacioni (IX) | Situacioni (X) | Situacioni (XI) | Situacioni (XII) |
| | | | | | | | |
| Vonesat Shkalla e cilësisë | -- | | | Mesatar | | | |
| Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë | | | | | | | |
| Vlerësimi i progresit në projekt | <input type="checkbox"/> Kontrata nuk ka arritur të realizohet për shkak të mos koordinimit ndërinstytucional, andaj jemi në pritje. Tenderimi i rrjetit të ujësjellësit është në fazën përfundimtare. Pas realizimit të rrjetit të ujit do të vazhdohet kontrata. | | | | | | |

*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve

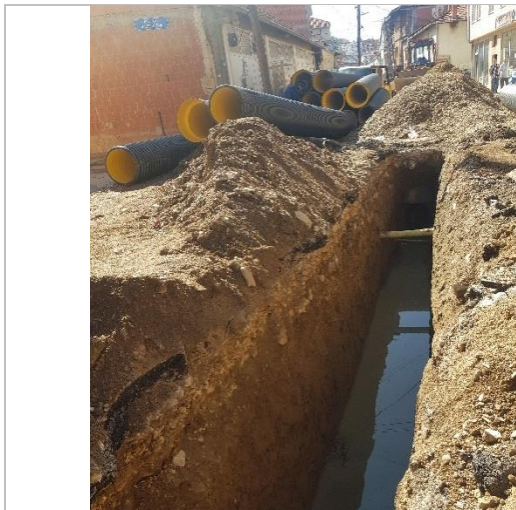


|  RAPORTI MBIKËQYRËS | | SHIFRA 09 qershor-2020 | | | | | |
|---|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Projekti : | Rekonstruimi i rrugëve dhe parkingjeve në lagjen “Bregu i Diellit”, Loti 2 | Vlera e projektit: 226 965.20 € | | | | | |
| Investuesi : | Komuna e Prishtinës | Plani dinamik : 90 ditë | | | | | |
| Operatori : | “Toifor” SHPK | Nr.616 019 024 511 dt. 01.11.2019 | | | | | |
| Menaxheri i projektit : | Fatmir Uka, idn | Projekti i vitit : 2019 | | | | | |
| Organi mbikqyrës : | Afërdita Hasimi, idn., Behxhet Gashi, Azem Buzuku, tek. nd. | | | | | | |
| Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara | | | | | | | |
| Vëllimi fizik | Punët e realizuara | <ul style="list-style-type: none"> ● Për rrugët „Armend Daci”, „Norbert Jokli”, „Bedri Shala”(“24 Maji”), pjesa e rr. “Xheladin Hana” (me hyrje-dalje nga rruga “Isa Kastrati, me gjatësi 270 m’). <ul style="list-style-type: none"> • Punët paraprake: sipas kontratës: Pos.1.1,1.2,1.8,1.9; • Mbistruktura: sipas kontratës: Pos.4.2,4.7,4.9; • Punimi i trotuareve dhe zgjerimi i vendeve për parkingje në rr. “Hyzri Talla”; • Punimi i shkallëve me pllaka betoni; • Punët e mbushjeve dhe ngjeshjeve të zhavorrit në trotuare dhe parkingje. | | | | | |
| | Punët në realizim | ● Vazhdimi i punimeve për trotuare dhe parkingje | | | | | |
| Vëllimi Financiar | Situacionet (Pagesat e proceduara) | Situacioni 1 | Situacioni 2 | Situacioni | Situacioni | Situacioni | |
| | | 50 442.00 € | 35 100.90 € | | | | |
| Vonesat Shkalla e cilësisë | Për shkak të pandemisë Covid -19, punimet, janë duke u zhvilluar me kapacitete të redukuar | | | Mirë | | | |
| Rekomandime masat për tu ndërmarë | <input checked="" type="checkbox"/> Punëkryerësi është rekomanduar që me punime t’i përfillë kushtet e punës sipas udhëzimeve në fuqi të dhëna nga Ministria e Shëndetësisë dhe institucionet tjera mbi masat e mbrojtjes nga Corona-virusi Covid - 19. | | | | | | |
| Vlerësimi i progresit në projekt | Për shkak të pandemisë, punimet nuk janë duke u zhvilluar me kapacitete të mjaftueshme. | | | | | | |









| | | | | | | | |
|---|---|---|------------|------------|------------------------------------|--|--|
|  | | <h1>RAPORTI MBIKËQYRËS</h1> | | | | SHIFRA <h1>10</h1> qershor-2020 | |
| Projekti : | Ndërtimi i rrugëve në lagjen “Kalabria”, Loti 7 | | | | Vlera e projektit: 183 188.88 € | | |
| Investuesi : | Komuna e Prishtinës | | | | Plani dinamik : 90 ditë | | |
| Operatori : | “Toifor” SHPK | | | | Nr.616 019 024 511 01.11.2019 | | |
| Menaxheri i projektit : | Fatmir Uka, idn. | | | | Projekti i vitit : 2019 | | |
| Organi mbikëqyrës : | Hazir Krasniqi, gjeodet, Behxhet Gashi | | | | | | |
| Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara | | | | | | | |
| Vëllimi fizik | Punët e realizuara | <ul style="list-style-type: none"> ● Piketimi i rrugës; ● Punët e gërmimit; ● Punët e kanalizimit. | | | | | |
| | Punët në realizim | <ul style="list-style-type: none"> ● Punët e mbushjes me zhavorr; ● Punët e pusetave. | | | | | |
| Vëllimi Financiar | Situacionet (Pagesat e proceduara) | Situacioni | Situacioni | Situacioni | Situacioni | Situacioni | |
| | | | | | | | |
| Vonesat Shkalla e cilësisë | Për shkak të pandemisë Covid -19, punimet janë duke u zhvilluar jo me kapacitete të plota. | | | mirë | | | |
| Rekomandime, masat për t’u ndërmarrë | <input checked="" type="checkbox"/> Punëkryesit ju ka rekomanduar që gjatë punimeve t’i përfillin kushtet e punës sipas udhëzimeve në fuqi të dhëna nga Ministria e Shëndetësisë dhe institucionet tjera mbi masat e mbrojtjes nga Corona-virusi Covid -19. | | | | | | |
| Vlerësimi i progresit në projekt | Për shkak të pandemisë Covid -19, këto punime nuk janë duke u realizuar me kapacitete të nevojshme | | | | | | |

| RAPORTI MBIKËQYRËS | | SHIFRA 11 | | | | | |
|---|---|---|---------------------|--------------------|--|--|--|
| Projekti : | Ndërtimi I kanalizimit fekal dhe atmosferik në Hajvali-Loti 3 | Vlera e projektit: 178,627.94€ | | | | | |
| Investuesi : | Komuna e Prishtinës | Plani dinamik : 60 ditë | | | | | |
| Operatori : | SHPK,,Noti Beton'' | nr.identifikues: 616 19038 521 | | | | | |
| Menaxheri i projektit : | Ibrahim Gërvalla | Projekti i vitit 2019 | | | | | |
| Organi mbikëqyrës : | Besim Qelaj, RamadanNebih | | | | | | |
| Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë | | | | | | | |
| Vëllimi fizik | Punët e parapara | - Rregullimi I disa kanalizimeve në Hajvali. | | | | | |
| | Punët në realizim e sipër | -Punimet janë në fazën përmbyllëse | | | | | |
| Vëllimi financiar | Situacionet (Pagesat e proceduara) | Situacioni 1 | Situacioni 2 | Situacioni3 | | | |
| | | 50,000.00€ | 50,000.00€ | 50,000.00€ | | | |



| RAPORTI MBIKËQYRËS | | SHIFRA 12 | | | | | |
|---|--|---|---------------------|--------------------|--|--|--|
| Projekti : | Ndërtimi I rrugës “Dëshmorët e Sharbanit” | Vlera e projektit: 184.538.08€ | | | | | |
| Investuesi : | Komuna e Prishtinës | Plani dinamik : 90 ditë | | | | | |
| Operatori : | NTP “Bashkimi” | Nr. identifikues: 616 18151 521 | | | | | |
| Menaxheri i projektit : | Ibrahim Gërvalla | Projekti i vitit 2019 | | | | | |
| Organi mbikëqyrës : | Irfete Zeneli, Syzana Pllana | | | | | | |
| Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë | | | | | | | |
| Vëllimi fizik | Punët e parapara | - Rregullimi i rrugës (me shtresa asfalti) me gjithë infrastrukturën përcjellëse | | | | | |
| | Punët në realizim e sipër | - Punimet janë në fazën përmbyllëse | | | | | |
| Vëllimi financiar | Situacionet (Pagesat e proceduara) | Situacioni 1 | Situacioni 2 | Situacioni3 | | | |
| | | 50,000.00€ | 50,000.00€ | 50,000.00€ | | | |



| RAPORTI MBIKËQYRËS | | SHIFRA 13 | | | | | |
|---|--|--|---------------------|---------------------|--|--|--|
| Projekti : | Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në lagjen “Qëndresa” Loti 3 | Vlera e projektit: 275.350.49€ | | | | | |
| Investuesi : | Komuna e Prishtinës | Plani dinamik : 90 ditë | | | | | |
| Operatori : | SHPK „Nëntë Vëllezërit” | Nr.identifikues: 616 19027 511 | | | | | |
| Menaxheri i projektit : | Ibrahim Gërvalla | Projekti i vitit 2019 | | | | | |
| Organi mbikqyrës : | SyzanaPllana, Ramadan Nebihi | | | | | | |
| Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë | | | | | | | |
| Vëllimi fizik | Punët e parapara | - Rregullimi dhe rikonstruimi I rrugëve dhe kanalizimeve në lagjen “Qëndresa” | | | | | |
| | Punët në realizim e sipër | -Punimet janë të ndërprera që nga muaji nëntor, për shkakë se paraprakisht duhet të zgjidhet çështja e kanalizimit fekal në rrugët “Rilindja” dhe “Besim Ndreca” në lagjen “Qëndresa”, pastaj, ne me këtë kontratë të bëjmë renovimin-asfaltimin e shtresës përfundimtare të këtyre rrugëve. | | | | | |
| Vëllimi financiar | Situacionet (Pagesat e proceduara) | Situacioni 1 | Situacioni 2 | Situacioni 3 | | | |
| | | 50,000.00€ | 50,000.00€ | 100,000.00€ | | | |



| RAPORTI MBIKËQYRËS | | SHIFRA 14 | | | | | |
|---|--|---|---------------------|--------------------|--|--|--|
| Projekti : | Ndërtimi i mureve mbrojtëse | Vlera e projektit: 166.666.66€ | | | | | |
| Investuesi : | Komuna e Prishtinës | Plani dinamik : 90 ditë | | | | | |
| Operatori : | SHPK "Noti Construction" | Nr.identifikues: 616 19139 521 | | | | | |
| Menaxheri i projektit : | Ibrahim Gërvalla | Projekti i vitit 2019 | | | | | |
| Organi mbikqyrës : | Zyhrije Pllana, BehgjetGashi | | | | | | |
| Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë | | | | | | | |
| Vëllimi fizik | Punët e parapara | -Ndërtimi I mureve mbrojtëse në disarrugë të qytetit | | | | | |
| | Punët në realizim e sipër | -Punimet janë në fazën përmbyllyse | | | | | |
| Vëllimi financiar | Situacionet (Pagesat e proceduara) | Situacioni 1 | Situacioni 2 | Situacioni3 | | | |
| | | 50,000.00€ | 60,000.00€ | 30,000.00€ | | | |



| RAPORTI MBIKËQYRËS | | SHIFRA 15 | | | | | |
|---|--|--|---------------------|--|--|--|--|
| Projekti : | Rekonstruktimi i rrugëve në lagjen “Arbëria” | Vlera e projektit: 79.874.00€ | | | | | |
| Investuesi : | Komuna e Prishtinës | Plani dinamik : 90 ditë | | | | | |
| Operatori : | SHPK „Seti Commerce” | Nr.identifikues: 616 19024 511 | | | | | |
| Menaxheri i projektit : | Ibrahim Gërvalla | Projekti i vitit 2019 | | | | | |
| Organi mbikëqyrës : | Krenar Xhaferi, Ramadan Nebihi | | | | | | |
| Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë | | | | | | | |
| Vëllimi fizik | Punët e parapara | - Ndërtimi dhe rekonstruktimi i disa rrugëve në lagjen “Arbëria” | | | | | |
| | Punët në realizim e sipër | -Punimet kanë rifilluar në trajtimin e rrugëve dhe kanalizimeve të parapara me kontratë. (Për momentin punimet janë ndërprerë përkohësisht deri sat ë zgjidhen disa konteste pronësore) | | | | | |
| Vëllimi financiar | Situacionet (Pagesat e proceduara) | Situacioni 1 | Situacioni 2 | | | | |
| | | prill | maj | | | | |
| | | 20.000.00 | 20.000.00 | | | | |



| PRISHTINA | | RAPORTI MBIKËQYRËS | | | | | SHIFRA 16 | |
|--|---|--|-------------------|------------------|-----------------|--|----------------------------|--|
| Projekti : | Implementimi i Planit te mobilitetit – Sanimi, rikonstruktimi i parkingjeve dhe hapësirave gjelbëruse - Loti 1 | | | | | Vlera e projektit: 500,00.00 € | | |
| Investuesi : | Komuna e Prishtinës | | | | | Plani dinamik : 150 ditë kalendarike | | |
| Operatori : | “ Joos & Krasniqi – Baze” SHPK, adresa Junik – Deqan | | | | | Nr. 616 191037 511 dt. 29.10.2019 | | |
| Menaxheri i projektit : | ZyhriePllana | | | | | Projekti i vitit 2019 | | |
| Organi mbikëqyrës : | Aferdita Hasimi, Azem Buzuku, Amire Krasniqi, Linda Spahiu, | | | | | | | |
| Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara | | | | | | | | |
| Vëllimi fizik | Punët e realizuara | Demolimi i parkingut 1 dhe 2, afer rrugës “Qamil Hoxha”, Rregullimi i oborrit të çerdhes, te çerdhja “Ketrushet”. | | | | | | |
| | Punët në realizim | Vazhdim i punimeve në terrenet e caktuara, Asfaltimi i parkingut “Qamil Hoxha”, Qendra tregtare, muri në Dardani Shtegu për këmbësorë në lagjen “Dardania”, “Bregu i Dilli” etj... | | | | | | |
| Vëllimi financiar | Situacionet (Pagesat e proceduara) | Situacioni (I) | Situacioni (II) | Situacioni (III) | Situacioni (IV) | Situacioni (V) | | |
| | | 58.451.94€ | 78.008,36 | 0.0€ | 0.0€ | 0.0€ | | |
| | | Situacioni (VII) | Situacioni (VIII) | Situacioni (IX) | Situacioni (X) | Situacioni (XI) | | |
| | | | | | | | | |
| Vonesat Shkalla e cilësisë | | | | | | | | |
| Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë | | ☞ Vërejtje me shkrim për dinamikën e punimeve: ditarët ndërtimor, email. | | | | | | |
| Vlerësimi i progresit në projekt | | | | | | | | |







| PRISHTINA | | RAPORTI MBIKËQYRËS | | | | | SHIFRA 17 |
|--|--|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Projekti : | Ndërtimi i rrugëve, Loti 4 – Rikonstruktimi i rrugëve në lagjen “Kodra e Trimave” | Vlera e projektit: 155,555.55 € | | | | | |
| Investuesi : | Komuna e Prishtinës | Plani dinamik : 90 ditë kalenarike | | | | | |
| Operatori : | ”KemaCompany” SHPK & “Ekskavatori” SHPK | Nr. 616 191011 511 dt. 01.11.2019 | | | | | |
| Menaxheri i projektit : | Zyhrie Pllana | Projekti i vitit 2019 | | | | | |
| Organi mbikëqyrës : | Syzana Pllana, Behxhet Gashi | | | | | | |
| Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara | | | | | | | |
| Vëllimi fizik | Punët e realizuara | Marrja e pëlqimit për fillimin e punimeve, e lëshuar nga Drejtoria e Urbanizmit | | | | | |
| | Punët në realizim | Punimi i rrjetit të kanalizimit në rrugën “ Besim Levonja“; Gërmimi i trupit të rrugës “Agim Osaj”, si dhe tamponizimi i rrugës, vendosja e skajoreve; Vendosja e tamponit në rrugën “Lulzim Jashari” (Shtrurja me kubze); Gërmimi i trupit të rrugës në rr. “Aziz Zhilivoda” etj.; Fillimi i punimeve në rrugën “Bernard Llup”. | | | | | |
| Vëllimi financiar | Situacionet (Pagesat e proceduara) | Situacioni (I) | Situacioni (II) | Situacioni (III) | Situacioni (IV) | Situacioni (V) | |
| | | 50.000€ | 60.000€ | 45.180,94 | 0.0€ | 0.0€ | |
| | | Situacioni (VII) | Situacioni (VIII) | Situacioni (IX) | Situacioni (X) | Situacioni (XI) | |
| Vonesat | Shkalla e cilësisë | | | | | | |
| Rekomandime masat për tu ndërmarë | | | | | | | |
| Vlerësimi i progresit në projekt | ☞ Është përfunduar projekti-kontrata | | | | | | |










| PRISHTINA | | RAPORTI MBIKËQYRËS | | | | | SHIFRA 18 | |
|--|--|--|---------------------|--------------------|-------------------|---|---------------------|--|
| Projekti : | Ndërtimi i bazës së monumentit “NewBorn” | | | | | Vlera e projektit: 22.245,36 € | | |
| Investuesi : | Komuna e Prishtinës | | | | | Plani dinamik : 45 ditë kalendarike | | |
| Operatori : | NP “Izolimi”, adresa, Përroi i Njelmët, Prishtinë | | | | | Nr. 616 19189 521 dt.23.12.2019 | | |
| Menaxheri i projektit : | Zyhrie Pllana | | | | | Projekti i vitit 2019 | | |
| Organi mbikëqyrës : | Bashkim Statovci, Syzana Pllana, | | | | | | | |
| Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara | | | | | | | | |
| Vëllimi fizik | Punët e realizuara | Kanë përfunduar të gjitha punimet | | | | | | |
| | Punët në realizim | | | | | | | |
| Vëllimi financiar | Situacionet (Pagesat e proceduara) | Situacioni (I) | Situacioni (II) | Situacioni (III) | Situacioni (IV) | Situacioni (V) | | |
| | | 21.959.12 € | 0.0€ | 0.0€ | 0.0€ | 0.0€ | | |
| | | Situacioni (VII) | Situacioni (VIII) | Situacioni (IX) | Situacioni (X) | Situacioni (XI) | | |
| | | | | | | | | |
| Vonesat Shkalla e cilësisë | | | | | | | | |
| Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë | | ☞ Vërejtje me shkrim për dinamikën e punimeve: ditarët ndërtimorë, e-mail. | | | | | | |
| Vlerësimi i progresit në projekt | | | | | | | | |





|  RAPORTI MBIKËQYRËS | | SHIFRA 19 | | | | | |
|---|--|---|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Projekti : | Ndërtimi i rrugëve në lagjet “Canolli”, “Qazimaj” dhe “Sekiraqa” në fshatin Prapashticë, si dhe aneks-kontrata | Vlera e projektit: 279.385,68 € Vlera e aneks kontratës 27.930.0 € | | | | | |
| Investuesi : | Komuna e Prishtinës | Plani dinamik : 90 ditë kalenarike dhe 30 ditë për punët shtesë për vazhdim të aksit nr. 4 | | | | | |
| Operatori : | ”Milenium Konstruktion” SHPK | Nr. 616 19185521 dt. 09.01.2020 | | | | | |
| Menaxheri i projektit : | Sevdije Drenovci | Projekti i vitit 2020 | | | | | |
| Organi mbikëqyrës : | Jeton Zherka, Hazir Krasniqi | | | | | | |
| Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara | | | | | | | |
| Vëllimi fizik | Punët e realizuara | Punët paraprake, punimet e dheut dhe mbi struktura në lagjen “Canolli”, aksin nr. 4, “Qazimaj” dhe “Sekiraqa”. | | | | | |
| | Punët në realizim | Mbi struktura, si furnizimi me material 031 mm, në lagjen “Canolli”, aksi nr. 4, “Qazimaj” aksi nr.3 dhe “Sekiraqa”, aksi nr.3 A, lëshesa anësore, planifikim, hapje e kanaleve, si dhe përgatitja për asfalt; Punët shtesë në vazhdimin e rrugës “Canolli” deri te Varrezat e Dëshmoreve, si material mbushës guror jokoherent, shtrirja dhe ngjeshja, si dhe përgatitja për shtresa tjera që do të vendosen me kontrat tjetër. | | | | | |
| Vëllimi financiar | Situacionet (Pagesat e proceduara) | Situacioni (I) | Situacioni (II) | Situacioni (III) | Situacioni (IV) | Situacioni (V) | Situacioni (VI) |
| | | 50,000.00€ | 45,000.00€ | 0.0€ | 0.0€ | 0.0€ | 0.0€ |
| | | | | | | | |
| Vonesat Shkalla e cilësisë | Do të ketë vonesa për shkak të disa mangësive në projekt | | | | | | |
| Rekomandime, masat për t’u ndërmarrë | ☞ Është rekomanduar operatori ekonomik që cilësia e punimeve të jetë komfor kontratës dhe paramasës. | | | | | | |
| Vlerësimi i progresit në projekt | Punimet do të përfundojnë në vitin 2020. | | | | | | |







| PRISHTINA | | RAPORTI MBIKËQYRËS | | | | | SHIFRA 20 |
|--|---|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|--|----------------------------|
| Projekti : | Rekonstruimi i Rrugëve dhe Parkingjeve në lagjen Dardania | | | | | Vlera e projektit: 348,738.94€ | |
| Investuesi : | Komuna e Prishtinës | | | | | Plani dinamik : 120 ditë | |
| Operatori : | OE "ALKO-IMPEX-General Construction", SHPK, Prishtinë | | | | | Nr. 616 -19- 1011-5-1-1, dt. 04.11.2019 | |
| Menaxheri i projektit : | Qazim Bajrami nga DIKMK | | | | | Projekti i vitit : 2019 | |
| Organi mbikëqyrës : | Suzana Pllana, Behxhet Gashi nga DIKMK | | | | | | |
| Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara | | | | | | | |
| Vëllimi fizik | Punët e realizuara | Ndërtimi i parkingut me pllaka në rrugën "Ilaz Kodra"; Ndërtimi i parkingut me pllaka të ndërmarrja "Termokos"; Gërryerja e asfaltit në tri parkingjeve në lagjen "Dardania" Asfaltimi i dy parkingjeve të nd. "Termokos". | | | | | |
| | Punët në realizim | Gërryerja e shtresave të asfaltit të tri parkingjeve në lagjen "Dardania"; Montimi i skajoreve, përgatitja për asfaltim; Asfaltimi i parkingut të "Veteranët" | | | | | |
| Vëllimi financiar | Situacionet (Pagesat e proceduara) | Situacioni I | Situacioni II | Situacioni III | Situacioni IV | Situacioni V | Situacioni VI |
| | | 55,000.00 08/05/2020 | 50,000.00 16/06/2020 | 90,000.00 17/08/20 | | | |
| Vonesat Shkalla e cilësisë | | | | | | | |
| Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë | | <i>Gjatë ndërtimit të parkingjeve kemi hasur në probleme, për shkak të automjeteve të cilat nuk po i largojnë nga parkingjet. Disa herë kemi kërkuar ndihmë edhe nga policia, por nuk kemi pasur përkrahje që t'i largojmë automjetet, me arsyetimin se automjetet janë të parkuara në parkingje legale. Kështu po shkaktohen vonesa në përfundimin e punimeve.</i> | | | | | |
| Vlerësimi i progresit në projekt | | Për shkak të gjendjes aktuale, nuk është duke u punuar me kapacitet të plotë. Prej dt. 01.06.2020, janë rritur kapacitetet. | | | | | |



Parkingu te rruga "Ilaz Kodra"





Parkingu te rruga "Ilaz Kodra"



Parkingu te "Termokosi"



Parkingu te "Termokosi"






PARKINGU TE TERMOKOSI"







|  RAPORTI MBIKËQYRËS | | SHIFRA | | | | | |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 21 | | | | | |
| Projekti : | Ndërtimi i rrethit përballë Stacionit të Autobusëve, lidhja rrugore “Dardani” – “Emshir” | Vlera e projektit: 388.258,51€ | | | | | |
| Investuesi : | Komuna e Prishtinës | Plani dinamik : 120 ditë | | | | | |
| Operatori : | OE KNPSH “Papenburg” & “Adriani Company” SHPK, Ferizaj | <i>Nr. 616 -19- 5675-5-2-1</i> <i>dt. 18.10.2019</i> | | | | | |
| Menaxheri i projektit : | Qazim Bajrami nga DIKMK | Projekti i vitit : 2019 | | | | | |
| Organi mbikqyrës : | Dukagjin Buçaj, Sevdije Drenovci, Behxhet Gashi nga DIKMK | | | | | | |
| Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara | | | | | | | |
| Vëllimi fizik | Punët e realizuara | Ka përfunduar asfaltimi i rrugëve “Ilaz Kodra”, ”Isa Boletini”, “Sadik Bekteshi” dhe “Idriz Gjilani” | | | | | |
| | Punët në realizim | Demolimi i trotuareve për zgjerimin e rrugës “Mustafa Venhari”, montimi i gurëve skajorë dhe montimi i pllakave të trotuarit, përgatitja e rrugës për asfaltim, sinjalizimi i shtegut të bicikletave. | | | | | |
| Vëllimi financiar | Situacionet (Pagesat e proceduara) | Situacioni I | Situacioni II | Situacioni III | Situacioni IV | Situacioni V | Situacioni VI |
| | | 50,000.00 06/05/20 | 50,000.00 18/06/20 | 50,000.00 17/07/2020 | 50,000.00 10/08/20 | | |
| Vonesat Shkalla e cilësisë | | | | | | | |
| Rekomandime, masat për t’u ndërmarrë | | <i>Prej dt. 01.06.2020, janë rritur kapacitetet. Më në fund KOST-i i ka kryer punimet në rrugën “Isa Boletini”.</i> | | | | | |
| Vlerësimi i progresit në projekt | | Ka vonesa në realizimin e kontratës në afatin e paraparë, për shkak të pandemisë dhe për shkak se nuk po mund t’i hapim punimet në të gjitha rrugët e parapara për rikonstruktim, sepse do të bllokohej e tërë lagja “Dardania”. | | | | | |










Asfaltimi i rrugës "Idriz Gjilani"





Ngjyrosja e shtegut të bicikletave në rrugën "Ilaz Kodra"
Asfaltimi i rrugës "Ilaz Kodra"



|  RAPORTI MBIKËQYRËS | | SHIFRA 22 | | | | | |
|---|--|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
| Projekti : | Rikonstruktimi i rrugëve “Gazmend Zajmi”, “Ali Pashë Tepelena” dhe “Karl Gega” | Vlera e projektit: 680.742,50€ | | | | | |
| Investuesi : | Komuna e Prishtinës | Plani dinamik : 120 ditë | | | | | |
| Operatori : | OE “JOOS&KRASNIQI-BAZE” SHPK, Junik, Deçan | Nr. 616 -19-1832-5-1-2 dt. 02.09.2019 | | | | | |
| Menaxheri i projektit : | Qazim Bajrami nga DIKMK | Projekti i vitit : 2019 | | | | | |
| Organi mbikëqyrës : | Krenar Xhaferi, Bashkim Statovci, Hazir Krasniqi nga DIKMK | | | | | | |
| Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara | | | | | | | |
| Vëllimi fizik | Punët e realizuara | Piketimi i trasesë sipas projektit, demolimi dhe punimi i një segmenti të trotuarit, gërryerja e një shtrese të asfaltit prej 9300m ² , ngritja e ujëmbledhësëve. Asfaltimi i rrugës 9000m ² . Përfundimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik në rrugët “Ali Pashë Tepelena”, “Karl Gega” dhe “Gazmend Zajmi”. Asfaltimi i shtresës së parë të rrugëve “Karl Gega”, “Ali Pashë Tepelena” dhe një segmenti të rrugës “Gazmend Zajmi”. Asfaltimi i shtresës së parë të rrugës “Rexhep Krasniqi”. | | | | | |
| | Punët në realizim | Përgatitja e një segmenti të rrugës “Gazmend Zajmi” për asfaltim dhe përgatitja e rrugëve “Karl Gega”, “Ali Pashë Tepelena” dhe “Rexhep Krasniqi” për asfaltimin e shtresës së dytë. | | | | | |
| Vëllimi Financiar | Situacionet (Pagesat e proceduara) | Situacioni I | Situacioni II | Situacioni III | Situacioni IV | Situacioni V | Situacioni VI |
| | | 31.10. '19 50,000.00 | 11.12.2019 60.000,00 | 07.05.2020 55,000.00 | 09.07.2020 250,000.00 | | |
| Vonesat Shkalla e cilësisë | | | | | | | |
| Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë | | <i>Edhe në këto rrugë kemi probleme, pasi që kompania KEDS ka leje për gropim për vendosjen e kablllove dhe ende nuk i kanë përfunduar punimet, kështu që po shkaktohen vonesa.</i> | | | | | |
| Vlerësimi i progresit në projekt | | Prej dt. 01.06.2020 janë rritur kapacitetet në punishte. | | | | | |









RIASFALTIMI I RRUGËS "XHELADIN HANA"





Komuna e Prishtinës
RAPORTI MUJOR

| | |
|--------------------------------|---|
| Drejtoria | Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave |
| Spektori | Menaxhimi i kontratave për ndërtim të lartë |
| Periudha raportuese | Gusht, 2020 |
| Emri dhe mbiemri i raportuesit | Ferit Fazliu, udhëheqës i Sektorit |

- PËRMBLEDHJE**

Ky sektor në bazë të detyrave programore, kryesisht është marrë me përpunimin e lëndëve me problematikë të ndërtimit, hartimin e detyrave projektuese, mbikëqyrjen e projekteve, mbikëqyrjen e objekteve, hapjen dhe vlerësimin e tenderëve, pjesëmarrje në komisionet e caktuara nga Kryetari i Komunës dhe drejtori i Drejtorisë për lëmin e ndërtimit, dhe veprimtari të tjera që kanë të bëjnë me këtë sektor.

- AKTIVITETET E PLANIFIKUARA PËR VITIN 2020**

Për vitin 2020 janë planifikuar këto aktivitete të Sektorit për menaxhimin e kontratave të ndërtimit të lartë, e që janë dhe pjesë e aktiviteteve të Drejtorisë:

- Pjesëmarrja në hapjen dhe vlerësimin e tenderëve;
- Mbikëqyrja e kontratave të ndërtimit të lartë të projekteve që investon Komuna ose investuesve të tjerë për nevoja të Komunës:
 - Rritja e efikasitetit dhe kualitetit në realizimin e kontratave,
 - Realizimi i planit dinamik dhe ruajtja e buxhetit;
- Përgatitja e raportit mujor dhe vjetor;
- Këshillimi i drejtorit dhe sektorëve tjera për çështjet e ndërtimit, si dhe
- Aktivitete të paplanifikuara, me kërkesë të organeve të Komunës.

- **AKTIVITETET E REALIZUARA**

Gjatë këtij muaji janë ekzekutuar këto aktivitete:

Gjithsej vlera e kontratave që janë në menaxhim të këtij sektori është:

| | |
|------------------------------|----------------|
| | 5,101,384.95 € |
| Të paguara deri më tani janë | 891,558.54 € |
| Dallimi | 4,209,826.41 € |

Nga kjo vlerë e mbetur, janë 2,904,113.50 € kontrata të kontraktuara në vitin 2015 e që nuk kanë filluar fare.

Kjo vlerë e kontraktuar përfshin 23 kontrata, të bartura nga viti 2015 dhe nga viti 2019:

- 4 kontrata të pa filluara,
- 1 kontrata e ndërprerë,
- 18 kontrata janë në vazhdim.

KONTRATAT QË VAZHDOJNË NGA VITET PARAPRAKE DHE TË KËTIJ VITI

| 1. Renovime dhe rindërtime të objekteve shëndetësore | |
|--|-----------------------------------|
| Gjatë këtij muaji janë zhvilluar punimet ne: QMF 5, renovimi i një pjese të katit përdhes. Ngjyrosja, keramika, vendosja e dyerve. | |
| Vlera e projektit: | 334.267,50€ |
| Nr i kontratës dhe data. | Nr. 616-18-104-521, dt. 1.11.2018 |
| Investuesi | Komuna e Prishtinës |
| Te paguara deri me tani | 285.660,00 € |
| Menaxheri i projektit: | Nazmije Tora |
| Operatori ekonomik | NTP "Ulpiana" & "Mati" SHPK |
| Kontrata ka përfunduar, ka mbetur vetëm përmbyllja e kontratës. | |
| Foto gjatë ekzekutimit të punimeve | |
| | |

| 2. Ndërtimi i stadiumit të futbollit në fshatin Hajvali | |
|---|---|
| Vlera e projektit: | 96,954.14€ |
| Nr i kontratës dhe data. | 616 14 176 521 - 19.12.2014 |
| Investuesi | Komuna e Prishtinës |
| Plani dinamik | 45 ditë |
| Operatori ekonomik | NNP "Zhvillimi" |
| Të paguara deri më tani | 40.000,00€ |
| Menaxheri i kontratës: | Hyrishahe Morina |
| Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë | Gjatë këtij muaji nuk është |
| Vlerësimi i progresit në projekt | Nuk ka pasur aktivitete gjatë këtij muaji |
| Fotot e ekzekutimit të punimeve | |
| Nuk ka pasur zhvillime të punimeve | |

| 3. Rregullimi i oborreve dhe terrenve sportive | |
|--|---|
| Aktivitete të shtuara në shumë vendpunishte | |
| Vlera e projektit: | 197,287.00€ |
| Nr i kontratës dhe data. | Nr. 616 19 072 521, dt. 09.07.2019 |
| Investuesi | Komuna e Prishtinës |
| Menaxheri i projektit: | Ylber Jashari |
| Operatori ekonomik: | NBT "ING" |
| Të paguara | 211.277.00 € (katër situacione) |
| Mbarëvajtja e punimeve: | Aktivitete të shtuara në shumë vendpunishte |
| FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE | |
| Nuk kemi raport për këtë muaj nga menaxheri | |

| 4. Rikonstruktimi dhe mirëmbajtja e kulmeve të shkollave | |
|--|-------------------------------|
| Janë realizuar punime në : Nuk kanë dërguar raport (nuk ka informacione) | |
| Vlera e projektit: | 74,445.00€ |
| Nr. i kontratës dhe data. | 616 19 075 521 dt. 29.07.2019 |
| Investues: | Komuna e Prishtines |
| Operatori ekonomik: | EURO KONSTRUKSION |
| Të paguara | 68.712.84 € |
| Menaxher i kontratës | Ylber Jashari |
| Mbarëvajtja e punimeve: | |
| | |
| Nuk kemi raport specifik për këtë muaj nga menaxheri | |

| 5. Konkurs për punimin e projektit ideor arkitektonik Tregu i Ulpianës |
|--|
| Gatë këtij muaji janë zhvilluar punimet në: |

| Kanë mbetur përmirësimet në projektin e statikës | |
|--|---------------------------------|
| Vlera e projektit: | 35000,00 |
| Nr. i kontratës dhe data. | 616-19-018-421, dt. 06.08.2019 |
| Investuesi | Komuna e Prishtinës |
| Plani dinamik | 60 ditë |
| Operatori ekonomik | “Alfa Produkt” - Blerim Lutolli |
| Menaxher i projekti: | Ferit Fazliu |
| Projekti është në përfundim e sipër. Ka mbetur dorëzimi i të njëjtit - projekti nuk është dorëzuar për shkak të pandemisë (kanë qenë të infektuar me virus projektuesit) | |

| 6. “Kontrata kornizë, Loti 2 - Renovimi dhe mirëmbajtja e dysHEMEVE në shkolla dhe objekte të tjera komunale” | |
|---|---|
| Vlera e projektit: | 319.800,00 € |
| Nr i kontratës dhe data. | 616-19-3413-5-1-1 |
| Investuesi | Komuna e Prishtinës |
| Plani dinamik | 12 muaj |
| Të paguara deri më tani | 204.213.43 € |
| Operatori ekonomik | OE “Rexha” sh.pk. & “Arb Ing” Sh.p.k.- Prishtinë, |
| Menaxher i projektit: | Burbuqe Agushi |
| Të paguara deri më tani: | 204.213.43 euro |
| Fotografi nga punishtja | |
| SHMU “Hasan Prishtina” | |
|  | |



SHMU "Ismail Qemali:






IP "Dielli"






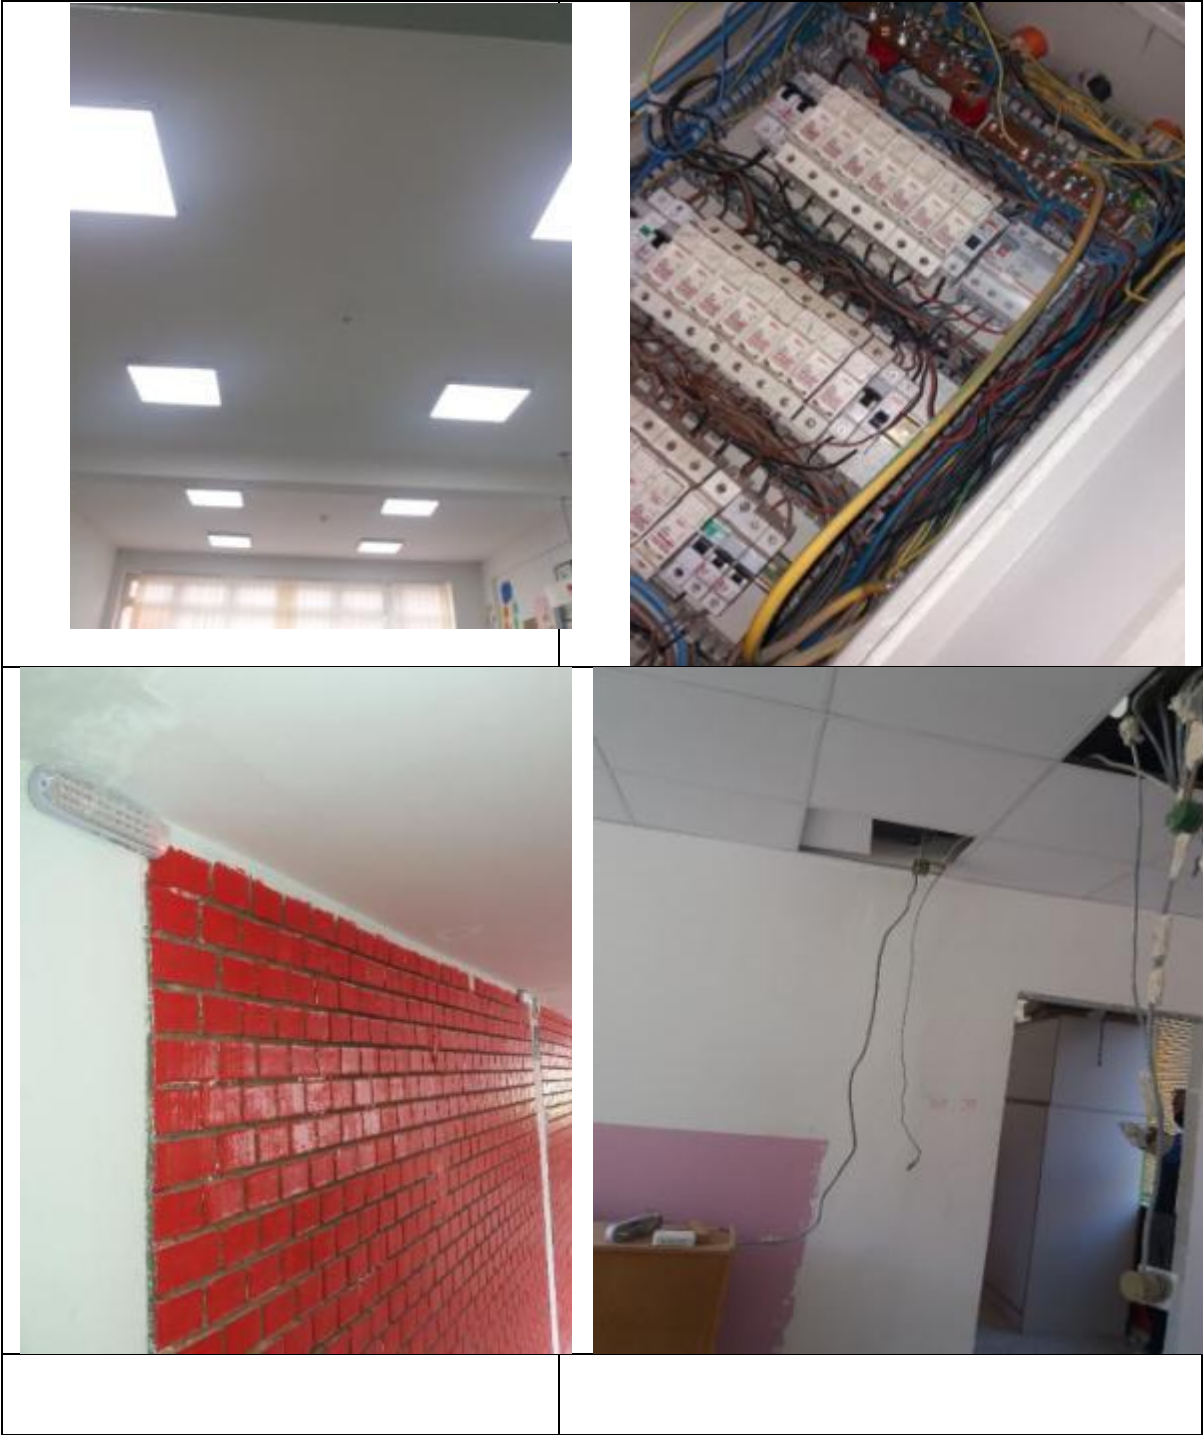

| | |
|---|--|
| 7. "Furnizimi dhe mirëmbajtja e dyerve dhe dritareve në shkolla dhe objekte të tjera komunale," Loti 3 | |
| Vlera e projektit: | 134.700,00 Euro |
| Nr i kontratës dhe data. | Nr. 616-19-3413-5-1-1, dt. 20.08.2019 |
| Investuesi | Komuna e Prishtinës |
| Plani dinamik | Kontratë njëvjeçare |
| Operatori ekonomik | OE "Olti Trasing" SHPK, Prishtinë |
| Të paguara deri më tani | 13,705.44 € |
| Menaxher i kontratës: | Albina Berisha |
| Nga menaxheri i kontratës është propozuar shkëputja e kontratës, për shkak të ekzekutimit të punimeve jashtë përshkrimit të kontratës dhe për mos eliminim të vërejtjeve. | |
| Nuk kemi raport të veçanta për këtë muaj nga menaxherja. | |
| 8. "Mirëmbajtja e elektrikës në shkolla" - kontratë kornizë 3-vjeçare | |
| Në kontratën "Instalimi dhe mirëmbajtja e elektrikes në Institucione Arsimore", punimet në këtë kontratë kanë filluar më 30.08.2019. Punimet janë duke u zhvilluar sipas kërkesave dhe prioriteteve për intervenim nga Drejtoria e Arsimit në objektet e shkollave dhe çerdheve. | |
| Gjatë muajit korrik 2020, me këtë kontratë është intervenuar në këto institucione: | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. IP "Dielli", 2. SHFMU "MetoBajraktari" | |
| Nr. i kontratës dhe data: | Nr. 616 -19-100-221, dt. 02.07.2019. |
| Vlera e projektit: | 70.000,00€ |
| Investuesi: | Komuna e Prishtinës |
| Operatori ekonomik: | Konzorciumi "Lightand More" SHPK NTSH "Monting" |
| Menaxher i kontratës: | Amire Krasniqi |
| Të paguara: | 67.711.55 € |
| Fotot e ekzekutimit të punimeve | |



| 9. Riorganizimi dhe renovimi i disa hapësirave në objektin e vjetër dhe të ri të të Komunës së Prishtinës | |
|--|--|
| Vlera e projektit: | 75,048.35 € |
| Nr i kontratës dhe data. | Nr. 616 016 103 521, dt. 09.10.2019 |
| Investuesi | Komuna e Prishtinës |
| Plani dinamik | |
| Operatori ekonomik | “TOSI” |
| Të paguara deri më tani | |
| Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara | |
| Pas konsultimeve me firmën projektuese dhe ekipin profesionale nga DIKMK, është vendosur të mos thyhen muret për realizimin e ventilimit dhe është vendosur te zhvendosen kanalet. | |
| Foto gjatë ekzekutimit të punimeve | |
|  |  |

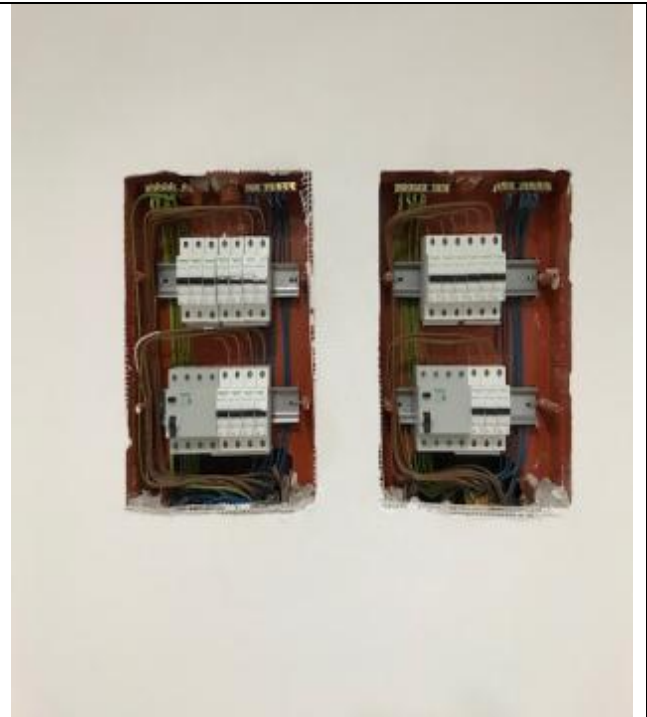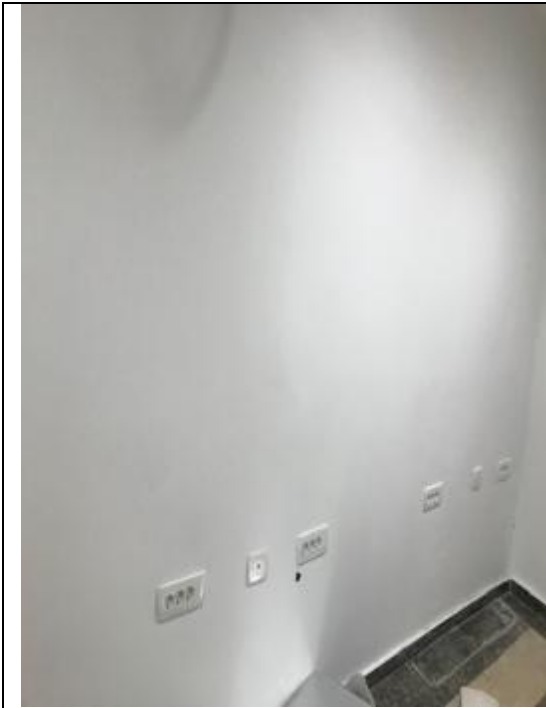


| 10. "Kontratë për hartimin e projekteve" | |
|---|-----------------------------|
| Vlera e projektit: | 60950.00€ |
| Nr i kontratës dhe data. | 616-19-4217-2-2-1 |
| Investuesi | Komuna e Prishtinës |
| Plani dinamik | Kornizë njëvjeçare |
| Operatori ekonomik | OE "PROING & PARTNERS" SHPK |
| Menaxheri i projektit : | Ark. Nazmije Tora |
| Të paguara deri më tani: | |
| Nuk kam marrë raport specifik për këtë muaj nga menaxherja. | |

| 11. Ndërtimi i strehimoreve për qentë endacakë dhe trajtimi i tyre | |
|--|---------------------------------------|
| Vlera e projektit: | 60,950.00€ |
| Nr i kontratës dhe data. | Nr. 616-19-4217-2-2-1, dt. 02.12.2019 |
| Investuesi | Komuna e Prishtinës |
| Plani dinamik | Kornizë njëvjeçare |
| Operatori ekonomik | OE "PROING & PARTNERS" SHPK |
| Menaxheri i projektit : | Hyrishahe Morina |
| Të paguara deri më tani: | |
| Punët në realizim : Punimet nuk kanë filluar ende. | |

| 12. Rregullimi i ambientit për ekspozimin e veprave të artit | |
|--|---|
| Vlera e projektit: | 49.171,20€ |
| Nr i kontratës dhe data. | Nr. 616-19-8110-5-2-1, dt. 31.12.2019 |
| Investuesi | Kuvendi Komunal Prishtinë |
| Plani dinamik | 60 ditë |
| Operatori ekonomik | "Tribuna" SHPK |
| Menaxheri i projektit : | Ferit Fazliu |
| Të paguara deri më tani: | Është përgatitur situacioni i parë, në vlerë 16,390.85 euro |
| Foto nga punishtja | |





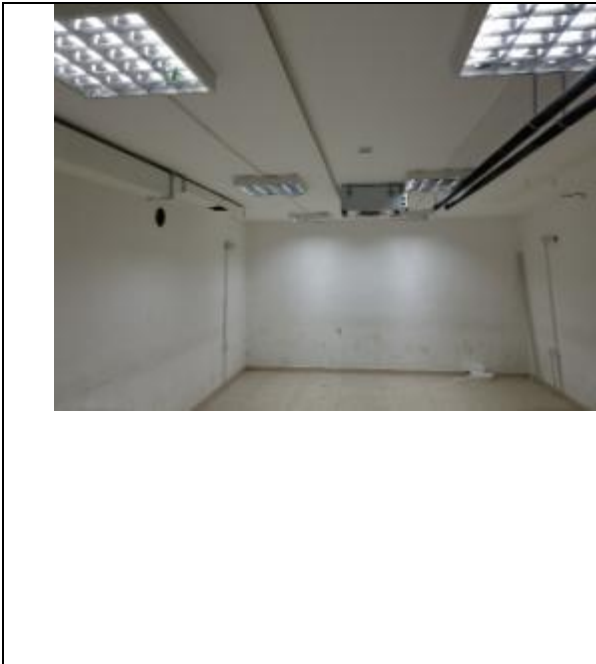



| 13. "Renovimi dhe përmisimi i infrastrukturës së objektit të QMU-së" | |
|--|--|
| Vlera e projektit: | 206,811.00€ |
| Nr i kontratës dhe data. | Nr. i prokurimit 616 -19-8152-5-2-1, dt. 10. 01.2020 Nr. i brendshëm 616 19 183 521 |
| Investuesi | Komuna e Prishtinës |
| Plani dinamik | 60 ditë |
| Operatori ekonomik | "ENGRUP" SHPK Rr. "Bregu i Diellit", Zona Perëndimore - lam12- Prishtinë |
| Menaxher i projektit: | Vjosa Rexhepi |
| Të paguara deri më tani: | |
| Foto nga punimet | |
| | |
| | |





14. Ndërtim i aneksit të çerdhes “ Shtëpia Magjike” Besi

Gjatë këtij muaji janë zhvilluar punimet në:

Vendosjen e pllakave të keramikës në të dy WC-të dhe lavanteri. Gjithashtu është përfunduar nivelimi dhe izolimi i jashtëm i themeleve me kondor 3mm+4mm. Në pjesën e aneksit të shtuar dhe në pjesën ekzistuese, janë vendosur dyert e hyrjes në hyrje të objektit, si dhe dyert në dalje në oborrin e kopshtit. Kemi ngecje në planin dinamik në këtë muaj, arsyetimi tharja e nivelimit të objektit. Punimet kanë filluar më 07.03.2020, ndërsa punimet janë ndërprerë më 14.03.2020, për shkak të vendimit të Qeverisë si pasojë e gjendjes së krijuar për shkak të përhapjes së coronavirusit COVID-19 dhe kanë rifilluar më 04.05.2020.

Vlera e projektit:

38 891.00 €


Nr i kontratës dhe data.

Nr. 616-19-158-511, dt. 19.12.2019

| | |
|--------------------------------|---|
| <i>Investuesi</i> | Komuna e Prishtinës |
| <i>Plani dinamik</i> | 90 ditë |
| <i>Operatori ekonomik</i> | Grupi i operatorëve ekonomikë "Self Made" LLC, Prishtinë dhe "Beni Konstruktion" SHPK, Viti |
| <i>Menaxheri i projektit :</i> | Bashkim Statovci |

Fotot:




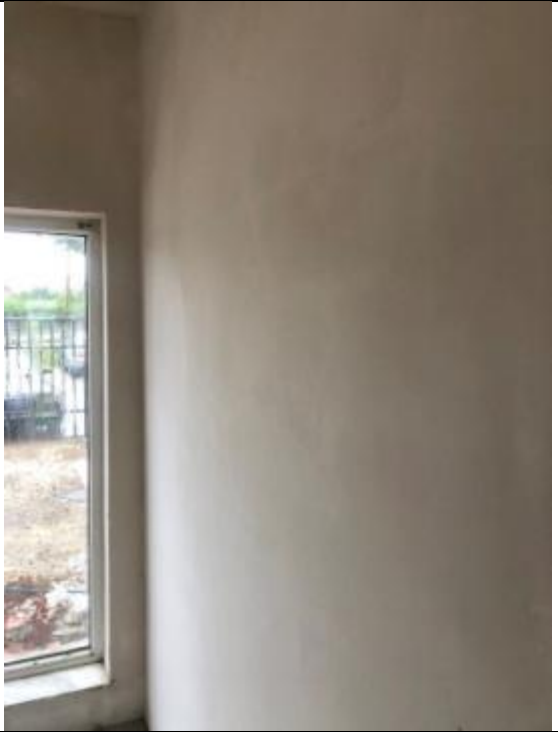



Raport për muajin korrik, 2020

| | |
|---|---------------------------|
| 15. " Renovimi i hapësirës së lokacioni te Drejtoria e Rrugëve" | |
| Punimet ende nuk kanë filluar | |
| Vlera e projektit: | 417,638.84 € |
| Nr. i kontratës dhe data. | 616 19 170 521 dt. |
| Investuesi | Kuvendi Komunal Prishtinë |
| Operatori ekonomik | "Rexha " sh.p.k |
| Menaxher i projektit : | GanimeteNitaj |
| Të paguara deri më tani | 50.000,00 |
| Foto nga terreni | |
| | |

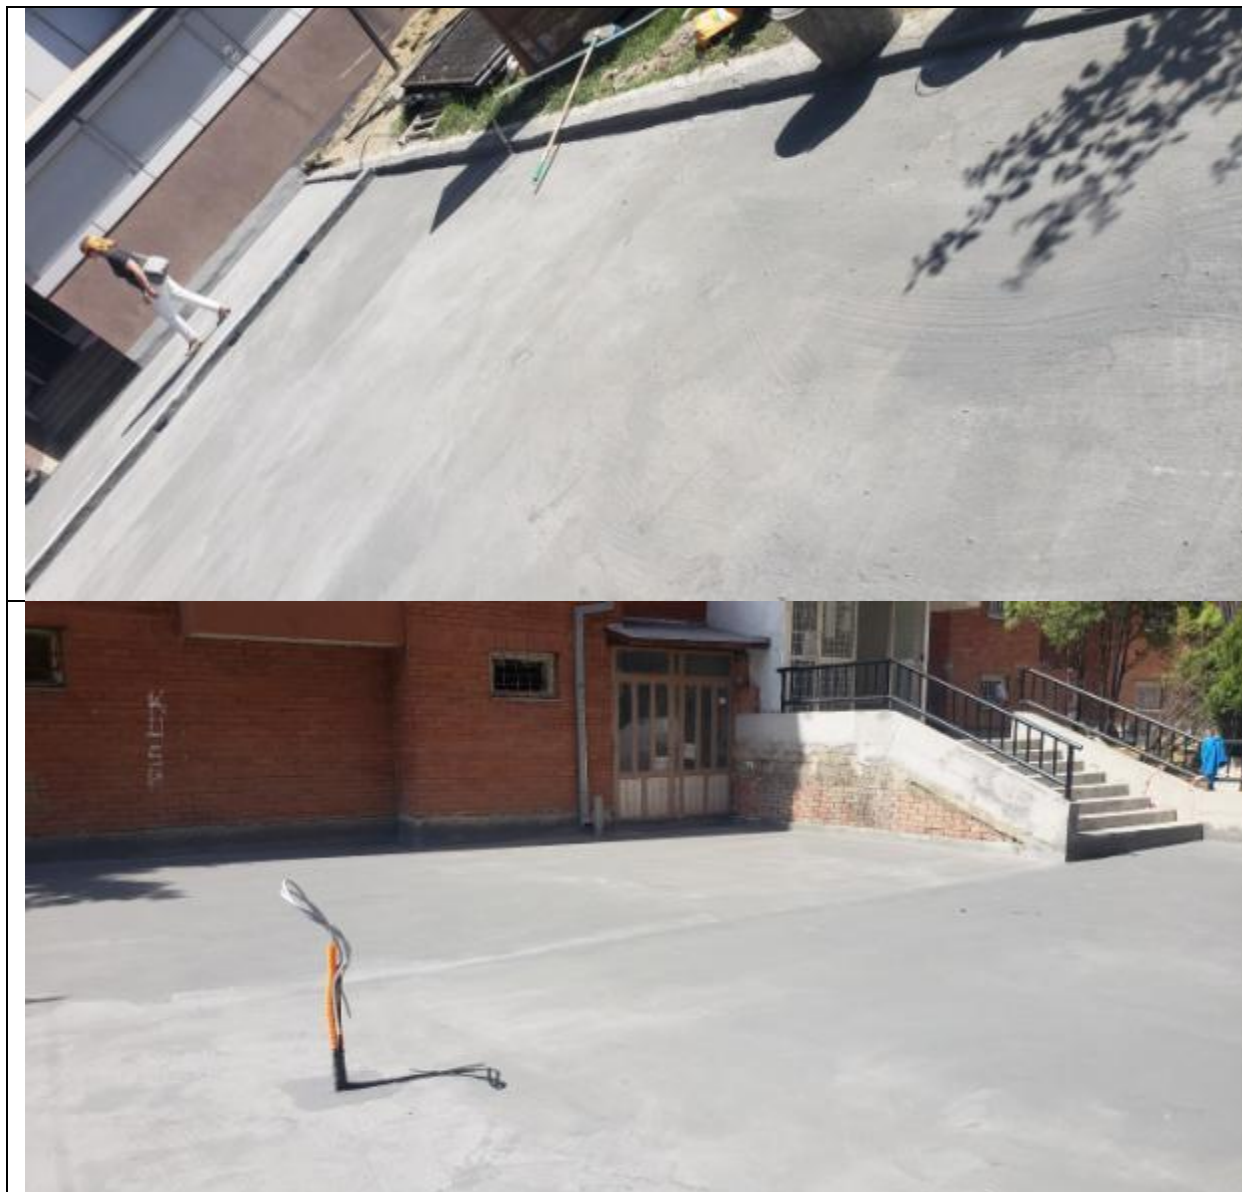


| 16. Implementimi i dyerve të sigurisë së lartë, sistemit të qasjes dhe pajisjeve tjera për arkivin në objektin e Komunës së Prishtinës | |
|--|---|
| Vlera e projektit: | 59,308.00€ |
| Nr. i kontratës dhe data. | Nr. 616 19 182 121, dt. 21.04.2020 |
| Investues: | Komuna e Prishtines |
| Menaxher: | Ylber Jashari |
| Operatori ekonomik: | “PROTECH” |
| Të paguara | 0.00€ |
| Mbarëvajtja e punimeve: | Aktivitete të shtuara në shumë vendpunishte |

Nuk kemi raport për këtë muaj

| 17. Rregullimi i kulmit te shkollës “Nexhmi Mustafa”, paralelja në Prugoc | |
|---|--|
| Vlera e projektit: | 48,576.50€ |
| Nr i kontratës dhe data. | Nr. 616 20 080 525, dt. 10.06.2020 |
| Investues | Komuna e Prishtinës |
| Operatori ekonomik: | “EURO KONSTRUKSION” |
| Menaxher i projektit: | Ylber Jashari |
| Të paguara | 48,576.50€ |
| Mbarëvajtja e punimeve: | Aktivitete të shtuara në shumë vend punishte |
| Nuk kemi raport për këtë muaj me foto të terrenit. | |

| 18. Renovimi i çerdhes “Gëzimi Ynë”, bashkëfinancim me Zyrën japoneze | |
|---|------------------------------------|
| Vlera e projektit: | 69,900.00 euro |
| Nr i kontratës dhe data. | Nr. 616 20 104 525, dt. 21.07.2020 |
| Investues | Komuna e Prishtinës |
| Operatori ekonomik: | “MakBuilding” SHPK, Vushtrri |
| Menaxher i projektit: | Ferit Fazliu |
| Të paguara | |
| Mbarëvajtja e punimeve: | Janë në vllugun e aktiviteteve |
| Foto nga terreni | |



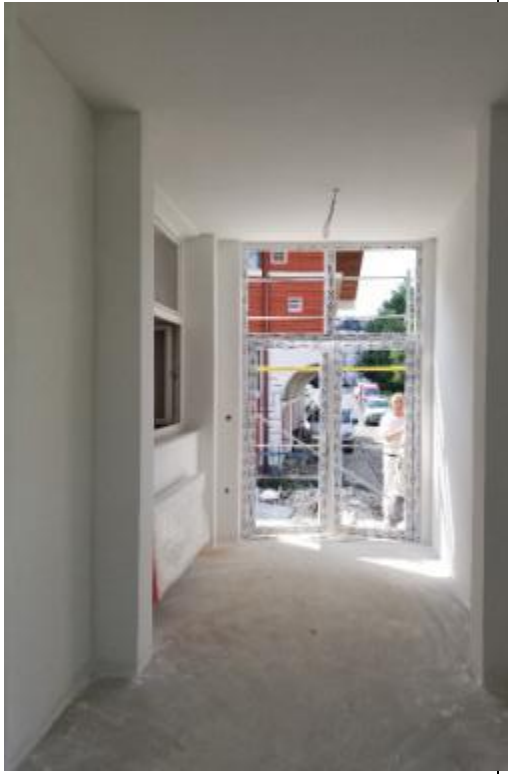

Intervenime dhe renovime në objekte shkollore, të përmbledhura nga Ylber Jashari

1. SHFMU "Filip Shiroka" - Fasadimi i objektit dhe izolimi i objektit, **ndërtimi i terrenit sportive, riparimi i kulmit, gëlqerosja;**
2. SHFMU "Isa Boletini" - Fasadimi i objektit dhe izolimi i objektit, **ndërtimi i sallës së sporteve, gëlqerosja;**
3. SHFMU "Nexhmi Mustafa" në Prugoc- Ndërtimi i kulmit të dëmtuar nga fryma, izolim dhe gëlqerosje, adaptimi i një klase dhe shtimi i një aneksi; në fshatin Rimanishtë është bërë gëlqerosja dhe ndërimi dysHEMEVE;
4. SHFMU "AsimVokshi" - Rregullimi i njejave sanitare;
5. SHFMU "Zenel Hajdini" – Rregullimi i njejave sanitare, **gëlqerosje, renovimi i komplet dysHEMEVE, riparimi i kulmit;**
6. SHFMU "Meto Bajraktari"- Rregullimi i dysHEMEVE, **gëlqerosja;**
7. SHFMU "Gjergj Fishta: - Rregullimi i dysHEMEVE, **gëlqerosja, rregullimi i njejave sanitare;**
8. Çerdhja "Dielli" - Renovim gjeneral i çerdhes;
9. Çerdhja "Gezimi Ynë" - Renovimi i tërësishëm i objektit 3 të çerdhes, në bashkëfinancim me Zyrën japoneze;
10. SHFML "Xhevdet Doda"- Rregullimi i njejave sanitare dhe sallës së ed.fizike;
11. SHFMU "Hasan Prishtina" – Rregullimi i dysHemesë;
12. Çerdhja "Lulevera"- Rregullimi i dritareve;
13. SHFMU "NaimFrasheri" – Rregulli i njejave sanitare, renovimi i disa klasave, renovimi sallës se ed.fizike, **shtruarja me gomë e fushës së sportit, gëlqerosje, rregullim i dysHEMEVE, inicimi i renovimit total të WC-së, në bashkëpunim me MASHT, riparimi i kulmit;**
14. SHFMU "IsmailQemaili" - Rrregullimi i nyjave sanitare, rregullimi i dysHEMEVE, adaptimi i disa kthinave të papërdorshme në ambiente mësimi, ndërimi i disa dyerve, rregullimi i dritareve, **gëlqerosja, renovimi i disa pjesëve të kulmit;**
15. SHFMU "Xhavit Ahmeti"- Izolimi dhe fasadimi i objektit , investim i Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik dhe KFW, **riparimi i kulmit, renovimi i dysHEMEVE në sallën e sportit;**
16. SHFMU "Anton Zako Çajupi", nyjat sanitare, rregullim i kamerav, furnizim me perde;
17. SHML "Dr. Ali Sokoli" - Rregullimi i ujit dhe kanlizimit- pajisja e laboratoreve, **riparimi i kulmit, ndërtimi i hyrjes komplet, renovimi i dysHEMEVE;**
18. SHFMU "Emin Duraku", funksionalizimi dhe shtimi i kamerave të sigurisë, **fusha e spotit, rrethoja e shkollës;**
- 19.SHFMU "Shkolla Model" - Riparimi i dysHEMEVE;
- 20.SHFMU "Elena Gjika" - Rregullimi i oborrit të shkollës, komplet;
- 21.SHFMU "Faik Konica, - Rregullimi i kulmit të sallës së sportit;
- 22.SHFMU "Pjeter Bogdani" - Rregullimi i dysHEMEVE, gëlqerosja;
- 23.SHFMU "Nazim Gafurri" - Rregullimi i dysHEMEVE, riparimi i kulmit, gëlqerosja;
- 24.SHFMU "Dardania" - Rregullimi i fasedës se dëmtuar, riparimi i kulmit;

- 25.SHFMU "Hilmi Rakovica" - Ndërtimi i aneksit për kalda me pelet;
- 26.SHFMU "Mitrush Kuteli" - Riparimi i kulmit, ndërtimi i dy para hyrjeve të reja;
- 27.SHFMU "SHkendija" - Rregullimi i fushës së sportit, rregullimi i oborrit komplet;
- 28.SHFMU "Dituria" - Gëlqerosje, rregullimi i komplet dysHEMEVE, riparimi i kulmit;
- 29.SHFMU "Filip Shiroka" - Paralelja në Lajshevc, ndërtimi i terrenit sportiv, rregullimi i oborrit, shpimi i pusit, furnizimi me ujë;
- 30.SHFMU "Teuta" - Riparimi i dysHEMEVE, gëlqerosja;
- 31.SHFMU "Ditët e Minatorit" - Ndërtimi i terrenit sportive, shpimi i pusit, furnizimi me ujë;
- 32.SHFMU "Rilindja" - Hapja e pusit, furnizimi me ujë;
- 33.SHFMU "Iliria" - Rregullimi i rrethojave të oborrit dhe rampës për hendikep;
- 34.IP "Fatosat" - Rregullimi i rrethojës së çerdhes, riparimi i kulmit, riparimi i dyerve dhe dritareve;
- 35.IP "Buzëqeshja" - Rregullimi i kanalizimit;
- 36.IP "Ardhmëria" - Rregullimi i shkallëve të hyrjes;
- 37.IP "Xixëllonja" - Hartimi i projektit për objektin e ri;
- 38.SHFMU "Pavarësia" - Hartimi i projektit për aneksin me 12 klasë;
- 39.SHML "7 Shtatori" - Hartimi i projektit për ndërtimin e objektit të ri;
- 40.IP "Yllkat" - Objekti i ri, financuar nga MASHT, inventarizimi komplet KP;
- 41.IP "Shtëpia Magjike", - Ndërtimi i aneksit të ri;
- 42.SHFMU "Nëna Terezë" - Hartimi i projektit për ndërtimin e shkollës së re;
- 43.SHFMU "Nëna Terezë" - Ndarja e klasave, gëlqerosja e shkollës;
- 44.SHFMU "Avni Rrustemi" - Ndërtimi i sallës së sportit;
- 45.SHML "28 Nëntori" - Riparimi i kulmit.

PROJEKTET E KONTRAKTUA DHE TË PAFILLUARA

1. Ndërtimi i shkollës fillore në lagjen "Mati 1", vlera e projektit është 1,458,452.95€, nr. id. 61615061511, dt. 23.07.2015, punimet nuk kanë filluar, është në procedurë gjyqësore për çështje pronësore;
2. Ndërtimi i Sallës së edukatës fizike "ShtjefënGjeqovi", vlera e projektit është : 238,564.24€, nr. id. 616 15 156 521, dt. 22.10.2015; punimet janë ndërprerë për shkak të çështjeve pronësore.
3. Ndërtimi i shkollës në lagjen "Kalabria", vlera e projektit është 1,458,452.95 €, nr. Id. 61615135511, dt. 30.10.2015; punimet nuk ka fillua për shkak të çështjeve pronësore.

✓ KËRKESAT E SEKTORIT

Kërkesa shumë të nevojshme:

- Sigurimi i pajisjeve për sigurinë e stafit në punishte (helmëta, këpucë, syze etj. Shumë të domosdoshme);
- Mungojnë inxhinieri i elektros, i makinerisë dhe inxhinieri i ndërtimtarisë, drejtimi hidro;
- Trajnime të stafit për vlerësimin dhe menaxhimin e projekteve-kontratave;
- Pjesëmarrja në panairët e ndërtimit, me qëllim të njoftimit me materialet e reja të ndërtimit.

Drejtori :
Gëzim Mehmeti

Prishtinë, gusht 2020
