



Raporti i vitit 2020

Nentor 01- 30.11.2020

1. Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave

Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave gjatë muajit nëntor 2020, ka kryer këto aktivitete: kërkesat për hartimin e detyrave projektuese dhe identifikimin e nevojave, shqyrtimin e kërkesave të banorëve të bashkësive lokale dhe inkorporimin e tyre në planet e Komunës, njoftimi me kohë i kompanive publike dhe subjekteve relevante me qëllim të koordinimit të punëve, incizimi i gjendjes ekzistuese të infrastrukturës në qytetin e Prishtinës, si dhe kompletimi i dokumentacionit teknik për procedimin e tyre në organet kompetente, mbikëqyrja e realizimit të projekteve konform marrëveshjes etj.

1.1. Shqyrtimi i kërkesave

Gjatë muajit nëntor 2020, Drejtoria ka proceduar 105 kërkesa të ndryshme të bashkësive lokale dhe banorëve: për ndërtimin e rrugëve, trotuareve dhe kanalizimeve, kërkesa për rregullimin e rrugëve dhe kanalizimeve, kërkesa nga kompanitë publike - leje për gropim dhe intervenime për sanimin e defekteve të ndryshme, kërkesa nga kompanitë për formime të komisioneve për kontrollimin e punëve, kërkesa të natyrave të ndryshme rreth definimit të zgjidhjes në terren etj. Nga numri i përgjithshëm prej 105 kërkesave të pranuar, 73 kërkesa janë të përfunduara.

1.2. Dërgimi i kërkesave për hartimin e detyrave projektuese dhe identifikimi i nevojave


Duke marrë për bazë Ligjin mbi planifikimin hapësinorë, Ligjin mbi ndërtimin e objekteve investive, si dhe Ligjin për projektim, e në veçanti planet rregulluese, janë dërguar kërkesat për hartimin e detyrave projektuese në zonat urbane dhe rurale.



1.3. Raportimi i menaxherëve të projekteve infrastrukturore

Drejtoria	Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave
Sektori	Menaxhimi i Kontratave (Ndërtimi i ulët)
Drejtori	Gëzim Mehmeti
Raportoi	Dukagjin Buqaj, idn., UD i shefit të Sektorit
Kontrolloi – Përpunoi	Muhamed Emra, idn., zyrtar i lartë për ndërtim urban
Periudha raportuese	01 - 30.11.2020, muaji nëntor
Menaxhëret e projekteve	Muhamed Emra Irfete Zejneli Syzana Pllana Qazim Bajrami Dugagjin Buqaj Ibrahim Gervalla Zyhrije Pllana
Organi mbikëqyrës	Azem Buzuku Aferdita Sopi Behxhet Gashi Ramadan Nebiu Hazir Krasniqi Amire Krasniqi Bujar Rama

PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 01
Projekti :	<i>Rikonstruktimi i rrugës "Agim Ramadani"</i>						Vlera e projektit: 398.092,40€
Investuesi :	Komuna e Prishtinës						Plani dinamik 180 ditë
Operatori :	SHPK "RSM Company"						Nr. 616 019 028 511 dt. 21.04.2020
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra, idn.						Projekti i vitit: 2020
Organi mbikëqyrës :	Syzana Pllana, ing.hidro., Bujar Rama, ing. gjeod. Sevdije Drenovci, ing.komunikac., Bashkim Statovci, ing.elektros						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	- Vendosja e sinjalimit horizontal.					
	Punët në realizim	- Përgatitja dhe shtresimi i shtegut të biçikletavbe me AB-11 t=4.0cm					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50.410,0€	50.000,0€	106.858,50			
Vonesat Shkalla e cilësisë	--			Mesatar			
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë	Për shkak të projektit të rehabilitimit të rrjetit kabllor dhe elektrik nga korporata e KEDS, operatori nuk mund të punojë me kapacitet të plotë dinamik.						
Vlerësimi i progresit në projekt	Duke i pasur parasysh pengesat nga qarkullimi i dendur i veturave dhe zhvillimit të punimeve nga operatori KEDS, punimet janë duke u zhvilluar me kapacitet jo të plotë dinamik.						

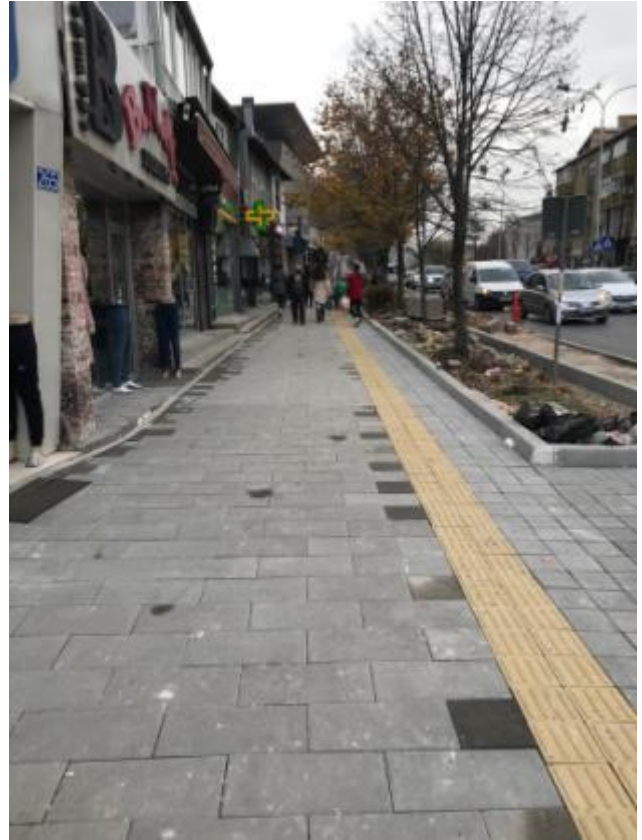









PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 02	
Projekti :	<i>Ndërtimi i rrugës në lagjen "Isufi", Keqekollë</i>					Vlera e projektit: 117,164.07 €		
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik 90 ditë kalendarik		
Operatori :	NPSH "Bageri"					Nr. 616 20 039 511 Dt. 21.10.2020		
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra, idn.					Projekti i vitit: 2020		
Organi mbikëqyrës :	Zyhrije Pllana, ida, Behxhet Gashi, teknik i ndërt.							
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> - Furnizimi dhe shtresimi i trupit të rrugës me zhavorr 0-63 mm; - Furnizimi dhe shtresimi i trupit të rrugës me zhavorr 0-31 mm; - Furnizimi dhe montimi i lëshesave betonarme me koka; - Formësimi i skarpatave dhe gërmimi i kanalit. 						
	Punët në realizim	- Përgatitja për shtresimin e rrugës për asfaltbeton Ab-16 t=8.0cm.						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)	
		30.100,0€						
Vonesat Shkalla e cilësisë		--			Mesatar			
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë		Operatori është duke i zhvilluar punimet sipas projektit, gjegjëisht kontratës, konform planit dinamik të paraparë.						
Vlerësimi i progresit në projekt		Punimet janë duke u zhvilluar sipas planit të paraparë dinamik						











 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 03					
Projekti :	<i>Ndërtimi i rrugës në Mramor, lagja “Kullaj”</i>	Vlera e projektit: 144,822.25 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik 90 ditë kalendarik					
Operatori :	NPSH “Beni Construction” SHPK, Vb Tofaj	Nr.616 200 39 511 21.10.2020					
Menaxheri i projektit :	Zyhrije Pllana, ida.	Projekti i vitit: 2020					
Organi mbikëqyrës :	Dukagjin Buçaj, idn. Aferdita Hasimi, idn.						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	- Gërmimi i trupit të rrugës					
	Punët në realizim						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
Vonesat, shkalla e cilësisë		--			Mesatar		
Rekomandime, masat për t’u ndërmarrë	Operatori është duke i zhvilluar punimet sipas projektit, gjegjësisht kontratës, konform planit të paraparë dinamik						
Vlerësimi i progresit në projekt	Punimet janë duke u zhvilluar sipas planit të paraparë dinamik						




PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 04	
Projekti :	<i>Ndërtimi i parqeve rekreativo-sportive - renovimi i kompleksi "Qafa"</i>					Vlera e projektit: 883,783.42 €		
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik : 210 ditë		
Operatori:	"Rexha" SHPK					Nr. 616 19110 511 dt. 17.09.2019		
Menaxheri i projektit :	Irfete Zejneli					Projekti i vitit 2019		
Organi mbikëqyrës :	Bujar Rama, Bashkim Statovci, Behxhet Gashi, Burbuqe Agushi, Ylber Jashari dhe Syzana Pllana.							
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> ● Punimi i ferbetonit në zonën 1; ● Punimi i estrihut në zonën 1 dhe zonën 3; ● Punimi i tamponit në zonën 3. 						
	Punët në realizim	Punimi i mureve në zonat 1 dhe 3.						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)	
		50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	00,000.00€	00,000.00€	
Vonesat Shkalla e cilësisë	☞ Vonesa do të ketë për shkak të problemeve me banorët.							
Rekomandime masat për tu ndërmarrë	Është njoftuar operatori ekonomik që punimet të zhvillohen sipas kontratës.							
Vlerësimi i progresit në projekt	☞ Shpresojmë të zgjidhen problemet me banorët për zonat 2 dhe 4 .							



PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 05	
Projekti :	Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik në fshatin Mramor – Busi – Suteskë					Vlera e projektit: 112 340, 00 €		
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik : 60 ditë		
Operatori :	NPN “LINDI“					Nr. 616-19-1118-5-1-1		
Menaxheri i projektit :	Syzana Pllana					Projekti i vitit 2019		
Organi mbikëqyrës :	Aferdita Sopi, Avdirrahman Zuka							
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Kontrata e përfunduar.						
	Punët në realizim	Nuk ka.						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III) përfundim	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)	
		28,149.60€	50,000.00€	33,325.40€	0.0€	0.0€	0.0€	
		Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	Situacioni (XII)	
Vonesat Shkalla e cilësisë	--			Mesatar				
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë								
Vlerësimi i progresit në projekt	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Kontrata nuk ka arritur të realizohet sipas projektit, i cili është bërë para se Ministria e Infrastrukturës të bëjë ndërtimin e urës në fshatin Mramor, andaj menaxheri paraparak ka definuar trasenë e re, e cila është në përfundim. ☞ Problemet pronësore e kanë ngadalësuar shumë ecurinë e punimeve. Në bashkëpunim me kryetarine e Bashkësisë lokale në Mramor, kemi zgjidhur të gjitha mosmarrëveshjet. Jemi në pritje të vazhdimet të kontratës dhe përfundimit të sajë sa më parë. ☞ Punimet kanë përfunduar. 							

*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve



 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 06					
Projekti :	Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në rrugën “Llapi”	Vlera e projektit: 194 438, 90 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë					
Operatori :	SHPK “NOTI – BETON“	Nr. 616-19-115-521					
Menaxheri i projektit :	Syzana Pllana	Projekti i vitit 2019					
Organi mbikëqyrës :	Aferdita Sopi, Ramadan Nebihi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Është bërë ndërtimi i rrjetit të kanalizimit fekal dhe atmosferik, punimet janë ndërprerë përkohësisht, deri në realizimi e rrjetit të instalimeve elektrike nga KEDS, si dhe ndërtimit të rrjetit të ujësjellësit nga KRU “Prishtina”, në bashkëpunim me Komunën e Prishtinës.					
	Punët në realizim	Nuk ka.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50,000.00€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
		Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	Situacioni (XII)
Vonesat Shkalla e cilësisë		--			Mesatar		
Rekomandime, masat për t’u ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt	<p>☞ Nuk është bërë realizimi i kontratës për shkak të mos koordinimit ndërinstitutional, andaj jemi në pritje.</p> <p>KEDS ka bërë shtrirjen e rrjetit në rrugën “Llapi”, tani jemi duke realizuar rrjetin e ujësjellësit, me kontratë të re.</p> <p>Pas përfundimit të ujësjellësit do të vazhdojmë kontratën.</p>						

*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve



PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 07
Projekti :	"Ndërtimi i kanalizimit fekal, atmosferik, ujësjellësit, si dhe rikonstruktimi i rrugës dhe trotuareve në lagjen "Sofalia" për rrugët "Shpëtim Robaj" dhe "Sabit Mushica"					Vlera e projektit: 933,447.35€	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik : 120 ditë	
Operatori :	OE "Gashi Ing" SHPK, Suharekë					Nr. 616-18-415 511 / 616 18 12-511.	
Menaxheri i projektit :	Syzana Pllana					Projekti i vitit 2019	
Organi mbikëqyrës :	Aferdita Sopi, Behxhet Gashi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Është bërë ndërtimi i rrjetit të kanalizimit fekal dhe atmosferik, ujësjellësit dhe riasfaltimi i rrugës "Shpëtim Robaj", mirëpo për shkak të problemeve pronësore nuk ka arritur të realizohet kontrata në rrugën "Sabit Mushica", e cila pas zotimeve nga zyra e kryetarit për zgjidhje të problemeve, kemi vazhduar me realizimin e projektit në rrugën "Sabit Mushica".					
	Punët në realizim	Shtrirja e rrjetit të kanalizimit fekal dhe atmosferik në rrugën " <i>Sabit Mushica</i> ".					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I-IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	Situacioni (XII)	Situacioni (XIII)	Situacioni (XIV)
		605,814.39€	50,000.00€	0	0	0	0
Vonesat Shkalla e cilësisë		Kemi vonesa në realizim të kontratës për shkak të problemeve pronësore.			Mesatar		
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë		Drejtoria e Pronës të bëjë zgjidhje me pronarin e parcelës nëpër të cilën kalon rruga "Sabit Mushica".					
Vlerësimi i progresit në projekt		Punimet janë duke vazhduar në rrugën "Sabit Mushica", përkundër asaj që nuk është arritur marrveshje me pronarin e parcelës që e atakon projektin.					


*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve



PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 08
Projekti :	Ndërtimi i rrjetit të furnizimit me ujë dhe kyqjeve shtëpiake në rrugën "Llapi"					Vlera e projektit: 47,060.35€	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik : 45 ditë kalendarike	
Operatori :	OE "CO-ING" NNSH, Prishtinë					Nr.616-20-5039 521 dt. 08.10.2020	
Menaxheri i projektit :	Syzana Pllana					Projekti i vitit 2020	
Organi mbikëqyrës :	Aferdita Sopi, Ramadan Nebihi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Është bërë shtrirja e gypit $\Phi 225$ dhe $\Phi 110$ mm një pjesë e kyqjeve shtëpiake.					
	Punët në realizim	Depërtimi i kolektorit më gyp çeliku, si dhe ndërtimi i pusetave, kyqjet shtëpiake.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I-IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	Situacioni (XII)	Situacioni (XIII)	
		0€	0€	0	0	0	
Vonesat Shkalla e cilësisë		Nuk kemi vonesa			Mesatar		
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt		Punët janë duke u zhvilluar sipas kontratës, me përjashtim të disa punëve të parapara kryesisht nëntokësore.					

*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve



 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 09				
Projekti :	Hapja e rrugëve të reja në Prishtinë	Vlera e projektit 241,064.80				
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik :365 ditë				
Operatori :	“Ekskavatori” SHPK & DT “Mining” SHPK	Nr. 616 20 081 521 Dt. 07.09.2020				
Menaxheri i projektit :	Dukagjin Buçaj	Projekti i vitit 2020				
Organi mbikëqyrës :	Afërdita Sopi, Ramadan Nebihi					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara						
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> • Është bërë mbushja e trupit të rrugës me zhavorr fraksion 0-60mm, ngjeshja në shtresa; Në rrugën te lapidari i deshmorit Basri Canolli – Shpendi (Lagjja e Canollëve, Marec), Në rrugën “Batalioni I , Brigada 153 e UÇK-së (Lagjja e Gubetinëve, Rimanishtë-Sharban) janë realizuar këto aktivitete: <ul style="list-style-type: none"> - është bërë gërmimi i gjerë, prerja e drurëve, si dhe pastrimi i trasesë, - është bërë gërmimi i trupit të rruges, - është bërë hapja e kanalit, anësor atmosferik, - është bërë mbushja me material guror vendor nga huazuesi dhe ngjeshja në shtresa, - është bërë mbushja e pjesërishme e trupit të rrugës me zhavorr fraksion 0-60mm, ngjeshja në shtresa. 				
	Punët në realizim	Është bërë identifikimi i rrugëve të tjera, sipas kërkesave të qytetarëve, në Sharban dhe së shpejti pritet hapja e rrugëve.				
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)
		39,945.00 €				
Vonesat Shkalla e cilësisë	Nuk ka vonesa. Cilësia është e kënaqshme					
Rekomandime masat për tu ndërmarë	☞ Duhet të përfillen në tërësi vërejtjet e ekipit menaxhues për kryerjen e punimeve.					
Vlerësimi i progresit në projekt	Progresi i punëve ka qenë i kënaqshëm.					

*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve



PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 10
Projekti :	Implementimi i planit të mobilitetit - sanimi, rekonstruktimi i rrugëve - Loti II					Vlera e projektit 500,000.00	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik :120 ditë kalendarike	
Operatori :	"Papenburg" & "Adrianicompany"					Nr. 616 19 026 511 dt. 28.10.2019.	
Menaxheri i projektit :	Dukagjin Buçaj					Projekti i vitit 2019	
Organi mbikëqyrës	Liridon Kabashi, Sevdije Drenovci, Behxhet Gashi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Rruga te Tregu me shumicë (te hyrja e EULEX-it dhe Tregut me shumicë); Sanimi i shiritit të rrugës kryesore "Bill Klinton"; Rruga "Xhevë Lladrovci"; Shtegu i këmbësorëve në lagjen "Dardania"; Rruga mbrapa Tregut me shumice - sanimi me zhavorr; Asfaltimi i rrugës te banesat e Tregtisë, afër rrugës "Tirana"; Sanimi i kanalit në rrugën "Qëndresa" – Mat; Asfaltimi i parkingut te Qendra e Mjekësisë Familjare në lagjen "Bregu i Diellit"; Asfaltimi i parkingut te Qendra e Mjekësisë Familjare në lagjen "Dardania"; Asfaltimi i parkingut te Qendra e Mjekësisë Familjare në lagjen "Qendra"; Asfaltimi i parkingut tek Objekti i Emergjencës në Ulpianë; Asfaltimi i rrugëve "Shaip Kamberi", "1 Tetori" dhe "Demir Viti"; Asfaltimi i rrugës "Naim Frashëri" (Lagjia e Muhaxhirëve); Asfaltimi i rrethit në lagjen "Ulpiana"; Asfaltimi i rrugës "Rrustem Statovci" (te Varrezat e Dëshmorëve); Sanimi me zhavorr i rrugës lidhëse me rrugën "Tomorri" në Prishtinë; Sinjalizimi horizontal te parkingut i objektit të Emergjencës në lagjen "Ulpiana"; Asfaltimi i rrugës te hyrja kryesore e QKUK-së, rruga "Arbnor e Astrit Dehari" në Prishtinë; Asfaltimi i rrethrotullimit tek hyrja sekondare e QKUK- së nga Vetemiku, Prishtinë; Asfaltimi i parkingut te shkolla "Xhemajl Mustafa" në Prishtinë; Asfaltimi te rruga "28 Nëntori" ("Dardania"); Asfaltimi i rrugës "Mehmet Bushi", lagjia "Bregu i Diellit"; Asfaltimi i krahut të rrugës "Braina" në Bardhosh – Prishtinë; Asfaltimi i udhëkryqit te varrezat, afër ambasadave në lagjen "Arbëria"; Asfaltimi i segmentit të rrugës "Vushtrria", Prishtinë; Asfaltimi i një pjese të rrugës "Lidhja e Lezhës", në Prishtinë; Asfaltimi i rrugës lidhëse te rruga "Gazmend Zajmi", në Prishtinë; Asfaltimi i rrugës "Istref Begolli" dhe parkingjeve në lagje, në Prishtinë; Asfaltimi i rrugicës lidhëse me rrugën "Zejnel Salihu", në Prishtinë; Asfaltimi i parkingut te rruga "Anton Arapi", në Prishtinë; Sanimi i asfaltit në rrugën "Millan Shulaj" në Prishtinë.					
	Punët në realizim	Kanë përfundua të gjitha punimet në këto vende.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	
		111,264.92€	41,067.26€	121,095.05€	83,612.83€	142,959.94€	
Vonesat Shkalla e cilësisë	Nuk ka vonesa. Cilësia është e kënaqshme.						
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë	Të gjitha punimet kanë përfunduar.						
Vlerësimi i progresit në projekt	Progresi i punëve ka qenë i kënaqshëm.						


*Foto pas ekzekutimit të punimeve



RRUGA "XHEVË LLADROVCI"



**RRUGA MBRAPA TREGUT ME SHUMICË-
Sanimi me zhavor**

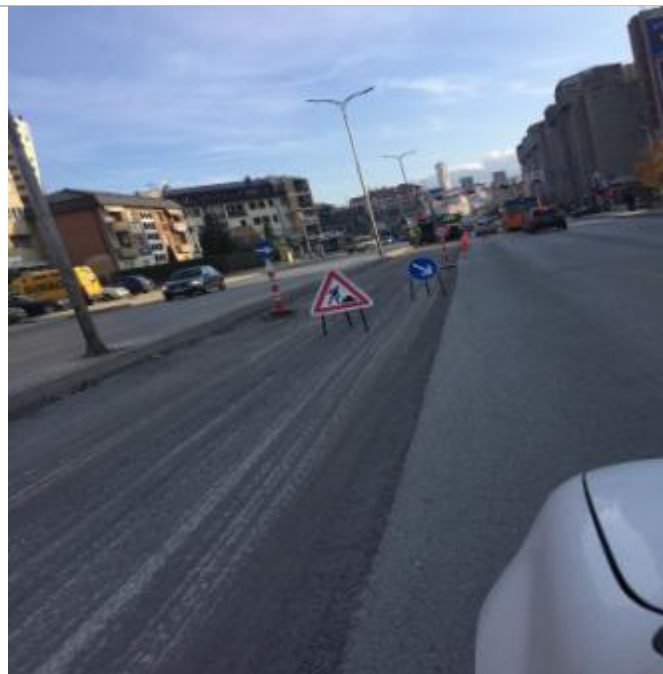

**SANIMI I SHIRITIT TË RRUGËS KRYESORE "BILL
KLINTON"**



SHTEGU I KËMBËSORËVE NË LAGJEN "DARDANIA"



ASFALTIMI I RRUGES TE BANESAT E TREGTISE AFER RRUGES TIRANA



SANIMI I KANALIT NE RRUGËN QËNDRESA – MAT



RRUGA TE TREGU ME SHUMICË (TE HYRJA E EULEX-IT DHE TREGUT ME SHUMICË)



RRUGA TE TREGU ME SHUMICË (TE HYRJA E EULEX-IT DHE TREGUT ME SHUMICE)



Asfaltimi i parkingut te Qendra e Mjekësisë Familjare në lagjen “Dardania”




Asfaltimi i parkingut tek objekti i Emergjencës në lagjen “Ulpiana”



Asfaltimi i parkingut te Qendra e Mjekësisë Familjare, në lagjen “Bregu i Diellit”



Asfaltimi i Parkingut tek Qendra e Mjekësisë Familjare në lagjen “Bregu i Diellit”

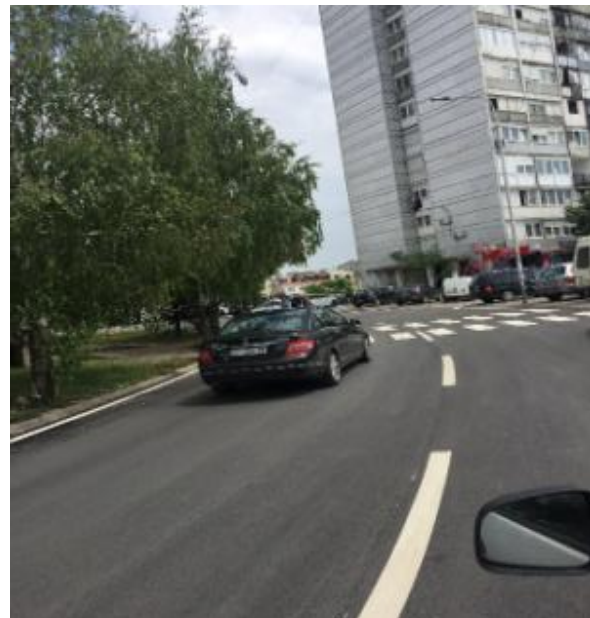

Rrethrotullimi te fontana në lagjen "Ulpiana"



Rruga "Shaip Kamberi", lagjja "Velania", sanim me zhavorr, krah i rrugës "Tomorri"



Rrethrotullimi te hyrja sekondare e QKUK-së, Veternik




Parkingu te rruga "Fatos Arapi"




Rrugicat dhe parkingjet te rr. "Istrf Begolli"



Pjesë e rrugës "Lidhja e Lezhes", udhëkryqi te ambasadat - Varrezat në lagjen "Arbëria"

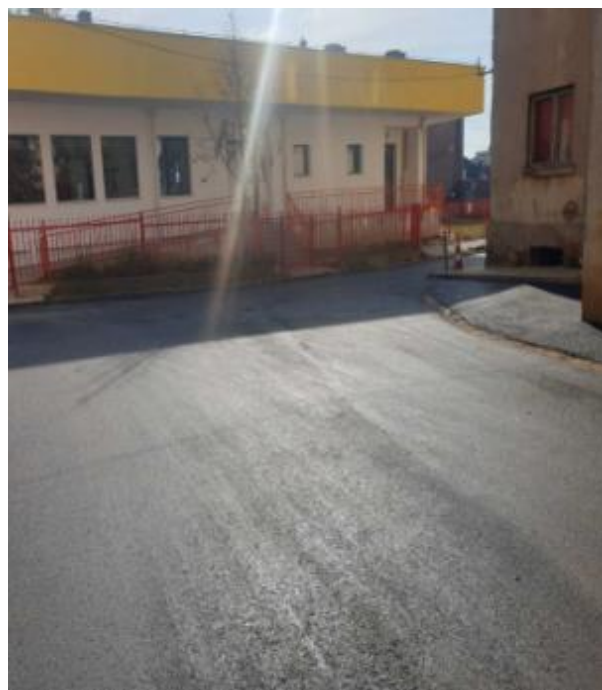

Parkingu te blloku i banesave, rr. "Istref Begolli"

 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 11				
Projekti :	Ndërtimi i rrugës paralel me rrugën "B"	Vlera e projektit 298,327.13				
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik :150 ditë kalendarike				
Operatori :	"Beni-Com" SHPK & "All Stone" SHPK	Nr. 616 19 211 521 Dt. 08.05.2020.				
Menaxheri i projektit :	Dukagjin Buçaj	Projekti i vitit 2020				
Organi mbikëqyrës	Syzana Pllana, Afërdita Sopi, Bashkim Statovci, Ramadan Nebihi					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara						
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Është bërë shënimi gjeodezik i trasesë së rrugës; Është bërë gërmimi i gjerë, pastrimi dhe demolimi i rrethojave ekzistuese; Është bërë gërmimi në trupin e rrugës; Është bërë hapja e kanalit, vendosja e gypave të kanalizimit fekal dhe atmosferik; Është bërë punimi i pusetave të kanalizimit fekal dhe atmosferik; Është bërë mbushja e kanaleve me material guror dhe ngjeshja në shtresa; Është bërë mbushja e trupit të rrugës me tampon, si dhe ngjeshja në shtresa; Është bërë hapja e kanalit, vendosja e gypave të kanalizimit kabllor; Është bërë punimi i pusetave të kanalizimit kabllor.				
	Punët në realizim	Është duke u realizuar vendosja e skajoreve, e më pas punimi i trotuareve.				
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)
		50,000.00 €	50,000.00 €			
Vonesat Shkalla e cilësisë	Nuk ka vonesa. Cilësia është e kënaqshme					
Rekomandime masat për tu ndërmarre	☞ Duhet të përfilllet në tërësi plani dinamik për kryerjen e punimeve					
Vlerësimi i progresit në projekt	Progresi i punëve ka qene i kënaqshëm.					

*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve





RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 11					
Projekti :	Ndërtimi i rrugës Keqekollë-Nishevc	Vlera e projektit: 106,196.00€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë					
Operatori :	SHPK "Integral"	Nr.identifikues: 616 200 395 511					
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla	Projekti i vitit 2020					
Organi mbikëqyrës :	Qazim Bajrami, Irfete Zeneli						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e parapara	- Rregullimi dhe asfaltimi i segmentit të fundit të rrugës Keqekollë- Nishevc.					
	Punët në realizim e sipër	-Punimet janë në fazën fillestare të punimeve-pastrimi dhe hapja e trasesë.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni 1	Situacioni 2	Situacioni 3			





	<h1>RAPORTI MBIKËQYRËS</h1>		SHIFRA <h1>12</h1>
Projekti :	Rekonstruktimi i rrugëve dhe parkingjeve në lagjen “Dardania”	Vlera e projektit: 348,738.94€	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik :	

Operatori :		OE "ALKO-IMPEX-General Construction" SHPK, Prishtinë					120 ditë	
Menaxheri i projektit :		Qazim Bajrami nga DIKMK					Nr. 616 -19- 1011-5-1-1, dt. 04.11.2019	
Organi mbikëqyrës :		Suzana Pllana, Behxhet Gashi nga DIKMK						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Janë përfunduar të gjitha parkingjet të parapara sipas kontratës.						
	Punët në realizim	Përgatitja e dokumentacionit për mbylljen e kontratës.						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni I	Situacioni II	Situacioni III	Situacioni IV	Situacioni V	Situacioni VI	
		55,000.00 08/05/2020	50,000.00 16/06/2020	90,000.00 17/08/20	50,000.00 01/10/2020	60,000.00 24/11/20		
Vonesat Shkalla e cilësisë								
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë								
Vlerësimi i progresit në projekt								



Parkingu te rruga "Ilaz Kodra"






Parkingu te rruga "Ilaz Kodra"



Parkingu te ndërmarrja "Termokos"



Parkingu te ndërmarrja "Termokos"

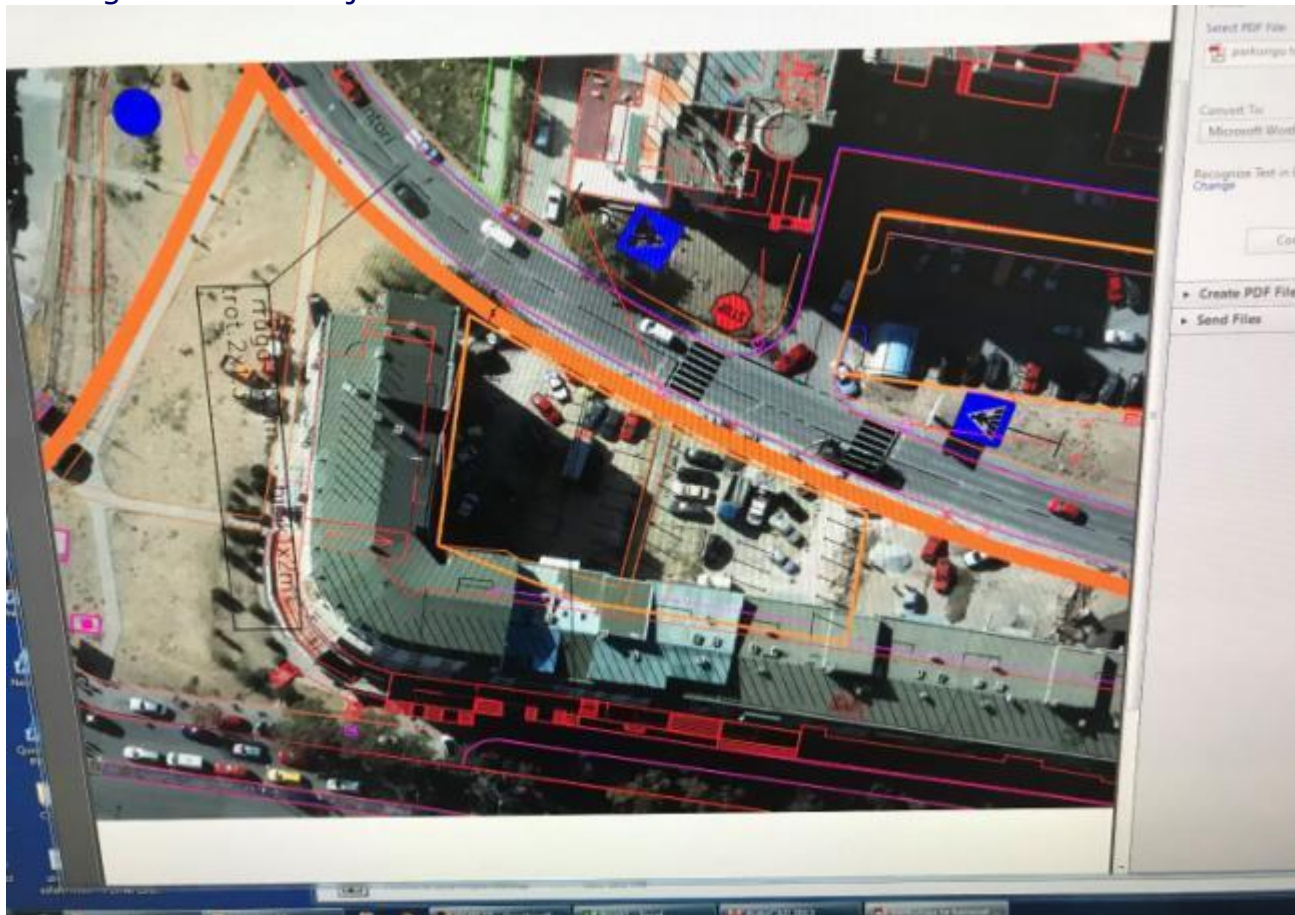




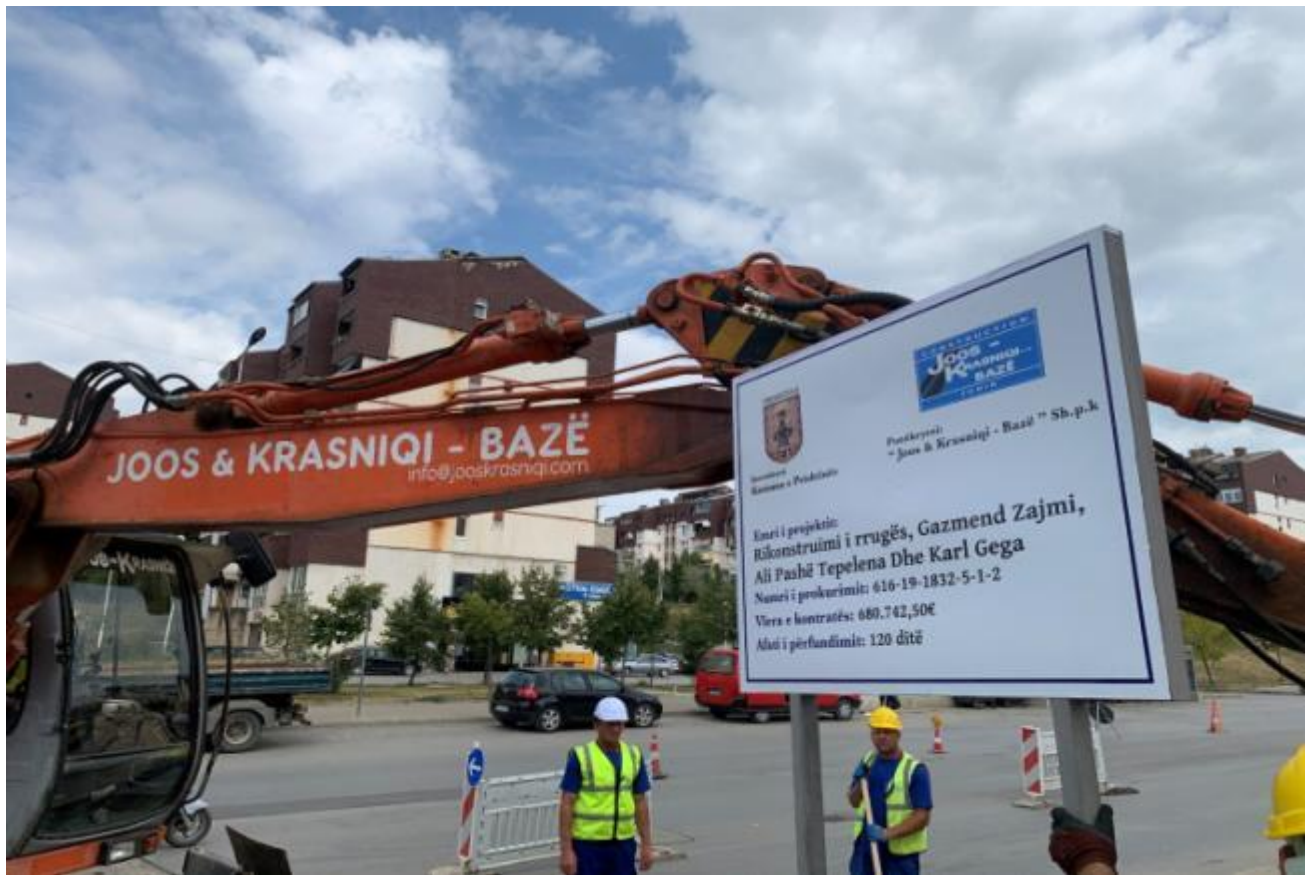
PARKINGU TE NDËRMARRJA "TERMOKOS"







 RAPORTI MBIQYRËS		SHIFRA 13					
Projekti :	Rikonstruimi i rrugëve "Gazmend Zajmi", "Ali Pashë Tepelena" dhe "Karl Gega"	Vlera e projektit: 680.742,50€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 120 ditë					
Operatori :	OE "JOOS&KRASNIQI-BAZE" SHPK, Junik-Deçan	<i>Nr. 616 -19- 1832-5-1-2</i> <i>dt. 02.09.2019</i>					
Menaxheri i projektit :	Qazim Bajrami nga DIKMK	Projekti i vitit : 2019					
Organi mbikëqyrës :	Krenar Xhaferi, Bashkim Statovci, Hazir Krasniqi nga DIKMK						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Kanë përfunduar punimet.					
	Punët në realizim	Përgatitja e dokumentacionit për mbylljen e kontratës.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni I	Situacioni II	Situacioni III	Situacioni IV	Situacioni V	Situacioni VI
		31.10.2019	11.12.2019	07.05.2020	09.07.2020	24.09.2020	Aneks kontrata
		50,000.00	60.000,00	55,000.00	250,000.00	140,000.00	66,585.12
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë	<i>Edhe në këto rrugë kemi probleme, pasi që kompania KEDS ka leje për gropim për vendosjen e kabllove dhe ende nuk i kanë përfunduar punimet, kështu që po shkaktohen vonesa.</i>						
Vlerësimi i progresit në projekt	Nga dt. 01.06.2020, janë rritur kapacitetet në punishte.						









RIASFALTIMI I RRUGËS "XHELADIN HANA"



Asfaltimi i rrugëve "Karl Gega", "Ali Pashë Tepelena" dhe "Gazmend Zajmi"



Komuna e Prishtinës
RAPORTI MUJOR

Drejtoria	Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave
Spektori	Menaxhimi i kontratave për ndërtim të lartë
Periudha raportuese	Nëntor, 2020
Emri dhe mbiemri i raportuesit	Ferit Fazliu, udhëheqës i Sektorit

- **PËRMBLEDHJE**

Ky sektor në bazë të detyrave programore, kryesisht është marrë me përpunimin e lëndëve me problematikë të ndërtimit, hartimin e detyrave projektuese, mbikëqyrjen e projekteve, mbikëqyrjen e objekteve, hapjen dhe vlerësimin e tenderëve, pjesëmarrje në komisionet e caktuara nga kryetari i Komunës dhe drejtori i drejtorisë për lëmin e ndërtimit dhe veprimtari të tjera që kanë të bëjnë me këtë sektor.

- **AKTIVITETET E PLANIFIKUARA PËR VITIN 2020**

Për vitin 2020 janë planifikuar këto aktivitete të Sektorit për menaxhimin e kontratave të ndërtimit të lartë, e që janë dhe pjesë e aktiviteteve të drejtorisë:

- Pjesëmarrje në hapjen dhe vlerësimin e tenderëve;
- Mbikëqyrja e kontratave të ndërtimit të lartë, të projekteve që investon Komuna ose investuesve të tjerë për nevoja të Komunës:
 - Rritja e efikasitetit dhe kualitetit në realizimin e kontratave,
 - Realizimi i planit dinamik dhe ruajtja e buxhetit;
- Përgatitja e raportit mujor dhe vjetor;
- Këshillimi i drejtorit dhe sektorëve të tjerë për çështjet e ndërtimit, si dhe
- Aktivitete të paplanifikuara, me kërkesë të organeve të Komunës.

- **AKTIVITETET E REALIZUARA**

Gjatë këtij muaji janë realizuar këto aktivitete:

Vlerësime të kontratave: 3 kontrata.

Gjithsej vlera e kontratave që janë në menaxhim të këtij sektori është:

	7,870,827.04 €
të paguara deri më tani janë	1,967,657.24 €
dallimi	5,903,169.80 €

Nga kjo vlerë e mbetur, janë 2,904,113.50 € kontrata të kontraktuara në vitin 2015, e që nuk kanë filluar fare.

Kjo vlerë e kontraktuar përfshin 33 kontrata , të bartura nga viti 2015 dhe nga viti 2019:

- 4 kontrata të pafilluara,
- 2 kontrata të ndërprera,
- 8 kontrata të përfunduara,
- 21 kontrata janë në vazhdim dhe në përfundim të tyre.

KONTRATAT QË VAZHDOJNË NGA VITET PARAPRAKE DHE TË KËTIJ VITI


1. Ndërtimi i stadiumit të futbollit në fshatin Hajvali	
Vlera e projektit:	96,954.14€
Nr. i kontratës dhe data	616 14 176 521 – 19.12.2014
Investuesi	Komuna e Prishtinës
Plani dinamik	45 ditë
Operatori ekonomik	NNP “Zhvillimi”
Të paguara deri më tani	40.000,00€
Menaxheri i kontratës	Hyrishahe Morina
Rekomandime, masat për t’u ndërmarrë	Gjatë këtij muaji nuk është
Vlerësimi i progresit në projekt	Nuk ka pasur aktivitete gjatë këtij muaji
Fotot e ekzekutimit të punimeve	
Për realizimin e pozicionit të mbetur, mbjelljen e barit, nevojitet dheu, të cilin ne nuk e kemi në pozicion, andaj kërkohet nga ana e Drejtorisë së Sporteve që ta sigurojë dheun, në mënyrë që ta përmbyllim kontratën.	

2. Konkurs për punimin e projektit ideor arkitektonik “Tregu i Ulpianës”	
Gatë këtij muaji janë zhvilluar punimet në: Kanë mbetur përmasimet në projektin e statikes	
Vlera e projektit	35000,00
Nr i kontratës dhe data	Nr. 616-19-018-421, dt. 06.08.2019
Investuesi	Komuna e Prishtinës
Plani dinamik	60 ditë
Operatori ekonomik	“Alfa Produkt” dhe Blerim Lutolli
Menaxher i projekti	Ferit Fazliu
Projekti është përfunduar, ka mbetur në procedurat e përmbylljes	
3. Instalimi dhe mirëmbajtja e elektrikës në Institucione arsimore - kontratë kornizë 1-vjeçare	
Në kontratën “ <i>Instalimi dhe mirëmbajtja e elektrikes në Institucione arsimore</i> ” punimet kanë filluar më 28.08.2020, sipas planit të menaxhimit dhe ditarit ndërtimor. Punimet janë zhvilluar sipas kërkesave dhe prioriteteve për intervenim nga Drejtoria e Arsimit dhe nga institucionet e shkollave dhe çerdheve. Gjatë muajit nëntor 2020, me këtë kontratë është intervenuar në këto institucione:	
<ul style="list-style-type: none"> • SHFMU “HilmiRakovica” • SHFMU “Meto Bajraktari” 	

<ul style="list-style-type: none"> Gjimnazi "XhevdetDoda" 	
Nr. i kontratës dhe data:	<i>Nr. i brendshëm 616 20 050 221 dt. 14.07.2020</i>
Vlera e projektit	70.000,00€
Investuesi	Komuna e Prishtinës
Operatori ekonomik	"NITI-N" SHPK, Prishtinë
Menaxher i kontratës	Amire Krasniqi
Të paguara	Situacioni i parë: 18,305.10 €
Fotot e ekzekutimit të punimeve	
"HilmiRakovica"	"Meto Bajraktari"
	
"Hilmi Rakovica"	"Xhevdet Doda"



4. Riorganizimi dhe renovimi i disa hapësirave në objektin e vjetër dhe të ri të Komunës.	
Vlera e projektit	75,048.35 €
Nr. i kontratës dhe data	Nr. 616 016 103 521, dt. 09.10.2019
Investuesi	Komuna e Prishtinës
Plani dinamik	
Operatori ekonomik	“TOSI”
Të paguara deri më tani	
Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara	
Foto gjatë ekzekutimit të punimeve	

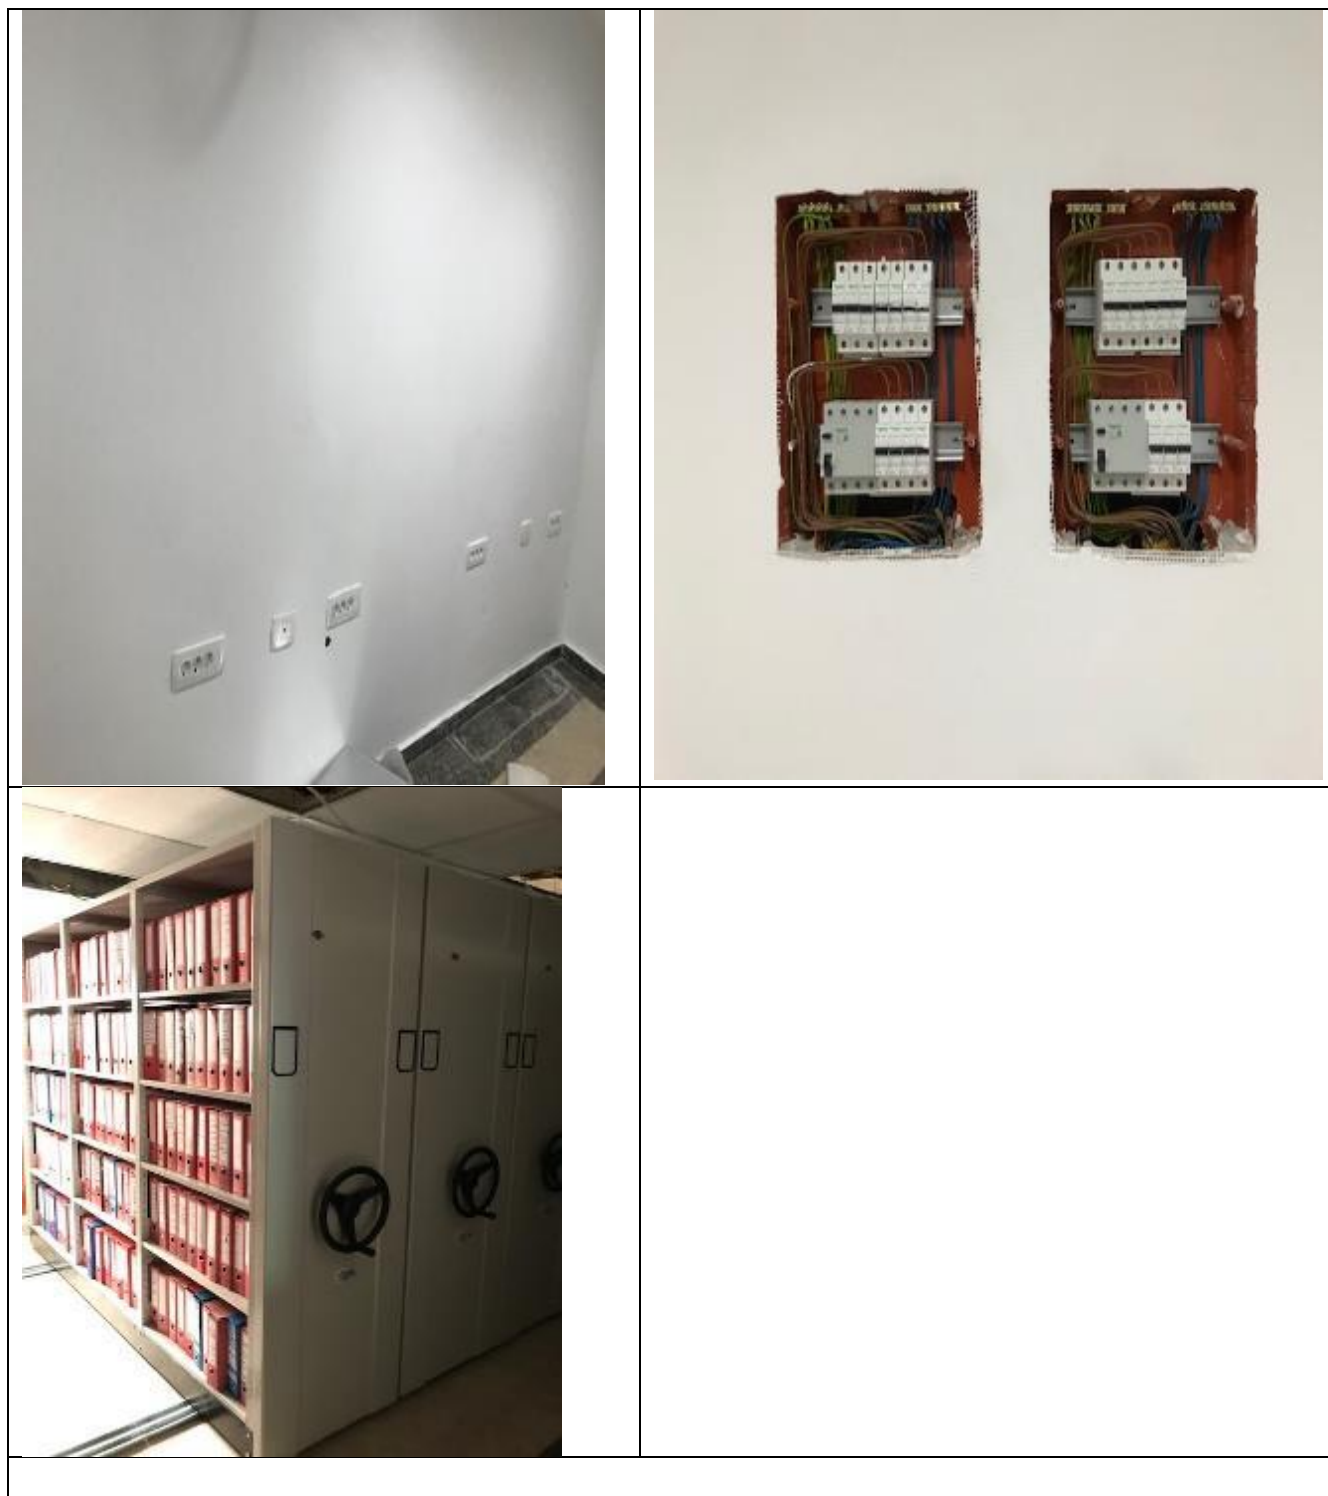

5. Kontrate për hartimin e projekteve	
Vlera e projektit	60950.00€
Nr. i kontratës dhe data	616-19-4217-2-2-1
Investuesi	Komuna e Prishtinës
Plani dinamik	Kornizë njëvjeçare
Operatori ekonomik	OE "PROING" dhe "PARTNERS" SHPK
Menaxheri i projektit	Nazmije Tora, ark.
Të paguara deri më tani	

Kontrata është në përmbyllje

6. Ndërtimi i strehimoreve për qentë endacakë dhe trajtimi i tyre	
Vlera e projektit	60,950.00€
Nr i kontratës dhe data	Nr. 616-19-4217-2-2-1, dt. 02.12.2019
Investuesi	Komuna e Prishtinës
Plani dinamik	Kornizë njëvjeçare
Operatori ekonomik	OE "PROING" dhe "PARTNERS" SHPK
Menaxheri i projektit	Hyrishahe Morina
Të paguara deri më tani	
Kompania ka hequr dorë nga kontrata	

7. Rregullimi i ambientit për ekspozimin e veprave të artit	
Vlera e projektit	49.171,20 €
Nr. i kontratës dhe data	Nr. 616-19-8110-5-2-1, dt. 31.12.2019
Investuesi	Komuna e Prishtinës
Plani dinamik	60 ditë
Operatori ekonomik	"Tribuna" SHPK
Menaxheri i projektit	Ferit Fazliu
Të paguara deri më tani	Është përgatitur situacioni i parë, në vlerë 16,390.85 euro
Nuk është punuar pasi punëtorët e kompanisë kanë qenë me COVID	

8. Renovimi dhe përmisimi i infrastrukturës së objektit të QMU-së	
Vlera e projektit:	206,811.00€
Nr. i kontratës dhe data	Nr. i prokurimit 616 -19-8152-5-2-1

	dt. 10.01.2020, nr. i brendshëm 616 19 183 521
Investuesi	<i>Komuna e Prishtinës</i>
Plani dinamik	<i>60 ditë</i>
Operatori ekonomik	<i>“ENGRUP” SHPK Rr. “Bregu i Diellit” Zona perëndimore - lam12, Prishtina</i>
Menaxher i projektit:	<i>Vjosa Rexhepi</i>
Te paguara deri me tani:	<i>114,997.84€</i>
<i>Kontrata është përmbyllur</i>	

9. Ndërtim i aneksit të çerdhes “Shtëpia Magjike”, Besi	
<i>Vlera e projektit</i>	<i>38 891.00 €</i>
<i>Nr. i kontratës dhe data</i>	<i>616-19-158-511 DT. 19.12.2019</i>
<i>Investuesi</i>	<i>Kuvendi Komunal Prishtinë</i>
<i>Plani dinamik</i>	<i>90 ditë</i>
<i>Operatori ekonomik</i>	<i>Grupi i OE “SelfMade” L.L.C. Prishtinë dhe” Beni Konstruktion “SH.P.K, Viti</i>
<i>Menaxheri i projektit</i>	<i>Bashkim Statovci</i>
<i>Të paguara deri me tani</i>	<i>35,001.90 euro</i>
<i>Kontrata ka përfunduar dhe është në përmbyllje</i>	

10. Renovimi i hapësirës së lokacioni tek Drejtoria e Rrugëve	
<i>Punimet ende nuk kanë filluar</i>	
<i>Vlera e projektit</i>	<i>417,638.84 €</i>
<i>Nr i kontratës dhe data</i>	<i>616 19 170 521</i>
<i>Investuesi</i>	<i>Komuna e Prishtinës</i>
<i>Operatori ekonomik</i>	<i>“Rexha “ SHPK</i>

Menaxher i projektit	Ganimete Nitaj
Të paguara deri më tani	50.000,00
Foto nga terreni	
	
	
	
	



12. Ndërtimi i Qendrës kulturore për të rinjë, Bibliotekës në lagjen "Kodra e Trimave"	
Vlera e projektit:	424,257.61 €
Nr i kontratës dhe data.	Nr. 616-19-208-5-1-1, dt. 14.09.2020
Investuesi	<i>Kuvendi i Komunës së Prishtinës</i>
Plani dinamik	<i>180 ditë</i>
Operatori ekonomik	<i>Grup operatores "ConDes" SHPK, "Euroconstrution" SHPK</i>
Menaxher i projektit	<i>Nazmije Tora, ark.</i>
Foto nga terreni	
Objekti nuk ka filluar	

13. Renovimi i bibliotekës " Hivzi Sylejmani " në lagjen "Dardania" dhe bibliotekës përkujtimore në Taukbahçe	
Vlera e projektit	92,932.42 €
Nr. i kontratës dhe data	Nr. 616-20-1923-5-2-1, dt 25.09.2020
Investuesi	<i>Komuna e Prishtinës</i>
Plani dinamik	<i>90 ditë</i>


Operatori ekonomik Menaxheri i projektit	<i>"Progis" SHPK</i> <i>Ganimete Nitaj</i>
Foto nga tereni	
	
	
	
	
	
	

--	--

14. Rikonstruktimi dhe gëlqerosja e shkollave - LOTI 1	
Vlera e projektit	175,000.00€
Nr i kontratës dhe data	Nr. 616 20 3541 -5-1-1, dt. 08.10.2020
Investues	Komuna e Prishtinës
Operatori ekonomik	NBT "Ing" Suharekë
Menaxher i projektit	Ylber Jashari
Te paguara	23,406.50€
Mbarëvajtja e punimeve	Është duke u punuar në disa lokacione-shkolla
Fotot nga terreni	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  </div> <div style="width: 45%;"> <p>SMU "GanimeteTerbeshi" Llukar</p>  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;">  </div> <div style="width: 45%;">  </div> </div>	



SHFMU "Pavaresia"

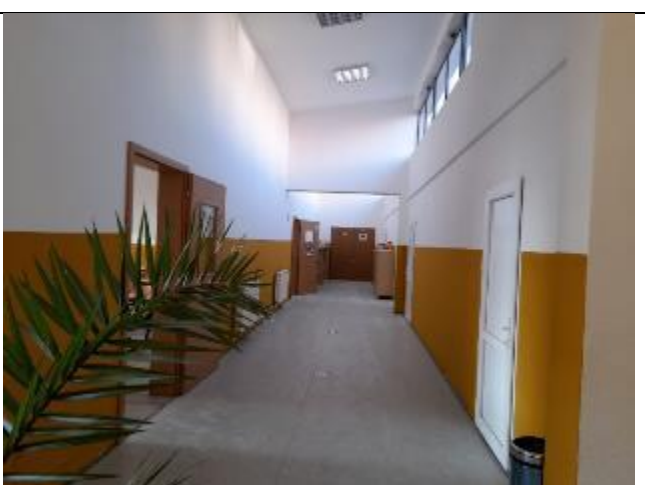

	
	<p>rosja e shkollave, nyjat sanitare LOTI - II</p> <p>e parashikuar sipas kontratës 10,000.00 €</p> <p>Primit 616 20 3541 -5-1-1, dt. 06. 10.2020 ndshëm 616 20 101 511</p> <p>e Prishtinës</p>
<p>Operatori ekonomik</p>	<p><i>"MBB-Constucion" SHPK, NPT B.Ademaj, rr. "Caraleva", nr.11, Prizrenë</i></p>
<p>Menaxheri i kontratës</p>	<p><i>Ylber Jashari</i></p>
<p>Foto nga tereni</p>	
<p>SHFMU "Pavarësia"</p>	
	







SHFMU "Hilmi Rakovica"







SHFMU" Shkendia " Hajvali





16. Rikonstruimi dhe gëlqerosja e shkollave, rregullimi i kulmeve, LOTI - III

Vlera e projektit	<i>Vlera e parashikuar sipas kontratës është 75,000.00 €</i>
Nr. i kontratës dhe data	Nr. i prokurimit 616 20 3541 -5-1-1, dt. 07. 10.2020 Nr. i brendshëm 616 20 101 511
Investuesi	<i>Komuna e Prishtinës</i>
Plani dinamik	<i>Kontrata përfundon në periudhë 12 muajshe</i>
Operatori ekonomik	<i>"ENGRUP" SHPK, rr. "Bregu i Diellit", Zona perendimore", Lam12, Prishtina</i>
Menaxheri i kontratës	<i>Ylber Jashari</i>
Fotot nga terreni	
	
	




17. Rikonstruimi dhe gëlqerosja e shkollave, rregullimi i dysHEMEVE, LOTI - IV

Vlera e projektit	100,000.00 €
N.r i kontratës dhe data	Nr. i prokurimit 616 20 3541 -5-1-1, dt. 08. 10.2020 Nr. i brendshëm 616 20 101 511
Investuesi	<i>Komuna e Prishtinës</i>
Plani dinamik	<i>12 muaj</i>
Operatori ekonomik	<i>"Grand Bau" SHPK, Hajvali, Prishtinë</i>
Menaxheri i projektit	<i>Ylber Jashari</i>

Foto nga tereni



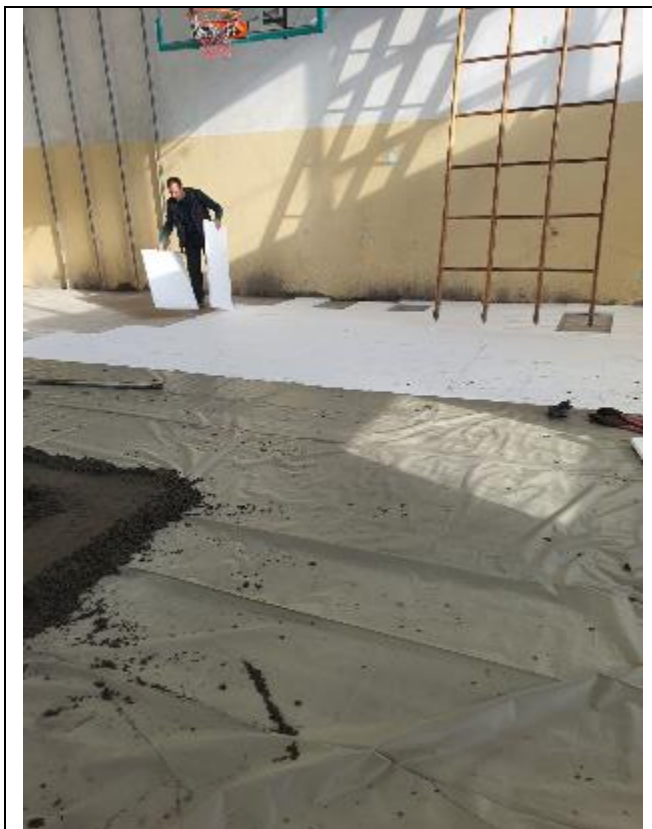



18. Rregullimi i oborreve dhe rrethojave të terreneve sportive	
Vlera e projektit	380,000.00 €
Nr i kontratës dhe data	Nr. 616 2 0 1 21 5 2 1, dt. 29.10.2020
Investuesi	<i>Komuna e Prishtinës</i>
Plani dinamik	<i>12 muaj</i>
Operatori ekonomik	NBT "Ing", Suhareke
Menaxheri i projektit	<i>Ylber Jashari</i>
Kontrata ende nuk ka filluar	

19. Renovimet në objektin e e vjetër dhe të ri të Komunës.	
Vlera e projektit	130,743.22 €
Nr. i kontratës dhe data	<i>Nr. 616-20-4451-5-2-1, dt. 28.10.2019</i>
Investuesi	<i>Komuna e Prishtinës</i>
Plani dinamik	<i>12 muaj</i>
Operatori ekonomik	"BRT" SHPK Prishtinë
Menaxheri i projektit	

Nuk kemi raport nga menaxheri

20. Renovimi dhe permisimi i infrastrukturës së institucioneve të KPSH

Vlera e projektit	450,000.00 €
Nr. i kontratës dhe data	Nr. 616-20-3353-5-2-1, dt. 19.10.2020
Investuesi	<i>Komuna e Prishtinës</i>
Plani dinamik	<i>36 muaj</i>
Operatori ekonomik	"Constructmax" SHPK
Menaxheri i projektit	<i>Albina Berisha</i>

Foto nga terreni





PROJEKTET E KONTRAKTUA DHE TË PAFILLUARA

21. Ndertimi i shkollës fillore në lagjen “Mati 1”, vlera e projektit është 1,458,452.95€, nr. id. 61615061511, dt. 23.07.2015, punimet nuk kanë filluar, është në procedurë gjyqësore për çështje pronësore.
22. Ndërtimi i sallës së edukatës fizike të shkollës “Shtjefën Gjeqovi”, vlera e projektit është : 238,564.24€, nr. Id 616 15 156 521, dt. . 22.10.2015. Punimet janë ndërprerë për shkak të pronës.
23. Ndërtimi i shkollës në lagjen “Kalabria”, vlera e projektit është 1,458,452.95 €, nr. id. 61615135511, dt. 30.10.2015. Punimet nuk ka filluar për shkak te problemeve pronësore.

✓ KERKESAT E SEKTORIT

Kërkesa shumë të nevojshme:

- Sigurimi i pajisjeve për sigurinë e stafit në punishte (helmata, këpucë, syze etj., shumë të domosdoshme);

- Mungojnë inxhinieri i elektros, imakinerisë dhe i ndërtimtarisë - drejtimi hidro;
- Trajnime të stafit për vlerësimin dhe menaxhimin e projekteve-kontratave;
- Pjesëmarrje në panairët e ndërtimit, me qëllim të njoftimit me materialet e reja të ndërtimit.

Drejtori:
Gëzim Mehmeti

Prishtinë, nëntor 2020
