



## **Raporti i vitit 2021**

**Shtator 01- 30.09.2021**

### **1. Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave**

Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave gjatë muajit Shtator ka kryer këto aktivitete: Kërkesat për hartimin e detyrave projektuese dhe identifikimin e nevojave, shqyrtimin e kërkesave të banorëve të bashkësive lokale dhe inkorporimi i tyre në planet e komunës, njoftimi me kohë i kompanive publike dhe subjekteve relevante me qëllim të koordinimit të punëve, inçizimi i gjendjes ekzistuese të infrastrukturës në qytetin e Prishtinës, si dhe kompletimi i dokumentacionit teknik për procedimin e tyre në organet kompetente, mbikëqyrja e realizimit të projekteve konform marrëveshjes etj

#### **1.1. Shqyrtimi i kërkesave**

Gjatë muajit shtator, Drejtoria ka proceduar 144 kërkesa të ndryshme të bashkësive lokale dhe banorëve: për ndërtimin e rrugëve, trotuareve dhe kanalizimeve, kërkesa për rregullimin e rrugëve dhe kanalizimeve, kërkesa nga kompanitë publike-leje për gropim dhe intervenime për sanimin e defekteve të ndryshme, kërkesa nga kompanitë për formime të komisioneve për kontrollimin e punëve, kërkesa të natyrave të ndryshme rreth definimit të zgjidhjes në teren etj. Nga numri i përgjithshëm prej 144 kërkesave të pranuar, 101 kërkesa janë të përfunduara.

#### **1.2. Dërgimi i kërkesave për hartimin e detyrave projektuese dhe identifikimin e nevojave**

Duke marrë për bazë Ligjin mbi planifikimin hapësinorë, Ligjin mbi ndërtimin e objekteve investive, si dhe Ligjin për projektim, e në veçanti planet rregullative, janë dërguar kërkesat për hartimin e detyrave projektuese në zonat urbane dhe rurale.



### 1.3. Raportimi i Menaxherëve të projekteve infrastrukturore

Drejtoria	Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave
Sektori	Menaxhimi i kontratave ( Ndërtimi i ulët )
Drejtori	Gëzim Mehmeti
Raportoi	Dukagjin Buqaj, idn. – UD i shefit të Sektorit
Kontrolloi – Përpunoi	Muhamed Emra, idn. - zyrtarë i lartë për ndërtim urban
Periudha raportuese	01-30.09.2021, muaji shtator, 2021
Menaxhëret e projekteve	Muhamed Emra Irfete Zejneli Syzana Pllana Qazim Bajrami Dugagjin Buqaj Ibrahim Gervalla Zyhrije Pllana Halil Fejziu
Organi mbikqyrës	Azem Buzuku Aferdita Sopi Behxhet Gashi Ramadan Nebiu Hazir Krasniqi Amire Krasniqi Bujar Rama

PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 01
Projekti :	Ndërtimi i Qendrës kulturore për të rinjë, Bibliotekës në lagjen “Kodra e Trimave”	Vlera e projektit: 424,257.61 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik 150 ditë kalendarik					
Operatori :	Grup operatores ”ConDes” SHPK “Euroconstrution” SHPK	616-19-208-5-1-1 Dt. 14.09.2020					
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra, idn.	Projekti i vitit: 2020					
Organi mbikëqyrës :	Arbër Sadiku, idh, ; Besian Sinani idn ; Halil Demolli, idm. ; Nazmi Bajrami ide, ; Armend Avdiu idh hidro, ; Avdirrahman Zuka, idm., Hazir Krasniqi, tek.gjeodet						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Pastrimi i terrenit;</li> <li>- Rrethekimi i punishtes, sigurimi i punishtes;</li> <li>- Vendosja e tabelës informuese;</li> <li>- Incizimi, piketimi digjital i objektit;</li> <li>-Gërmimi i terrenit deri në nivelin e themelit të pllakës;</li> <li>- Mbushja e gropës ndërtimore me material guror;</li> <li>- Shtresimi i pllakës rrafshuese estrih çimento t=5.0cm;</li> <li>- Furnizimi i shtresës izoluese hidroizolimi;</li> <li>- Shtresimi i pllakës rrafshuese estrih çimento t=5.0cm;</li> <li>- Armirimi i pllakës betonarme t=60.0 cm ( Zona e poshtme);</li> <li>- Armirimi i pllakes betonarme t=60.0 cm ( Zona e sipërme);</li> <li>- Betonimi i kontrapllakes t=60.0cm.</li> </ul>					
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kallëpimi i mureve betonarme;</li> <li>- Kallëpimi i shtyllave betonarme.</li> </ul>					
Vëllimi financiar	Situacionet ( Pagesat e proceduara)	Situacioni ( I )	Situacioni ( II )	Situacioni ( III )	Situacioni ( IV )	Situacioni ( V )	Situacioni ( VI )
		50.000.0€					
Vonesat Shkalla e cilësisë		--			Mesatar		
Rekomandime masat për tu ndërmarë		Ju njoftojm se projekti kryesor nuk përmban sigurimin e gropës ndërtimore, në bazë të projektit distanca në mes të vijës ndërtimore me objektet individuale ekzistuese për rreth janë shumë afër, duke e pasur parasysh që nuk është bërë sigurimi i gropës ndërtimore nga byroja projektuese, për shkak të sigurisë së objekteve, jemi detyruar që të zhvendoset objekti në mënyrë që të mos rrezikohen objektet përreth.					
Vlerësimi i progresit në projekt		Punimet janë duke u zhvilluar sipas planit dinamik të paraparë, mirepo kemi ngecje në fazën e gërmimit të objektit për shkak të dislokimit të bërë, në mënyrë që të mos rrezikohen objektet individuale ekzistuese përreth.					





PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 03
Projekti :	Ndërtimi i rrugës “Azem Bejta” dhe “Shkodra”					Vlera e projektit: 42,224.40 €	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik 60 ditë kalendarik	
Operatori :	SHPK ”Seticommerc“ SHPK “Burimi”					616 20 040 511 Dt. 12.04.2021	
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra, idn;					Projekti i vitit: 2021	
Organi mbikëqyrës :	Sevdije Drenovci, idk; Hazir Krasniqi, teknik i gjeodezisë						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incizimi, piketimi digjital i objektit;</li> <li>- Vendosja e shenjave te perkohshme vertikale;</li> <li>- Gërmimi i gjërë i trupit të rrugës;</li> <li>- Furnizmi dhe shtrirja e tamponit 0-63mm;</li> <li>- Furnizmi dhe shtrirja e tamponit 0-31mm;</li> <li>- Vendosja e skajoreve të betonit 20/24cm;</li> <li>- Vendosja e pllakve të betonit.</li> </ul>					
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vendosja e skajoreve të betonit 20/24cm, rruga “Aqif Blyta”;</li> <li>- Vendosja e pllakve të betonit, rruga “Aqif Blyta”;</li> <li>- Gërmimi i gjërë i trupit të rrugës “Azem Bejta” ( demontimi i kubezave);</li> <li>- Furnizmi dhe shtrirja e tamponit 0-063-31mm;</li> <li>- Vendosja e skajoreve të betonit 20/24cm;</li> <li>- Furnizimi dhe asfaltimi i trupit të rrugës.</li> </ul>					
Vëllimi financiar	Situacionet ( Pagesat e proceduara)	Situacioni ( I )	Situacioni ( II )	Situacioni ( III )	Situacioni ( IV )	Situacioni ( V )	Situacioni ( VI )
		20.000.0€					
Vonesat Shkalla e cilësisë		--			Mesatar		
Rekomandime masat për tu ndërmarë		<p>Vlen të theksohet te rruga “Azem Bejta”, me rastin e fillimit të ekzekutimit të punimeve, respektivisht pas demontimit të kubezeve të betonit, janë paraqitur kabllo e energjisë elektrike në nivel të cekët të trupit të rrugës rishtazi të montuar nga korporata e KEDS në kuadër të projektit të kogjenerimit të rrjetit. Përmes shkresës zyrtare kemi kërkuar që kabllo të nëntokësore të niveleit të bëhet fondimi, si dhe sigurimi i kabllove nëntokësore, min H=0.50m, ku duke e pasur parasysh nivelin e cekët të fundimit, është e nevojshme dhe e dosomdoshme që kabllo të instaluar rishtazi të mbrohen me një shtresë të betonit, në mënyrë që gjatë shtresimit të rrugës me asfalt mos të kemi dëmtime të instalimeve nëntokësore.</p>					
Vlerësimi i progresit në projekt		<p>Punimet janë duke u zhvilluar sipas planit dinamik kalendarik, mirepo kemi ngecje për shkak instalimve nëntokësore, respektivisht kabllo e rrjetit elektrik të ekzekutuar nga kompania e KEDS-it, ku presim intervenimin e fundit, në mënyrë që ne të mund të vazhdojmë punimet sipas paramases, gjegjesisht kontrates.</p>					











**NSH Test & Ing**  
konstruktivni projektovanje i izvođenje radova  
laboratorij za ispitivanje i kontrolu kvaliteta  
 No. Lic. 1656

**Evidentirani i pikave matrise**

Projekat: \_\_\_\_\_ Skupština: \_\_\_\_\_  
 Investitor: \_\_\_\_\_ Kona: \_\_\_\_\_  
 Puntikovi: \_\_\_\_\_ Data e ekzekucije: 15.03.2011  
 Aparat nr.: 2

FO 7.3b				FO 7.3c			
Nr.	Tip matrise	Širina matrise (mm)	Debljina matrise (mm)	Nr.	Tip matrise	Širina matrise (mm)	Debljina matrise (mm)
1	M	01020	75,5	1			
2	A	01032	75,5	2			
3	D	01035	146,1	3			
4	M	01023	87,2	4			
5	A	01144	88,6	5			
6	D	01205	104,2	6			
7	M	01246	89,3	7			
8				8			
9				9			
10				10			
11				11			
12				12			
13				13			
14				14			
15				15			
16				16			

L=300

Participirao i investitor: \_\_\_\_\_  
 Organ nadzornik: \_\_\_\_\_  
 Participirao i punktikovi: \_\_\_\_\_  
 Participirao i laboratorij: \_\_\_\_\_













		<h1 style="text-align: center;">RAPORTI MBIKËQYRËS</h1>				<b>SHIFRA</b> <h1 style="text-align: center;">04</h1>	
<b>Projekti :</b>	Punimi i shpimeve dhe elaboratit gjeomekanik				Vlera e projektit: 55,000.00 €		
<b>Investuesi :</b>	Komuna e Prishtinës				Plani dinamik : 12 muaj		
<b>Operatori :</b>	GEOKOS A & A O P				Nr 616 20120221 dt. 27.11.2020		
<b>Menaxheri i projektit :</b>	Aferdita Hasimi				Projekti i vitit 2020		
<b>Organi mbikëqyrës :</b>	Hazir Krasniqi, Aferdita Sopi						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e realizuara</b>	Fillimi i punimeve për marrjen e mostrave tek objekti ish- ndërmarrja “Gërmia”.					
	<b>Punët në realizim</b>	Nxjerrja e mostrave në afërsi të objektit ish- ndërmarrja “Gërmia”.					
<b>Vëllimi financiar</b>	<b>Situacionet ( Pagesat e proceduara)</b>	<b>Situacioni ( I )</b>	<b>Situacioni ( II )</b>	<b>Situacioni ( III )</b>	<b>Situacioni ( IV )</b>	<b>Situacioni ( V )</b>	<b>Situacioni ( VI )</b>
		25,370.00€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
		<b>Situacioni ( VII )</b>	<b>Situacioni ( VIII )</b>	<b>Situacioni ( IX )</b>	<b>Situacioni ( X )</b>	<b>Situacioni ( XI )</b>	<b>Situacioni ( XII )</b>
<b>Vonesat Shkalla e cilësisë</b>							
<b>Rekomandime masat për t’u ndërmarrë</b>							
<b>Vlerësimi i progresit në projekt</b>							

PRISHTINA		<b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>					SHIFRA <b>05</b>
Projekti :	Rigjenerimi i rrugës “Mehmet Kaçurri” ( Rruga Model )- Prishtinë	Vlera e projektit: 276,529.00 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik: 240 ditë kalendarike					
Operatori :	ALBI COMPANY SHPK	Nr 616 19215521 dt. 12.05.2020					
Menaxheri i projektit :	Afërdita Hasimi	Projekti i vitit 2020					
Organi mbikëqyrës :	Alban Morina, Yllka Sylja, Lindita Cervadiku Dibra, Avni Manaj, Agim Halili, Syzana Pllana, Amire Krasniqi						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara						
	Punët në realizim	Në procedurë të përmbylljes. Është bërë shkëputja e kontratës.					
Vëllimi financiar	Situacionet ( Pagesat e proceduara)	Situacioni ( I )	Situacioni ( II )	Situacioni ( III )	Situacioni ( IV )	Situacioni ( V )	Situacioni ( VI )
		50,000.00€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
		Situacioni ( VII )	Situacioni ( VIII )	Situacioni ( IX )	Situacioni ( X )	Situacioni ( XI )	Situacioni ( XII )
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime masat për t'u ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt							



<b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>							<b>SHIFRA 06</b>
<b>Projekti :</b>	<i>"Ndërtimi i rrugës Stallovë-Zllashë" - Loti 1"</i>					<b>Vlera e projektit:</b> 789 377.55 €	
<b>Investuesi :</b>	<b>Komuna e Prishtinës</b>					<b>Plani dinamik :</b> 180 ditë	
<b>Operatori :</b>	<b>Grupi I O E "Quality Asphalt Shpk" &amp; "Mirusha Company"</b> SHPK, me seli, rr. "2 Korriku" në Ferizaj					<b>Nr. 616-20-039-511</b>	
<b>Menaxheri i projektit : Organi mbikqyrës:</b>	*Halil Fejziu- idn.  Hazir Krasniqi & Sevdije Drenovci.					<b>Projekti i vitit : 2020</b>	
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
<b>Vëllimi Fizik</b>	<b>Punët e realizuara</b>	*Punët paraprake; *Punët e dheut; *Lëshesat dhe kanali anësor. *Gërmimi i dheut dhe planifikimi					
	<b>Punët në realizim</b>	*Tamponizimi I trases komplet					
<b>Vëllimi Financiar</b>	<b>Situacionet ( Pagesat e proceduara)</b>	<b>Situacioni ( I )</b>	<b>Situacioni ( II )</b>	<b>Situacioni ( III )</b>	<b>Situacioni ( IV )</b>	<b>Situacioni ( V )</b>	<b>Situacioni ( VI )</b>
		100 000.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
<b>Vonesat Shkalla e cilësisë</b>	10 Ditë			Mesatar			
<b>Rekomandime masat për tu ndërmarë</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Përgatitjet për fillimin e punimeve te mbistruktura.</li> </ul>						
<b>Vlerësimi i progresit në projekt</b>	-Punimet janë duke u realizuar sipas dinamikës së paraparë.						

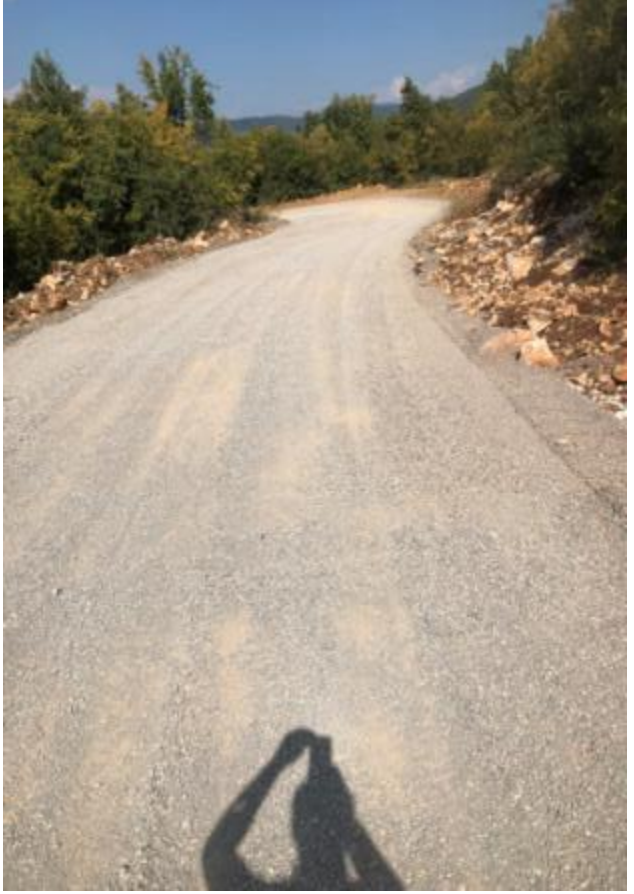


 <b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		SHIFRA <b>07</b>					
Projekti :	<i>"Ndërtimi i parqeve rekreativo-sportive -renovimi i kompleksit "Qafa"</i>						Vlera e projektit: 883,783.42 €
Investuesi :	Komuna e Prishtinës						Plani dinamik :210 ditë
Operatori:	<b>"Rexha" SHPK</b>						Nr. 616 19110 511 dt. 17.09.2019
Menaxheri i projektit :	Irfete Zejneli						Projekti i vitit 2019
Organi mbikëqyrës :	Bujar Rama , Bashkim Statovci , Behxhet Gashi,Burbuqe Agushi ,Ylber Jashari dhe Syzana Pllana .						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Punimi i pllakave në zonën 1 dhe zonën 3,</li> <li>● Punimi i gardhit në zonën 1 dhe zonën 3 ,</li> </ul>					
	Punët në realizim	Punimi i ulëseve dhe ndriçimit në zonën1 dhe 3 .					
Vëllimi financiar	Situacionet ( Pagesat e proceduara)	Situacioni ( I )	Situacioni ( II )	Situacioni ( III )	Situacioni ( IV )	Situacioni ( V )	Situacioni ( VI )
		50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	100,000.00€	50,000.00€
		Situacioni ( VII )	Situacioni i punëve shtese				
		100,000.00€	5,460.50€				
Vonesat Shkalla e cilësisë	☞ Vonesa do të ketë për shkak të problemeve me banorët.						
Rekomandime masat për tu ndërmarrë	Është njoftuar operatori ekonomik që punimet të zhvillohen sipas kontratës.						
Vlerësimi i progresit në projekt	☞ Shpresojmë të zgjidhen problemet me banorët për zonën 2 dhe 4 .						






PRISHTINA		<b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>					SHIFRA <b>08</b>
Projekti :	<i>"Ndërtimi i rrugës nga Pallati I panairëve deri te rruga "Vëllëzërit Fazliu"</i>					Vlera e projektit: 153,430.00 €	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik : 90 ditë	
Operatori:	<b>"Bashkim Meti" SHPK</b> <b>"Bashkim Mali " SHPK</b>					Nr. 616 20040 511 dt. 11.05.2021	
Menaxheri i projektit :	Irfete Zejneli					Projekti i vitit 2021	
Organi mbikëqyrës :	Zyrije Pllana dhe Behxhet Gashi .						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Janë përfunduar punët e gërmimit dhe mbushjes					
	Punët në realizim	Është punuar tamponi me zhavorr 0-63mm.					
Vëllimi financiar	Situacionet ( Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime masat për tu ndërmarrë	Është rekomanduar operatori ekonomik që të respektohet kontrata.						
Vlerësimi i progresit në projekt	Operatori ekonomik ka kërkuar ndërprerje të kontratës, për shkak të çmimeve të ulëta që ka në kontratë.						



 <b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		SHIFRA <b>09</b>					
Projekti :	"Ndërtimi i rrugës "Uran Ajeti"						Vlera e projektit: 206,724.93 €
Investuesi :	Komuna e Prishtinës						Plani dinamik : 120 ditë
Operatori:	"Noti Beton" SHPK						Nr. 616 21076 511 dt. 15.09.2021
Menaxheri i projektit :	Irfete Zejneli						Projekti i vitit 2021
Organi mbikëqyrës :	Hazir Krasniqi , Zyhrije Pllana.						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	● Kemi dërguar materialin për leje ndërtimore					
	Punët në realizim	Kemi kërkuar nga Drejtoria e Pronës të bëhet shpronësimi i pronave private.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		000.00€	000.00€	000.00€	000.00€	000.00€	000.00€
Vonesat Shkalla e cilësisë	☞ Vonesado të ketë për shkak se ka prona private dhe paraprakisht duhet të punohet ngrohja nga "Termokos".						
Rekomandime masat për tu ndërmarrë	Është njoftuar operatori ekonomik që të punohet plani dinamik i specifikuar.						
Vlerësimi i progresit në projekt	☞ Shpresojmë të zgjidhen problemete lartëcekura						




 <b>RAPORTI MBIKQYRËS</b>		SHIFRA <b>10</b>					
<b>Projekti :</b>	Rikonstruktimi i rrugëve në Bardhosh, Bërnice të Epërme, Lebanë, Vranidoll, Barilevë dhe Mramor	<b>Vlera e projektit:</b> <b>431,470.58€</b>					
<b>Investuesi :</b>	<b>Komuna e Prishtinës</b>	<b>Plani dinamik :</b> <b>120 ditë</b>					
<b>Operatori :</b>	<b>“BAGERI” SHPK</b>	Nr.616-20-1374-5-1-1/C563 dt.11.05.21					
<b>Menaxheri i projektit :</b>	<b>Qazim Bajrami nga DIKMK</b>	<b>Projekti i vitit :</b> <b>2020</b>					
<b>Organi mbikqyrës :</b>	<b>Afërdita Sopi, Azem Buzuku nga DIKMK</b>						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e realizuara</b>	Ndërtimi i rrugëve “Rogozhina”, ”Prizreni” dhe “Hasan Pllana” në Bërnice të Epërme, asfaltimi i rrugëve në Rimanishtë dhe Mramor					
	<b>Punët në realizim</b>	Ndërtimi i rrugëve Besi-Lebanë-Barilevë					
<b>Vëllimi Financiar</b>	<b>Situacionet ( Pagesat e proceduara)</b>	<b>Situacioni I</b>	<b>Situacioni II</b>	<b>Situacioni III</b>	<b>Situacioni IV</b>	<b>Situacioni V</b>	<b>Situacioni VI,</b>
<b>Vonesat Shkalla e cilësisë</b>							
<b>Rekomandime masat për tu ndërmarë</b>		Duhet të rritet kapaciteti edhe i makinerisë edhe stafit					
<b>Vlerësimi i progresit në projekt</b>		Ka vonesa, sipas kësaj dinamike kompania nuk do të mund t’i përfundojë punimet në afat.					










 <b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		<b>SHIFRA</b> <b>11</b>					
<b>Projekti :</b>	Implementimi i Planit të mobilitetit –rikonstruktimi i rrugës “Muharrem Fejza”	Vlera e projektit: 704,163.30€					
<b>Investuesi :</b>	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 120 ditë					
<b>Operatori :</b>	“RAHOVICA COMERCE” SHPK	Nr. 616 -19- 6284-5-1-1 dt. 22.02.2021					
<b>Menaxheri i projektit :</b>	Qazim Bajrami nga DIKMK	Projekti i vitit : 2019					
<b>Organi mbikëqyrës :</b>	Syzana Pllana , Hazir Krasniqi nga DIKMK						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e realizuara</b>	Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik, me gjatësi 820m, asfaltimi i segmentit me gjatësi 200m, shtresa e parë.					
	<b>Punët në realizim</b>	Përgatitja e segmentit me gjatësi prej 250m për asfaltim					
<b>Vëllimi Financiar</b>	<b>Situacionet ( Pagesat e proceduara)</b>	<b>Situacioni I</b>	<b>Situacioni II</b>	<b>Situacioni III</b>	<b>Situacioni IV</b>	<b>Situacioni V</b>	<b>Situacioni VI,</b>
		07/07/21 96,000.00					
<b>Vonesat Shkalla e cilësisë</b>							
<b>Rekomandime masat për tu ndërmarë</b>		Nuk ka mundësi teknike që të punohet më shpejt, për shkak të punimeve të ngrohtores “Termokosi”, KEDS-it, “Art Motion”, “IPKO”, “Kujtesa”					
<b>Vlerësimi i progresit në projekt</b>		Nuk po mund të punohet sipas planit dinamik, për shkak të punimeve të kompanive tjera dhe problemeve pronësore.					

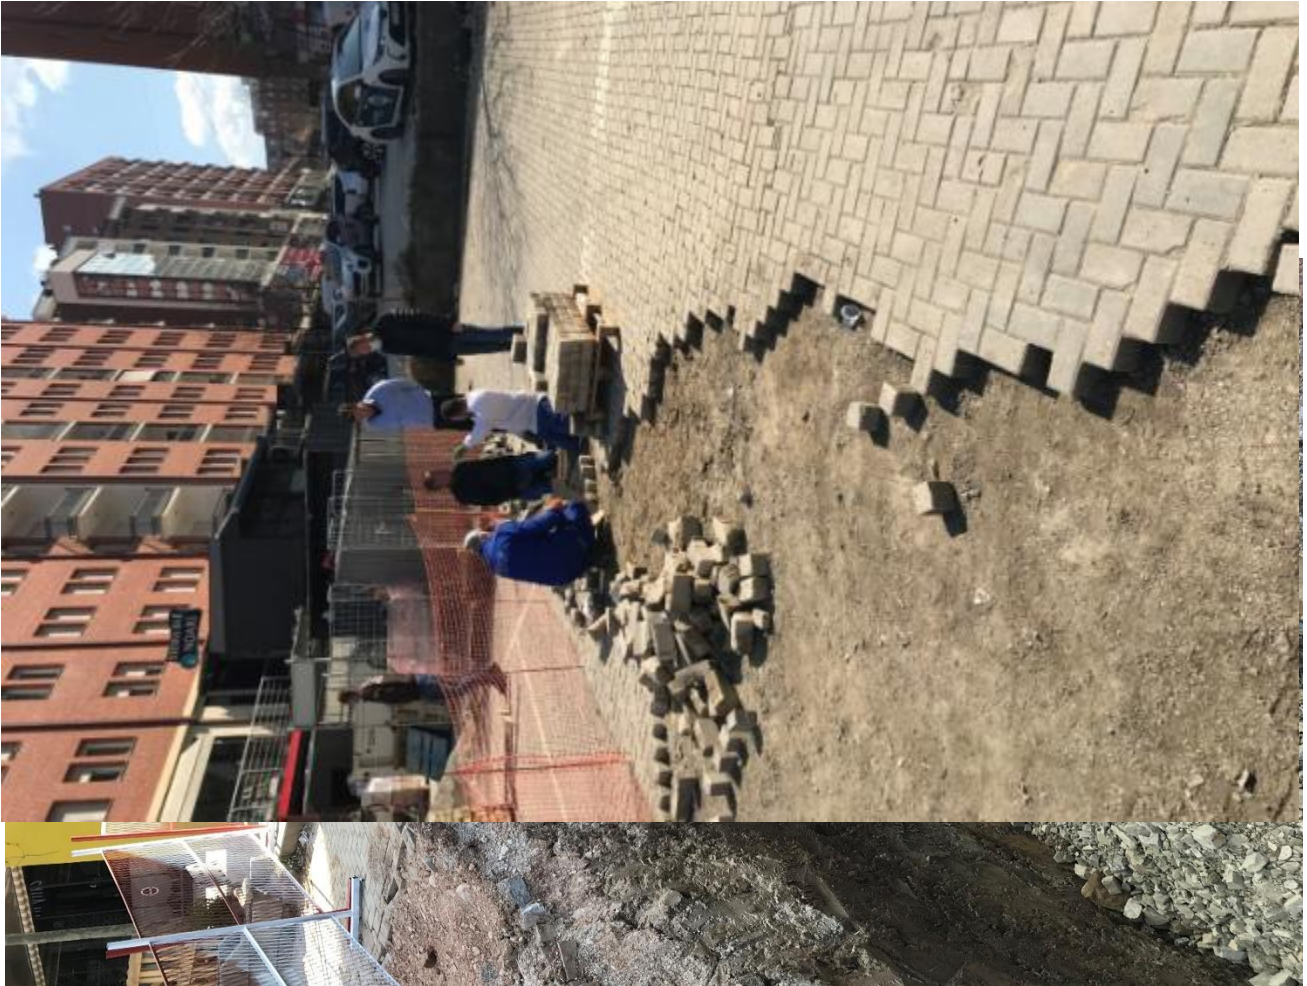







Punimet e termokosit









PRISHTINA		<b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>					SHIFRA <b>12</b>
<b>Projekti :</b>	Rikonstruktimi i rrugëve në: Bardhosh, Bërnice të Epërme, Lebanë, Vranidoll, Barilevë dhe Mramor						<b>Vlera e projektit:</b> <b>147,373.74€</b>
<b>Investuesi :</b>	Komuna e Prishtinës						<b>Plani Dinamik :90 ditë</b>
<b>Operatori :</b>	<b>BAGERI SH.P.K</b>						Nr.616-21-090-5-2-1 Dt. 24.08.21
<b>Menaxheri i projektit :</b>	Qazim Bajrami nga DIKMK						<b>Projekti i vitit : 2021</b>
<b>Organi mbikqyrës :</b>	Imer Mavriqi, Behxhet Gashi nga DIKMK						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e realizuara</b>	Piketimi i trasesë sipas projektit					
	<b>Punët në realizim</b>	Gërmimi i gjërë					
<b>Vëllimi Financiar</b>	<b>Situacionet ( Pagesat e proceduara)</b>	<b>Situacioni I</b>	<b>Situacioni II</b>	<b>Situacioni III</b>	<b>Situacioni IV</b>	<b>Situacioni V</b>	<b>Situacioni VI,</b>
<b>Vonesat Shkalla e cilësisë</b>							
<b>Rekomandime masat për tu ndërmarë</b>		Duhet të rritet kapaciteti i makinerisë dhe stafit, për shkak të kushteve atmosferike që mund të ndryshojnë.					
<b>Vlerësimi i progresit në projekt</b>		Sipas planit dinamik					



**Drejtori :**  
**Gëzim Mehmeti**

Prishtinë, shtator 2021
