



**Republika e Kosovës**  
**Republika Kosova - Republic of Kosovo**  
**Komuna e Prishtinës**  
**Opština Priština - Municipality of Prishtina**



## **Raporti i vitit 2021**

**Qershor 01- 30.06.2021**

### **1. Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave**

Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave gjatë muajit qershor 2021, ka kryer këto aktivitete: kërkesat për hartimin e detyrave projektuese dhe identifikimin e nevojave, shqyrtimin e kërkesave të banorëve të bashkësive lokale dhe inkorporimi i tyre në planet e Komunës, njoftimi me kohë i kompanive publike dhe subjekteve relevante me qëllim të koordinimit të punëve, incizimi i gjendjes ekzistuese të infrastrukturës në qytetin e Prishtinës, si dhe kompletimi i dokumentacionit teknik për procedimin e tyre në organet kompetente, mbikëqyrja e realizimit të projekteve konform marrëveshjes etj.

#### **1.1. Shqyrtimi i kërkesave**

Gjatë muajit qershor 2021, drejtoria ka proceduar 75 kërkesa të ndryshme të bashkësive lokale dhe banorëve: për ndërtimin e rrugëve, trotuareve dhe kanalizimeve, kërkesa për rregullimin e rrugëve dhe kanalizimeve, kërkesa nga kompanitë publike-leje për gropim dhe intervenime për sanimin e defekteve të ndryshme, kërkesa nga kompanitë për formime të komisioneve për kontrollimin e punëve, kërkesa të natyrave të ndryshme rreth definimit të zgjidhjes në terren etj. Nga numri i përgjithshëm prej 75 kërkesave të pranuar, 52 kërkesa janë të përfunduara.

#### **1.2. Dërgimi i kërkesave për hartimin e detyrave projektuese dhe identifikimi i nevojave**

Duke marrë për bazë Ligjin mbi planifikimin hapësinorë, Ligjin mbi ndërtimin e objekteve investive, si dhe Ligjin për projektim, e në veçanti planet rregulluese, janë dërguar kërkesat për hartimin e detyrave projektuese në zonat urbane dhe rurale.




### **1.3. Raportimi i menaxherëve të projekteve infrastrukturore**



|                         |  |
|-------------------------|--|
| Drejtoria               | Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave  |
| Sektori                 | Menaxhimi i Kontratave ( Ndërtimi i ulët )   |
| Drejtori                | Gëzim Mehmeti  |
| Raportoi                | Dukagjin Buçaj, idn. - U.D. i shefit të Sektorit   |
| Kontrolloi – Përpunoi   | Muhamed Emra, idn - zyrtar i lartë për ndërtim urban   |
| Periudha raportuese     | 01-30.06.2020, muaji qershor   |
| Menaxhëret e projekteve | Muhamed Emra<br>Irfete Zejneli<br>Syzana Pllana<br>Qazim Bajrami<br>Dugagjin Buçaj<br>Ibrahim Gervalla<br>Zyhrije Pllana |
| Organi mbikqyrës        | Azem Buzuku<br>Aferdita Sopi<br>Behxhet Gashi<br>Ramadan Nebiu<br>Hazir Krasniqi<br>Amire Krasniqi<br>Bujar Rama         |



### **1.3. Raportimi i menaxhereve të projekteve infrastrukturore**

| PRISHTINA  |   | RAPORTI MBIKËQYRËS   |                   |                    |                   |  | SHIFRA<br><b>01</b> |  |
|--|---|--|-------------------|--------------------|-------------------|--|---------------------|--|
| Projekti :   | <i>Rikonstruktimi i rrugës "Agim Ramadani"</i>  |  |                   |                    |                   | Vlera e projektit:<br><b>398.092,40€</b> |                     |  |
| Investuesi :   | Komuna e Prishtinës   |  |                   |                    |                   | Plani dinamik<br>180 ditë                |                     |  |
| Operatori :  | SHPK "RSM Company"  |  |                   |                    |                   | Nr.616 019 028 511<br>dt. 21.04.2020     |                     |  |
| Menaxheri i projektit :  | Muhamed Emra, idn.  |  |                   |                    |                   | Projekti i vitit:<br>2020                |                     |  |
| Organi mbikëqyrës :  | Syzana Pllana, ing.hidro. Bujar Rama, ing.gjeod., Sevdije Drenovci, ing.komunikacion., Bashkim Statovci, ing.elektros |  |                   |                    |                   |  |                     |  |
| <b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b> |   |  |                   |                    |                   |  |                     |  |
| Vëllimi fizik  | Punët e realizuara  | - Më 05.05.2021, kanë përfunduar të gjitha punimet.<br>( Në bazë të ditarit ndërtimor) |                   |                    |                   |  |                     |  |
|  | Punët në realizim   |  |                   |                    |                   |  |                     |  |
| Vëllimi financiar  | Situacionet ( Pagesat e proceduara)   | Situacioni ( I )   | Situacioni ( II ) | Situacioni ( III ) | Situacioni ( IV ) | Situacioni ( V )                         |                     |  |
|  |   | 50.410,0€  | 50.000,0€         | 106.858,50         | 150.160,11        | 22,239.26                                |                     |  |
| Vonesat Shkalla e cilësisë   |   | --   |                   |                    | Mesatar           |  |                     |  |
| Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë                                       |   | - Më 05.05.2021, kanë përfunduar të gjitha punimet.<br>( Në bazë të ditarit ndërtimor) |                   |                    |                   |  |                     |  |
| Vlerësimi i progresit në projekt   |   | - Më 05.05.2021 kanë përfunduar të gjitha punimet.<br>( Në bazë të ditarit ndërtimor)  |                   |                    |                   |  |                     |  |



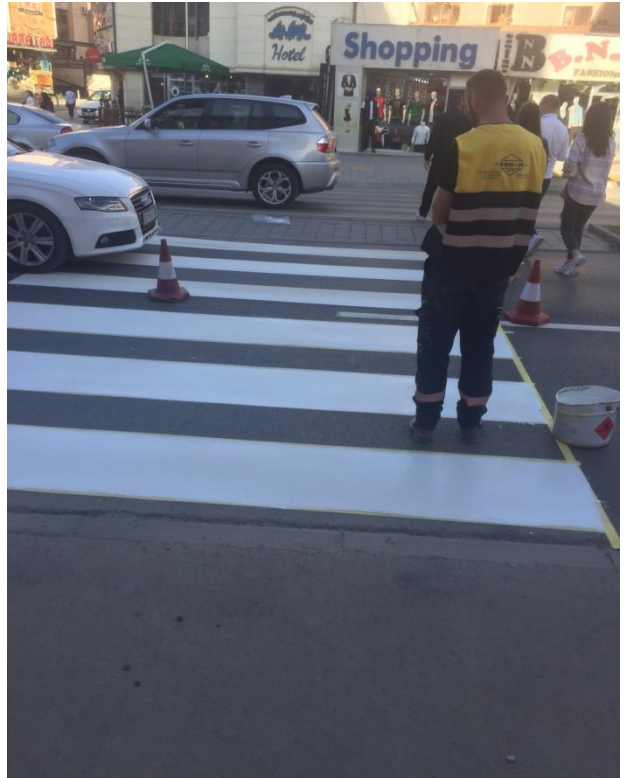

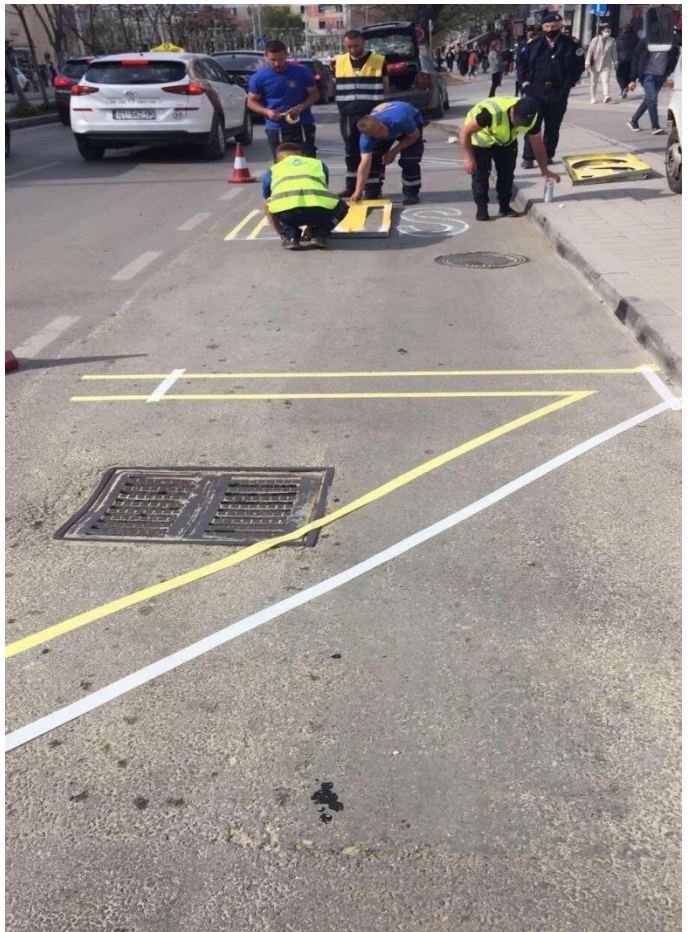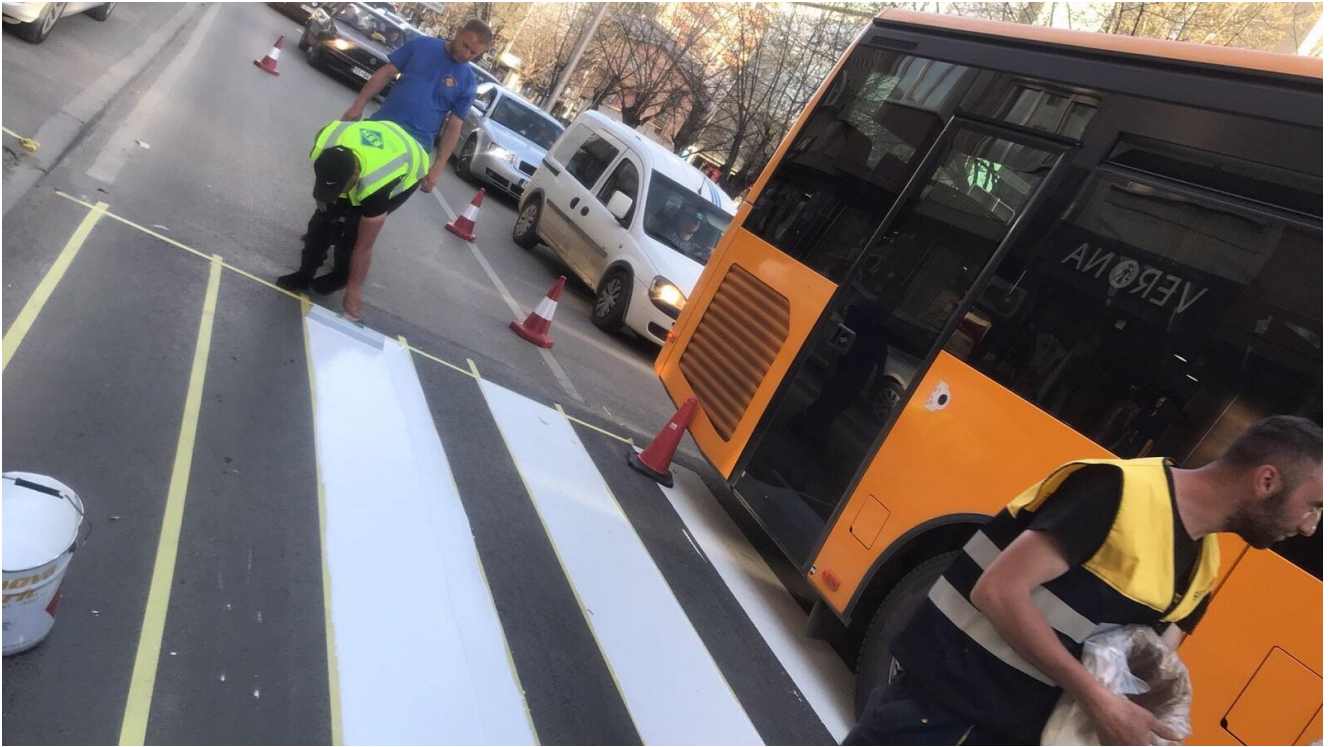

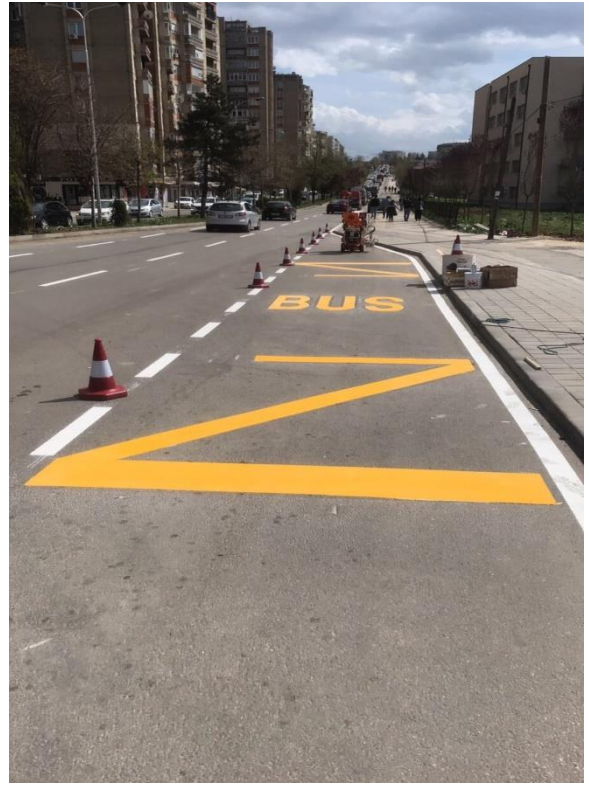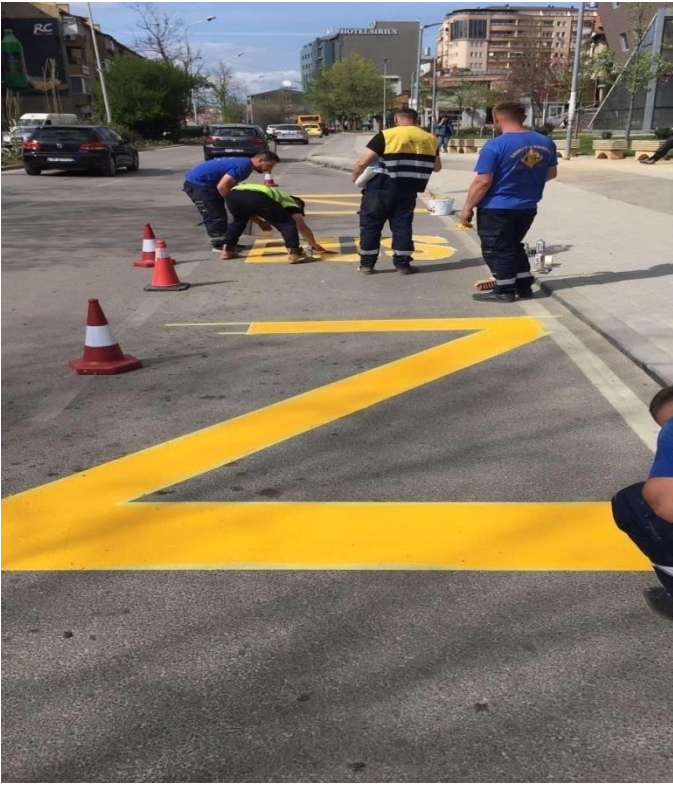

| PRISHTINA  |   | <b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>  |                          |                           |                          |                         | SHIFRA<br><b>02</b>      |
|--|---|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Projekti :</b>  | <b>Ndërtimi i Qendrës kulturore për të rinj, bibliotekës në lagjen “Kodra e Trimave”</b>  | <b>Vlera e projektit:</b><br><b>424,257.61 €</b>   |                          |                           |                          |                         |                          |
| <b>Investuesi :</b>  | <b>Komuna e Prishtinës</b>  | <b>Plani dinamik</b><br><b>150 ditë</b><br><b>kalendariq</b>   |                          |                           |                          |                         |                          |
| <b>Operatori :</b>   | <b>Grup operatores ”ConDes” SHPK</b><br><b>“Euroconstruction” SHPK</b>  | <b>Nr.616-19-208-5-1-1</b><br><b>Dt.14.09.2020</b>   |                          |                           |                          |                         |                          |
| <b>Menaxheri i projektit :</b>   | <b>Muhamed Emra idn ;</b>   | <b>Projekti i vitit:</b><br><b>2020</b>  |                          |                           |                          |                         |                          |
| <b>Organi mbikëqyrës :</b>   | <b>Arbër Sadiku, idh, ; Besian Sinani, idn ;</b><br><b>Halil Demolli, idm. ; Nazmi Bajrami, ide., Armend Avdiu idh hidro,</b><br><b>Avdirrahman Zuka, idm., Hazir Krasniqi, tek.gjeodet</b> |  |                          |                           |                          |                         |                          |
| <b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b> |   |  |                          |                           |                          |                         |                          |
| <b>Vëllimi fizik</b>   | <b>Punët e realizuara</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Pastrimi i terrenit;</li> <li>- Rrethekimi i punishtes, sigurimi i punishtes;</li> <li>- Vendosja e tabelës informuese;</li> <li>- Incizimi, piketimi digjital i objektit;</li> <li>-Gërmimi i terrenit deri në nivelin e themelit të pllakës.</li> </ul>  |                          |                           |                          |                         |                          |
|  | <b>Punët në realizim</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mbushja e gropës ndërtimore me material guror.</li> </ul>   |                          |                           |                          |                         |                          |
| <b>Vëllimi financiar</b>   | <b>Situacionet ( Pagesat e proceduara)</b>  | <b>Situacioni ( I )</b>  | <b>Situacioni ( II )</b> | <b>Situacioni ( III )</b> | <b>Situacioni ( IV )</b> | <b>Situacioni ( V )</b> | <b>Situacioni ( VI )</b> |
|  |   |  |                          |                           |                          |                         |                          |
| <b>Vonesat Shkalla e cilësisë</b>  |   | --   |                          |                           | Mesatar                  |                         |                          |
| <b>Rekomandime masat për tu ndërmarë</b>                                   |   | <p>Ju njoftojmë se projekti kryesor nuk përmban sigurimin e gropës ndërtimore. Në bazë të projektit, distanca në mes të vijës ndërtimore me objektet individuale ekzistuese përreth janë shumë afër, duke e pasur parasysh që nuk është bërë sigurimi i gropës ndërtimore nga byroja projektuese, për shkak të sigurisë së objekteve jemi detyrua që të zhvendoset objekti, në mënyrë që të mos rrezikohen objektet përreth.</p> |                          |                           |                          |                         |                          |
| <b>Vlerësimi i progresit në projekt</b>                                    |   | <p>Punimet janë duke u zhvilluar sipas planit dinamik të paraparë, mirepo kemi ngecje në fazën e gërmimit të objektit për shkak të dislokimit të bërë, në mënyrë që të mos rrezikohen objektet individuale ekzistuese përreth.</p>   |                          |                           |                          |                         |                          |





| PRISHTINA  |   | <b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>   |                          |                           |                          |                         | <b>SHIFRA</b><br><b>03</b> |
|--|---|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Projekti :</b>  | <b>Ndërtimi i rrugës “Haxhi Bejta” në Grashticë</b> | <b>Vlera e projektit:</b><br><b>67,537.38 €</b>   |                          |                           |                          |                         |                            |
| <b>Investuesi :</b>  | <b>Komuna e Prishtinës</b>                          | <b>Plani dinamik</b><br><b>90 ditë</b><br><b>kalendarike</b>  |                          |                           |                          |                         |                            |
| <b>Operatori :</b>   | <b>SHPK ”Beni Construction“</b>                     | <b>Nr. 616-19-208-5-1-1</b><br><b>Dt. 29.04.2021</b>  |                          |                           |                          |                         |                            |
| <b>Menaxheri i projektit :</b>   | <b>Muhamed Emra, idn</b>                            | <b>Projekti i vitit:</b><br><b>2021</b>   |                          |                           |                          |                         |                            |
| <b>Organi mbikëqyrës :</b>   | <b>Jeton Zherka, ida., Zyhrije Pllana, ida.</b>     |   |                          |                           |                          |                         |                            |
| <b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b> |   |   |                          |                           |                          |                         |                            |
| <b>Vëllimi fizik</b>   | <b>Punët e realizuara</b>                           | - Incizimi, piketimi digjital i objektit  |                          |                           |                          |                         |                            |
|  | <b>Punët në realizim</b>                            | - Gërmimi i gjerë i trupit të rrugës  |                          |                           |                          |                         |                            |
| <b>Vëllimi financiar</b>   | <b>Situacionet ( Pagesat e proceduara)</b>          | <b>Situacioni ( I )</b>   | <b>Situacioni ( II )</b> | <b>Situacioni ( III )</b> | <b>Situacioni ( IV )</b> | <b>Situacioni ( V )</b> | <b>Situacioni ( VI )</b>   |
|  |   |   |                          |                           |                          |                         |                            |
| <b>Vonesat Shkalla e cilësisë</b>  |   | --  |                          |                           | Mesatar                  |                         |                            |
| <b>Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë</b>                                |   | Me rastin e gërmimit të gjerë të trupit të rrugës, janë lajmëruar instalimet nëntokësore në nivel të cekët të trupit të rrugës. |                          |                           |                          |                         |                            |
| <b>Vlerësimi i progresit në projekt</b>                                    |   | Është kërkuar nga operatori ekonomik, përmes shkresës zyrtare, që të rritë kapacitetin dinamik të punimeve.                     |                          |                           |                          |                         |                            |






| PRISHTINA  |   | <b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>   |                 |                  |                 |  | SHIFRA<br><b>04</b> |
|--|---|---|-----------------|------------------|-----------------|--|---------------------|
| Projekti :   | Ndërtimi i rrugëve "Azem Bejta" dhe "Shkodra"               |   |                 |                  |                 | Vlera e projektit:<br>42,224.40 €      |                     |
| Investuesi :   | Komuna e Prishtinës   |   |                 |                  |                 | Plani dinamik<br>60 ditë<br>kalendarik |                     |
| Operatori :  | "Seticommerc", SHPK<br>"Burimi", SHPK                       |   |                 |                  |                 | 616 20 040 511<br>Dt12.04.2021         |                     |
| Menaxheri i projektit :  | Muhamed Emra, idn.  |   |                 |                  |                 | Projekti i vitit:<br>2021              |                     |
| Organi mbikëqyrës :  | Sevdije Drenovci, idk., Hazir Krasniqi, teknik i gjeodezisë |   |                 |                  |                 |  |                     |
| <b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b> |   |   |                 |                  |                 |  |                     |
| <b>Vëllimi fizik</b>   | Punët e realizuara  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incizimi, piketimi digjital i objektit;</li> <li>- Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale;</li> <li>- Gërmimi i gjerë i trupit të rrugës;</li> <li>- Furnizmi dhe shtrirja e tamponit 0-63mm;</li> <li>- Furnizmi dhe shtrirja e tamponit 0-31mm.</li> </ul>  |                 |                  |                 |  |                     |
|  | Punët në realizim   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vendosja e skajoreve të betonit 20/24cm.</li> <li>- Vendosja e pllakve të betonit.</li> </ul>  |                 |                  |                 |  |                     |
| <b>Vëllimi financiar</b>   | Situacionet (Pagesat e proceduara)                          | Situacioni (I)  | Situacioni (II) | Situacioni (III) | Situacioni (IV) | Situacioni (V)                         | Situacioni (VI)     |
|  |   |   |                 |                  |                 |  |                     |
| Vonesat Shkalla e cilësisë   |   | --  |                 |                  | Mesatar         |  |                     |
| Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë                                       |   | Punimet kanë filluar më 07.06.2021, sipas ditarit ndërtimor   |                 |                  |                 |  |                     |
| Vlerësimi i progresit në projekt   |   | Punimet janë duke u zhvilluar sipas planit dinamik kalendarik, vlen të theksohet te rruga "Azem Bejta", ende nuk kemi filluar realizimin e punimeve, për arsye që në kuadër të kogjenerimit të rrjetit elektrik punimet ende nuk kanë përfunduar nga kompania KEDS. Me rastin e përfundimit të punimeve do të fillojmë realizimin e këtij segmenti. |                 |                  |                 |  |                     |



|  <b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b> |  | <b>SHIFRA</b><br><b>05</b>                                     |                        |                         |                        |                       |                        |
|---|--|--|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Projekti :</b>   | <i>Ndërtimi i rrugës në fshatin Mramor, lagjen Kullaj</i>  | Vlera e projektit:<br><b>144,822.25 €</b>                      |                        |                         |                        |                       |                        |
| <b>Investuesi :</b>   | <b>Komuna e Prishtinës</b>   | Plani dinamik<br>90 ditë<br>kalendarik                         |                        |                         |                        |                       |                        |
| <b>Operatori :</b>  | <b>NPSH "Beni Contruction" SHPK<br/>Vb Tofaj</b>   | Nr.616 200 39 511<br>Dt. 21.10.2020                            |                        |                         |                        |                       |                        |
| <b>Menaxheri i projektit :</b>  | <b>Zyhrije Pllana, ida.</b>  | Projekti i vitit:<br>2020                                      |                        |                         |                        |                       |                        |
| <b>Organi mbikëqyrës :</b>  | <b>Dukagjin Buçaj, idn,<br/>Aferdita Hasimi, idn.</b>  |  |                        |                         |                        |                       |                        |
| <b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>                                  |  |  |                        |                         |                        |                       |                        |
| <b>Vëllimi fizik</b>  | <b>Punët e realizuara</b>  | - Gërmimi i trupit të rrugës                                   |                        |                         |                        |                       |                        |
|   | <b>Punët në realizim</b>   | - Furnizimi dhe shtresimi i trupit të rrugës me zhavorr 0-63mm |                        |                         |                        |                       |                        |
| <b>Vëllimi financiar</b>  | <b>Situacionet (Pagesat e proceduara)</b>  | <b>Situacioni (I)</b>  | <b>Situacioni (II)</b> | <b>Situacioni (III)</b> | <b>Situacioni (IV)</b> | <b>Situacioni (V)</b> | <b>Situacioni (VI)</b> |
|   |  |  |                        |                         |                        |                       |                        |
| <b>Vonesat Shkalla e cilësisë</b>   |  | --   |                        |                         | Mesatar                |                       |                        |
| <b>Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë</b>   | Punimet janë duke u zhvilluar sipas projektit, gjegjëisht kontratës konform planit dinamik të paraparë |  |                        |                         |                        |                       |                        |
| <b>Vlerësimi i progresit në projekt</b>   | Punimet janë duke u zhvilluar sipas planit dinamik të paraparë   |  |                        |                         |                        |                       |                        |

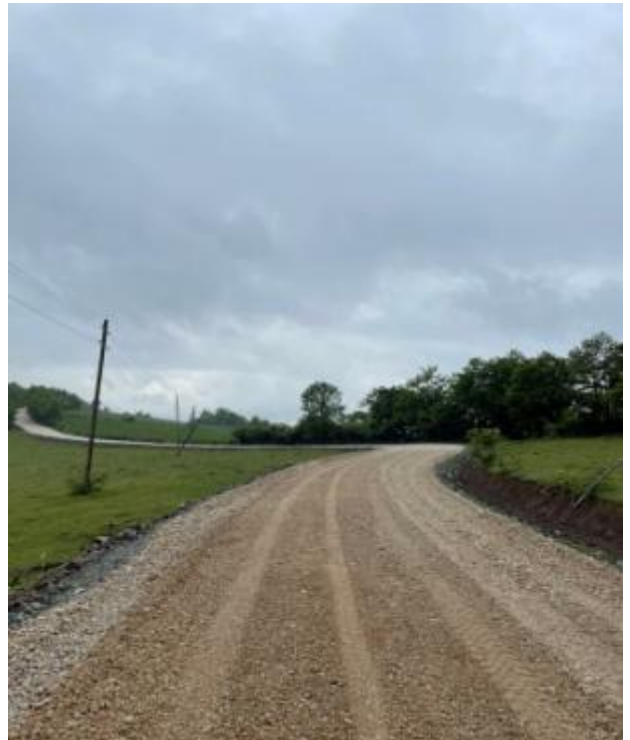




| PRISHTINA  |   | RAPORTI MBIKËQYRËS   |            |            |            |            | SHIFRA<br><b>06</b> |                |
|--|---|--|------------|------------|------------|------------|---------------------|----------------|
| Projekti :   | Implementimi i planit të mobilitetit – rekonstruimi i rrugës “Muharrem Fejza” | Vlera e projektit:   |            |            |            |            |                     | 704,163.30€    |
| Investuesi :   | Komuna e Prishtinës   | Plani dinamik :  |            |            |            |            |                     | 120 ditë       |
| Operatori :  | “RAHOVICA COMERCE” SHPK   | Nr. 616 -19- 6284-5-1-1  |            |            |            |            |                     | dt. 22.02.2021 |
| Menaxheri i projektit :  | Qazim Bajrami nga DIKMK   | Projekti i vitit :   |            |            |            |            |                     | 2019           |
| Organi mbikqyrës :   | Syzana Pllana , Hazir Krasniqi nga DIKMK                                      |  |            |            |            |            |                     |                |
| <b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b> |   |  |            |            |            |            |                     |                |
| Vëllimi fizik  | Punët e realizuara  | Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik, me gjatësi 820m   |            |            |            |            |                     |                |
|  | Punët në realizim   | Për momentin nuk është duke u punuar, pasi që termokosi nuk ka krijuar ende hapësirë të lirë që ne t'i vazhdojmë punimet |            |            |            |            |                     |                |
| Vëllimi Financiar  | Situacionet ( Pagesat e proceduara)   | Situacioni   | Situacioni | Situacioni | Situacioni | Situacioni | Situacioni          |                |
|  |   | I  | II         | III        | IV         | V          | VI,                 |                |
| Vonesat  | Shkalla e cilësisë  |  |            |            |            |            |                     |                |
| Rekomandime  | masat për tu ndërmarë   |  |            |            |            |            |                     |                |
| Vlerësimi i progresit në projekt   |   | Nuk po mund të punohet sipas planit dinamik, për shkak të punimeve që i ka filluar Termokosi.                            |            |            |            |            |                     |                |







Punimet e ndërmarrjes "Termokos"

|   |  |  |                      |                       |   |                            |                       |
|---|--|--|----------------------|-----------------------|---|----------------------------|-----------------------|
|  |  | <h1>RAPORTI MBIKËQYRËS</h1>  |                      |                       |   | <b>SHIFRA</b><br><b>07</b> |                       |
| <b>Projekti :</b>   | Rikonstruktimi i rrugëve në: Bardhosh, Bërnice e Epërme, Lebanë, Vranidoll, Barilevë dhe Mramuer |  |                      |                       | <b>Vlera e projektit:</b><br><b>431,470.58€</b> |                            |                       |
| <b>Investuesi :</b>   | Komuna e Prishtinës  |  |                      |                       | <b>Plani dinamik :</b><br><b>120 ditë</b>       |                            |                       |
| <b>Operatori :</b>  | <b>“BAGERI” SHPK</b>   |  |                      |                       | Nr.616-20-1374-5-1-1/C563<br>Dt. 11.05.2021     |                            |                       |
| <b>Menaxheri i projektit :</b>  | Qazim Bajrami nga DIKMK  |  |                      |                       | <b>Projekti i vitit :</b><br><b>2020</b>        |                            |                       |
| <b>Organi mbikqyrës :</b>   | Afërdita Sopi, Azem Buzuku nga DIKMK   |  |                      |                       |   |                            |                       |
| <b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>        |  |  |                      |                       |   |                            |                       |
| <b>Vëllimi fizik</b>  | <b>Punët e realizuara</b>  | Ndërtimi i rrugëve “Rogozhina”, ”Prizreni” dhe “Hasan Pllana” në Bërnice të Epërme |                      |                       |   |                            |                       |
|   | <b>Punët në realizim</b>   | Ndërtimi i rrugëve në Rimanishtë   |                      |                       |   |                            |                       |
| <b>Vëllimi Financiar</b>  | <b>Situacionet ( Pagesat e proceduara)</b>   | <b>Situacioni I</b>  | <b>Situacioni II</b> | <b>Situacioni III</b> | <b>Situacioni IV</b>                            | <b>Situacioni V</b>        | <b>Situacioni VI,</b> |
|   |  |  |                      |                       |   |                            |                       |
| <b>Vonesat Shkalla e cilësisë</b>   |  |  |                      |                       |   |                            |                       |
| <b>Rekomandime masat për tu ndërmarë</b>  |  | <i>Duhet të rritet kapaciteti i makinerisë dhe i stafit.</i>                       |                      |                       |   |                            |                       |
| <b>Vlerësimi i progresit në projekt</b>   |  | Sipas planit dinamik   |                      |                       |   |                            |                       |













| <b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>  |  | <b>SHIFRA<br/>08</b>   |                          |                           |                          |                         |                          |
|--|--|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Projekti :</b>  | <i>“Ndërtimi i rrugës Stallovë-Zllashë – Loti 1”</i>                           | Vlera e projektit:<br>789 377.55 €   |                          |                           |                          |                         |                          |
| <b>Investuesi :</b>  | <b>Komuna e Prishtinës</b>   | Plani dinamik :<br>180 ditë  |                          |                           |                          |                         |                          |
| <b>Operatori :</b>   | <b>Grupi I OE “Quality Asphalt Shpk” &amp; “Mirusha Company SHPK”, Ferizaj</b> | <b>Nr.616-20-039-511</b>   |                          |                           |                          |                         |                          |
| <b>Menaxheri i projektit :<br/>Organi mbikqyrës:</b>                       | *Halil Fejziu- idn.<br>Hazir Krasniqi & Sevdije Drenovci.                      | <b>Projekti i vitit :<br/>2020</b>   |                          |                           |                          |                         |                          |
| <b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b> |  |  |                          |                           |                          |                         |                          |
| <b>Vëllimi Fizik</b>   | <b>Punët e realizuara</b>  | <b>Punët paraprake;</b>  |                          |                           |                          |                         |                          |
|  | <b>Punët në realizim</b>   | <b>Punët e dheut,<br/>Lëshesat dhe kanali anësor.</b>  |                          |                           |                          |                         |                          |
| <b>Vëllimi Financiar</b>   | <b>Situacionet ( Pagesat e proceduara)</b>                                     | <b>Situacioni ( I )</b>  | <b>Situacioni ( II )</b> | <b>Situacioni ( III )</b> | <b>Situacioni ( IV )</b> | <b>Situacioni ( V )</b> | <b>Situacioni ( VI )</b> |
|  |  | 0.0€   | 0.0€                     | 0.0€                      | 0.0€                     | 0.0€                    | 0.0€                     |
| <b>Vonesat Shkalla e cilësisë</b>  |  | <b>10 ditë</b>   |                          |                           | <b>Mesatar</b>           |                         |                          |
| <b>Rekomandime masat për tu ndërmarë</b>                                   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Përgatitjet për fillimin e punimeve të mbistruktura.</li> </ul> |                          |                           |                          |                         |                          |
| <b>Vlerësimi i progresit në projekt</b>                                    |  | -Punimet janë duke u realizuar sipas dinamikës së paraparë.  |                          |                           |                          |                         |                          |



| <b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>  |  | <b>SHIFRA<br/>09</b>  |                          |                           |                          |                         |                          |
|--|--|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Projekti :</b>  | <i>“Ndërtimi i rrugës nga Flotacioni, lagjja Vakocv”</i>   | <b>Vlera e projektit:</b><br>497 358.78 €   |                          |                           |                          |                         |                          |
| <b>Investuesi :</b>  | <b>Komuna e Prishtinës</b>   | <b>Plani dinamik :</b><br>180 ditë  |                          |                           |                          |                         |                          |
| <b>Operatori :</b>   | <b>OE “Rahovica Commerce” SHPK Conzorcium<br/>“Mirusha Company” SHPK<br/>“Benita Company” SHPK, me seli në Ferizaj</b> | <b>Nr.616-20-030-511</b>  |                          |                           |                          |                         |                          |
| <b>Menaxheri i projektit :</b><br><b>Organi mbikqyrës:</b>                 | <b>Halil Fejziu, idn.</b><br><br>Afërdita Sopi & Ramadan Nebihi.   | <b>Projekti i vitit :</b><br>2021   |                          |                           |                          |                         |                          |
| <b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b> |  |   |                          |                           |                          |                         |                          |
| <b>Vëllimi Fizik</b>   | <b>Punët e realizuara</b>  | <b>Punët paraprake;<br/>Objektet;<br/>Mbistruktura.<br/>Përfundimi i asfaltimit</b> |                          |                           |                          |                         |                          |
|  | <b>Punët në realizim</b>   | - Punimi i bankinave dhe pahive elastoke si dhe ura.                                |                          |                           |                          |                         |                          |
| <b>Vëllimi Financiar</b>   | <b>Situacionet ( Pbagezat e proceduara)</b>  | <b>Situacioni ( I )</b>   | <b>Situacioni ( II )</b> | <b>Situacioni ( III )</b> | <b>Situacioni ( IV )</b> | <b>Situacioni ( V )</b> | <b>Situacioni ( VI )</b> |
|  |  | 100 000.0€  | 260 000.0€               | 0.0€                      | 0.0€                     | 0.0€                    | 0.0€                     |
| <b>Vonesat Shkalla e cilësisë</b>  |  | 10 ditë   |                          |                           | Mesatar                  |                         |                          |
| <b>Rekomandime masat për tu ndërmarrë</b>                                  |  | - Përgatitjet për fillimin e ndërtimit të urës.                                     |                          |                           |                          |                         |                          |
| <b>Vlerësimi i progresit në projekt</b>                                    |  | -Punimet jan duke u realizuar sipas dinamikës se paraparë.                          |                          |                           |                          |                         |                          |



| <b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>  |   | <b>SHIFRA<br/>10</b>   |                          |                           |                          |                         |                          |
|--|---|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Projekti :</b>  | "Ndërtimi i rrugës në lagjen Kllokoqi - Marevc "            | Vlera e projektit:<br>191 198.00€,   |                          |                           |                          |                         |                          |
| <b>Investuesi :</b>  | Komuna e Prishtinës   | Plani Dinamik :<br>120 ditë  |                          |                           |                          |                         |                          |
| <b>Operatori :</b>   | OE "Ledi Ing" SHPK, Caralevë.                               | Nr. 616-20-039-511   |                          |                           |                          |                         |                          |
| <b>Menaxheri i projektit :</b><br><b>Organi mbikqyrës:</b>                 | Halil Fejziu- idn.<br>Fatmir Uka & Ymer Mavriqi.            | Projekti i vitit :<br>2020   |                          |                           |                          |                         |                          |
| <b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b> |   |  |                          |                           |                          |                         |                          |
| <b>Vëllimi Fizik</b>   | <b>Punët e realizuara</b>                                   | <b>Punët përgatitore;<br/>Punët e dheut;<br/>Lëshesat.</b>                                 |                          |                           |                          |                         |                          |
|  | <b>Punët në realizim</b>                                    | - Punimi i gjeotekstil dhe i mbistrukturës.<br>- Tamponizimi me material 0-60 dhe 0-31.5mm |                          |                           |                          |                         |                          |
| <b>Vëllimi Financiar</b>   | <b>Situacionet ( Pagesat e proceduara)</b>                  | <b>Situacioni ( I )</b>  | <b>Situacioni ( II )</b> | <b>Situacioni ( III )</b> | <b>Situacioni ( IV )</b> | <b>Situacioni ( V )</b> | <b>Situacioni ( VI )</b> |
|  |   | 31654.40€  | 0.0€                     | 0.0€                      | 0.0€                     | 0.0€                    | 0.0€                     |
| <b>Vonesat Shkalla e cilësisë</b>  | <b>10 Ditë</b>  |  |                          | <b>Mesatar</b>            |                          |                         |                          |
| <b>Rekomandime masat për tu ndërmarë</b>                                   | - Vazhdimi i tamponizimit me material 060 & 031.            |  |                          |                           |                          |                         |                          |
| <b>Vlerësimi i progresit në projekt</b>                                    | -Punimet janë duke u realizuar sipas dinamikës së paraparë. |  |                          |                           |                          |                         |                          |






| <b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>                               |  | <b>SHIFRA</b><br><b>11</b>  |                     |                     |  |  |
|---|--|---|---------------------|---------------------|--|--|
| <b>Projekti :</b>                                       | Ndërtimi i rrugës Keqekollë-Nishevc        | <b>Vlera e projektit:</b><br><b>106,196.00€</b>                                     |                     |                     |  |  |
| <b>Investuesi :</b>                                     | Komuna e Prishtinës                        | <b>Plani dinamik :</b><br><b>90 ditë</b>  |                     |                     |  |  |
| <b>Operatori :</b>                                      | <b>SHPK,,Integral"</b>                     | nr.identifikues:<br>616 200 395 511   |                     |                     |  |  |
| <b>Menaxheri i projektit :</b>                          | Ibrahim Gërvalla                           | <b>Projekti i vitit 2020</b>  |                     |                     |  |  |
| <b>Organi mbikqyrës :</b>                               | Qazim Bajrami ,Irfete Zeneli               |   |                     |                     |  |  |
| <b>Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë</b> |  |   |                     |                     |  |  |
| <b>Vëllimi fizik</b>                                    | <b>Punët e parapara</b>                    | <b>-Rregullimi dhe asfaltimi i segmentit të fundit të rrugës Keqekollë-Nishevc.</b> |                     |                     |  |  |
|   | <b>Punët në realizim e sipër</b>           | <b>-Punimet janë në fazën përmbyllëse.</b>  |                     |                     |  |  |
| <b>Vëllimi Financiar</b>                                | <b>Situacionet ( Pagesat e proceduara)</b> | <b>Situacioni 1</b>   | <b>Situacioni 2</b> | <b>Situacioni 3</b> |  |  |
|   |  |   |                     |                     |  |  |



| <b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>                               |  | <b>SHIFRA<br/>12</b>   |                     |                     |  |  |
|---|--|--|---------------------|---------------------|--|--|
| <b>Projekti :</b>                                       | Rekonstruimi i rrugës Viti-Bullaj, Marec   | <b>Vlera e projektit:<br/>189,642.60€</b>  |                     |                     |  |  |
| <b>Investuesi :</b>                                     | Komuna e Prishtinës                        | <b>Plani Dinamik :<br/>60 ditkalendarike</b>   |                     |                     |  |  |
| <b>Operatori :</b>                                      | <b>SHPK,,Kema Company"</b>                 | nr.identifikues:<br>616 20 195 521   |                     |                     |  |  |
| <b>Menaxheri i projektit :</b>                          | Ibrahim Gërvalla                           | <b>Projekti i vitit 2021</b>   |                     |                     |  |  |
| <b>Organi mbikqyrës :</b>                               | Behgjet Gashi, Hazir Krasniqi              |  |                     |                     |  |  |
| <b>Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë</b> |  |  |                     |                     |  |  |
| <b>Vëllimi fizik</b>                                    | <b>Punët e parapara</b>                    | <b>-Hapja e kanalit anësor, sanimi i shtresës ekzistuese të asfaltit të dëmtuar, si dhe vendosja e shtresës se re të asfaltit.</b> |                     |                     |  |  |
|   | <b>Punët në realizim e sipër</b>           | <b>-Punimet janë në hapjen e kanalit, si dhe sanimin e asfaltit të dëmtuar</b>   |                     |                     |  |  |
| <b>Vëllimi Financiar</b>                                | <b>Situacionet ( Pagesat e proceduara)</b> | <b>Situacioni 1</b>  | <b>Situacioni 2</b> | <b>Situacioni 3</b> |  |  |
|   |  | 130 000.00   |                     |                     |  |  |

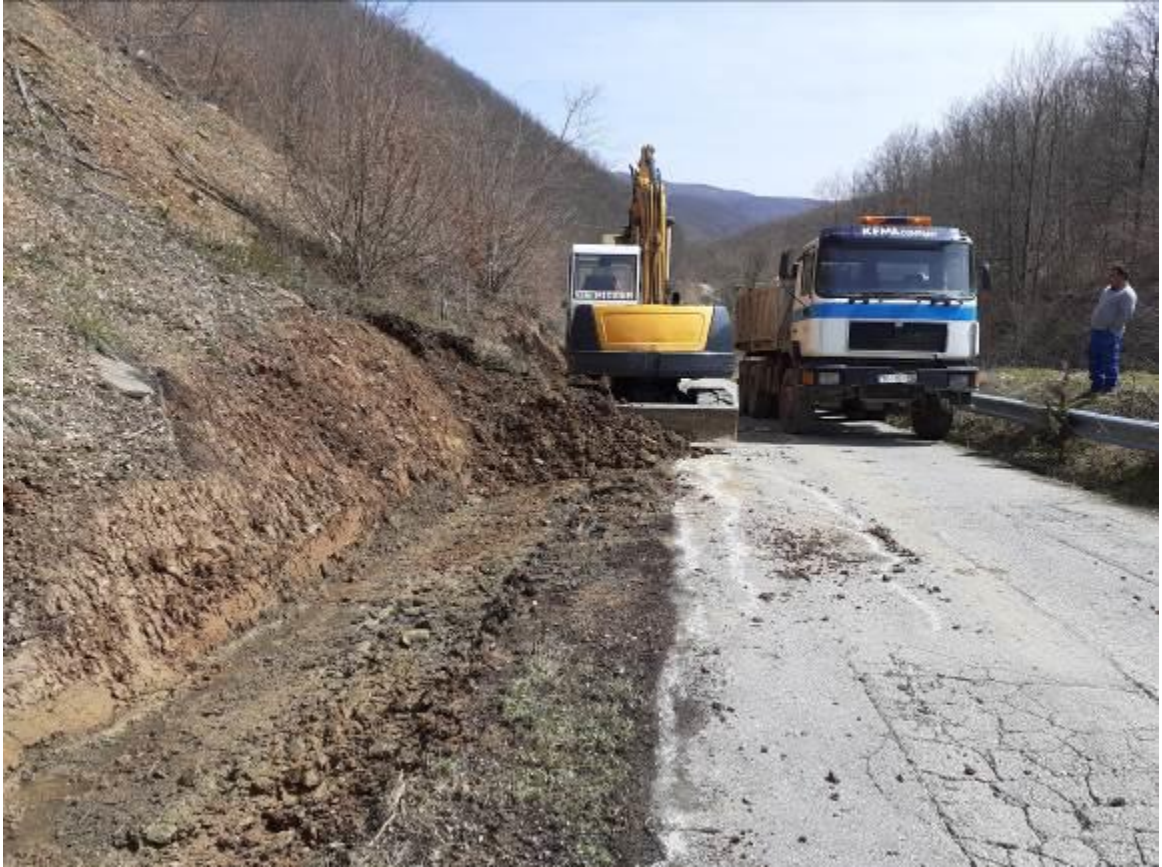

| <b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>                               |  | <b>SHIFRA<br/>13</b>   |                     |                     |  |  |
|---|--|--|---------------------|---------------------|--|--|
| <b>Projekti :</b>                                       | Ndërtimi i rrugës kryesore dhe rrugicave në Bërnice të Poshtme | <b>Vlera e projektit:<br/>151.202.58€</b>  |                     |                     |  |  |
| <b>Investuesi :</b>                                     | <b>Komuna e Prishtinës</b>                                     | <b>Plani dinamik :<br/>90 ditë</b>   |                     |                     |  |  |
| <b>Operatori :</b>                                      | <b>NTP,,Bashkimi"</b>  | nr.identifikues:<br>616 20 154 521   |                     |                     |  |  |
| <b>Menaxheri i projektit :</b>                          | Ibrahim Gërvalla   | <b>Projekti i vitit<br/>2021</b>   |                     |                     |  |  |
| <b>Organi mbikqyrës :</b>                               | Afërdita Sopi, Sevdije Drenovci                                |  |                     |                     |  |  |
| <b>Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë</b> |  |  |                     |                     |  |  |
| <b>Vëllimi fizik</b>                                    | <b>Punët e parapara</b>  | <b>-Rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve, duke përfshirë këtu lëshesat dhe sinjalizimin.</b> |                     |                     |  |  |
|   | <b>Punët në realizim e sipër</b>                               | <b>-Gërmimi, tamponizimi dhe ngjeshja e rrugëve</b>  |                     |                     |  |  |
| <b>Vëllimi Financiar</b>                                | <b>Situacionet ( Pagesat e proceduara)</b>                     | <b>Situacioni 1</b>  | <b>Situacioni 2</b> | <b>Situacioni 3</b> |  |  |
|   |  | 50 000.00  |                     |                     |  |  |




| <b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>                               |   | <b>SHIFRA<br/>14</b>   |                     |                     |  |  |
|---|---|--|---------------------|---------------------|--|--|
| <b>Projekti :</b>                                       | Asfaltimi i rrugëve Shkelzen Haradinaj dhe Besim Ndreca(Rilindja) | <b>Vlera e projektit:<br/>117.535.15€</b>  |                     |                     |  |  |
| <b>Investuesi :</b>                                     | Komuna e Prishtinës   | <b>Plani Dinamik :<br/>60 ditë</b>   |                     |                     |  |  |
| <b>Operatori :</b>                                      | <b>SHPK,,Rahovica Commerce"</b>                                   | nr.identifikues:<br>616 20 8609 511  |                     |                     |  |  |
| <b>Menaxheri i projektit :</b>                          | Ibrahim Gërvalla  | <b>Projekti i vitit 2021</b>   |                     |                     |  |  |
| <b>Organi mbikëqyrës :</b>                              | Behgjet Gashi ,Sevdije Drenovci                                   |  |                     |                     |  |  |
| <b>Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë</b> |   |  |                     |                     |  |  |
| <b>Vëllimi fizik</b>                                    | <b>Punët e parapara</b>   | <b>-Rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve, duke përfshirë këtu sinjalizimin</b>   |                     |                     |  |  |
|   | <b>Punët në realizim e sipër</b>                                  | <b>-largimi i shtresës së vjetër të asfaltit te rr. "Besim Ndreca" dhe pergatitja për shtresën e asfaltit të ri.</b> |                     |                     |  |  |
| <b>Vëllimi Financiar</b>                                | <b>Situacionet ( Pagesat e proceduara)</b>                        | <b>Situacioni 1</b>  | <b>Situacioni 2</b> | <b>Situacioni 3</b> |  |  |
|   |   |  |                     |                     |  |  |







| PRISHTINA  |   | RAPORTI MBIKËQYRËS  |                   |                    |                   |                    | SHIFRA<br>15      |
|--|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Projekti :   | Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në lagjen “Pejton” | Vlera e projektit:<br>497,763.29 €  |                   |                    |                   |                    |                   |
| Investuesi :   | Komuna e Prishtinës                                   | Plani dinamik<br>:120 ditë kal.   |                   |                    |                   |                    |                   |
| Operatori :  | ”Gashi Ing” SHPK                                      | Nr 616 19022 511<br>dt.27/09/2019   |                   |                    |                   |                    |                   |
| Menaxheri i projektit :  | Afërdita Hasimi                                       | Projekti i vitit<br>2019  |                   |                    |                   |                    |                   |
| Organi mbikëqyrës :  | Bashkim Statovci, Besim Qelaj, Ramadan Nebihi         |   |                   |                    |                   |                    |                   |
| <b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b> |   |   |                   |                    |                   |                    |                   |
| Vëllimi fizik  | Punët e realizuara                                    |   |                   |                    |                   |                    |                   |
|  | Punët në realizim                                     | Punët kanë përfunduar dhe janë dhenë disa vërejtje ku janë duke u sanuar. |                   |                    |                   |                    |                   |
| Vëllimi financiar  | Situacionet ( Pagesat e proceduara)                   | Situacioni ( I )  | Situacioni ( II ) | Situacioni ( III ) | Situacioni ( IV ) | Situacioni ( V )   | Situacioni ( VI ) |
|  |   | 50,000.0€   | 50,000.0€         | 56,963.8€          | 79,362.2€         | 84,881.1€          | 74,804.7€         |
|  | Situacioni ( VII )                                    | Situacioni ( VIII )   | Situacioni ( IX ) | Situacioni ( X )   | Situacioni ( XI ) | Situacioni ( XII ) |                   |
| Vonesat Shkalla e cilësisë   | Sezoni dimeror  |   |                   |                    |                   |                    |                   |
| Rekomandime, masat për t’u ndërmarrë                                       |   |   |                   |                    |                   |                    |                   |
| Vlerësimi i progresit në projekt   |   |   |                   |                    |                   |                    |                   |

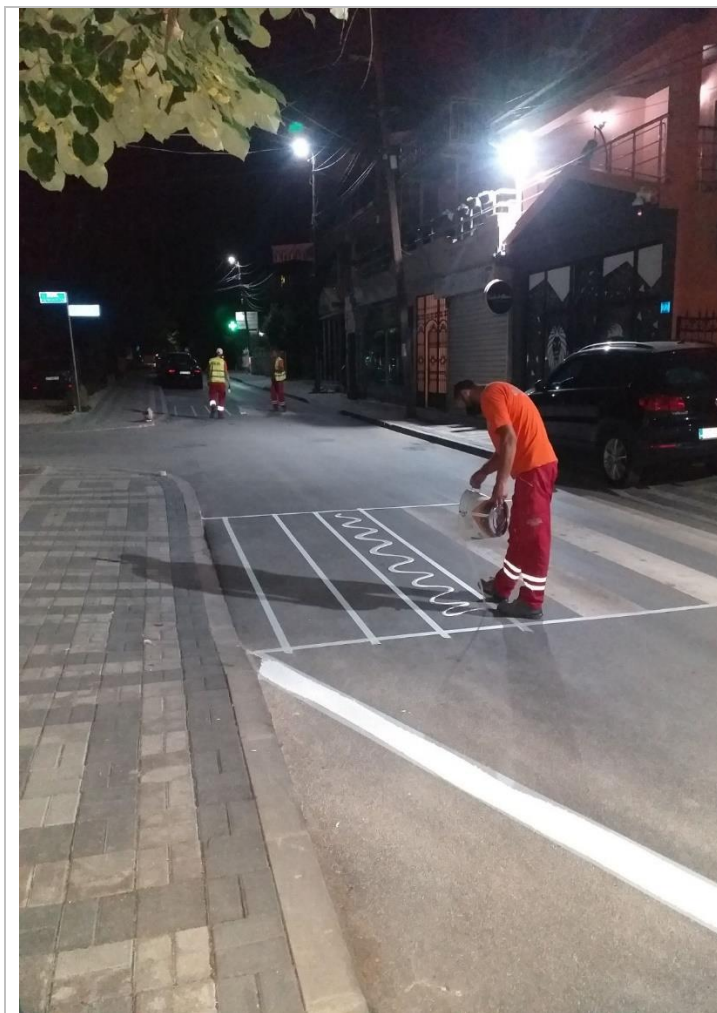



| PRISHTINA  |   | <b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>                          |                     |                    |                   |                   | SHIFRA<br><b>16</b> |
|--|---|--|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Projekti :   | Rregullimi i rrugëve dhe infrastrukturës te trafoja | Vlera e projektit:<br>104,682.60 €                 |                     |                    |                   |                   |                     |
| Investuesi :   | Komuna e Prishtinës                                 | Plani dinamik:<br>60 ditë kalend.                  |                     |                    |                   |                   |                     |
| Operatori :  | ”SetiCommerce” SHPK                                 | Nr 616 20059 521<br>dt.14.09.2020                  |                     |                    |                   |                   |                     |
| Menaxheri i projektit :  | Afërdita Hasimi                                     | Projekti i vitit<br>2020                           |                     |                    |                   |                   |                     |
| Organi mbikëqyrës :  | Sevdije Drenovci, Ramadan Nebihi                    |  |                     |                    |                   |                   |                     |
| <b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b> |   |  |                     |                    |                   |                   |                     |
| Vëllimi fizik  | Punët e realizuara                                  | Perfundimi i trirrugeve                            |                     |                    |                   |                   |                     |
|  | Punët në realizim                                   | Jemi ne fazën e shtrimit te kubzave tek disa rrugë |                     |                    |                   |                   |                     |
| Vëllimi financiar  | Situacionet ( Pagesat e proceduara)                 | Situacioni ( I )                                   | Situacioni ( II )   | Situacioni ( III ) | Situacioni ( IV ) | Situacioni ( V )  | Situacioni ( VI )   |
|  |   | 29,294.89 €  | 50,000.00 €         | 0.0€               | 0.0€              | 0.0€              | 0.0€                |
|  |   | Situacioni ( VII )                                 | Situacioni ( VIII ) | Situacioni ( IX )  | Situacioni ( X )  | Situacioni ( XI ) | Situacioni ( XII )  |
| Vonesat Shkalla e cilësisë   | Probleme pronesore                                  |  |                     |                    |                   |                   |                     |
| Rekomandime masat për tu ndërmarrë   |   |  |                     |                    |                   |                   |                     |
| Vlerësimi i progresit në projekt   |   |  |                     |                    |                   |                   |                     |

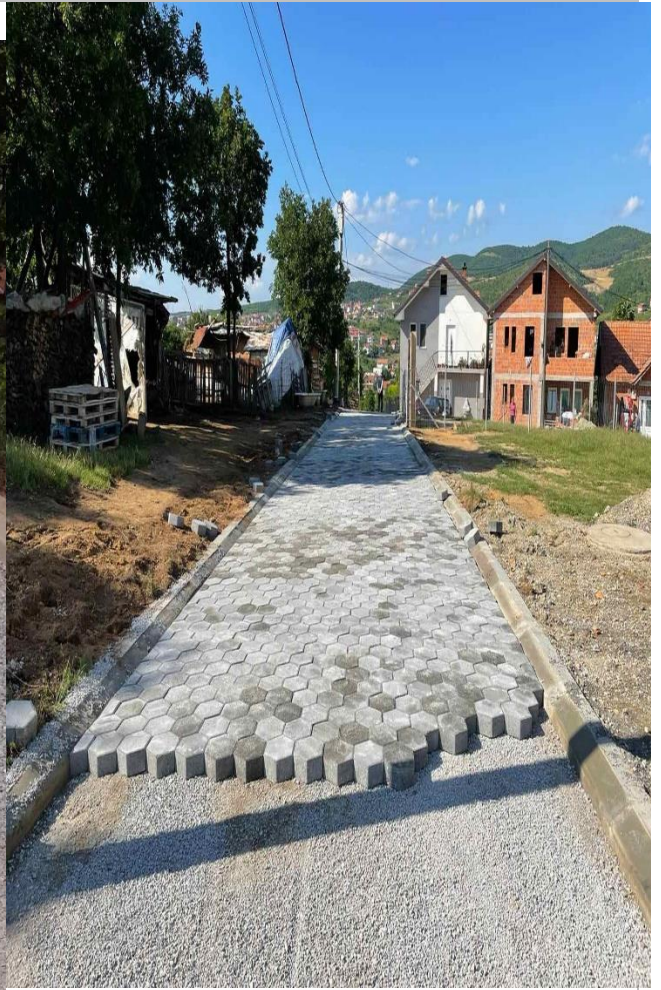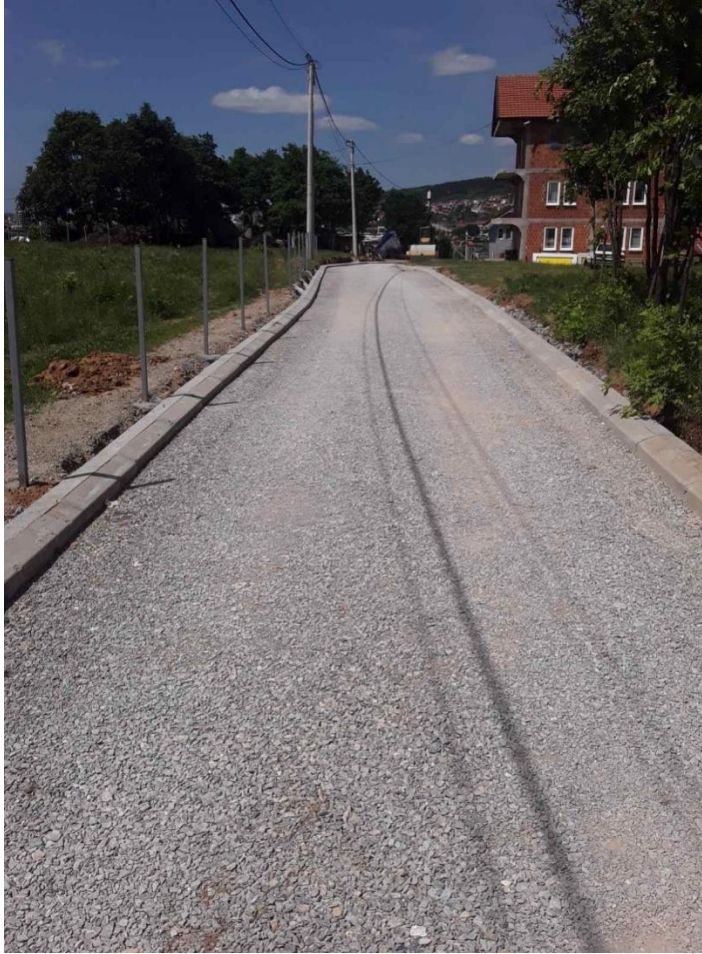

| PRISHTINA  |  | <b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>                            |                     |                    |                   |  | SHIFRA<br><b>17</b> |
|--|--|--|---------------------|--------------------|-------------------|--|---------------------|
| Projekti :   | Punimi i shpimeve dhe elaboratit gjeomekanik |  |                     |                    |                   | Vlera e projektit:<br><b>55,000.00 €</b> |                     |
| Investuesi :   | Komuna e Prishtinës                          |  |                     |                    |                   | Plani dinamik :<br><b>12 muaj</b>        |                     |
| Operatori :  | GEOKOS A & A O,P                             |  |                     |                    |                   | Nr 616 20120221<br>dt.27/11/2020         |                     |
| Menaxheri i projektit :  | Aferdita Hasimi                              |  |                     |                    |                   | Projekti i vitit<br><b>2020</b>          |                     |
| Organi mbikëqyrës :  | Hazir Krasniqi, Aferdita Sopi                |  |                     |                    |                   |  |                     |
| <b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b> |  |  |                     |                    |                   |  |                     |
| Vëllimi fizik  | Punët e realizuara                           | Nje numër i konsiderueshëm i shpimeve ne rrugën "A". |                     |                    |                   |  |                     |
|  | Punët në realizim                            | Perpunimi i elaboratit per matjet ne rrugën A.       |                     |                    |                   |  |                     |
| Vëllimi financiar  | Situacionet ( Pagesat e proceduara)          | Situacioni ( I )                                     | Situacioni ( II )   | Situacioni ( III ) | Situacioni ( IV ) | Situacioni ( V )                         | Situacioni ( VI )   |
|  |  | 0.0€   | 0.0€                | 0.0€               | 0.0€              | 0.0€                                     | 0.0€                |
|  |  | Situacioni ( VII )                                   | Situacioni ( VIII ) | Situacioni ( IX )  | Situacioni ( X )  | Situacioni ( XI )                        | Situacioni ( XII )  |
| Vonesat Shkalla e cilësisë   |  |  |                     |                    |                   |  |                     |
| Rekomandime, masat për t'u ndërmarë  |  |  |                     |                    |                   |  |                     |
| Vlerësimi i progresit në projekt   |  |  |                     |                    |                   |  |                     |




|  <b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b> |  | SHIFRA<br><b>18</b>  |                            |                           |                          |                          |                           |
|---|--|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Projekti :</b>   | Rikonstruktimi i rrugës “Mehmet Kaçurri” (Rruga Model)- Prishtinë  | Vlera e projektit:<br>276,529.00 €   |                            |                           |                          |                          |                           |
| <b>Investuesi :</b>   | Komuna e Prishtinës  | Plani dinamik :<br>240 ditë<br>kalendarike   |                            |                           |                          |                          |                           |
| <b>Operatori :</b>  | “ALBI COMPANY” SH.P.K.   | Nr 616 19215521<br>dt.12.05.2020   |                            |                           |                          |                          |                           |
| <b>Menaxheri i projektit :</b>  | Afërdita Hasimi  | Projekti i vitit<br>2020   |                            |                           |                          |                          |                           |
| <b>Organi mbikëqyrës :</b>  | Alban Morina, Yllka Sylja, Lindita Cervadiku Dibra, Avni Manaj, Agim Halili, Syzana Pllana, Amire Krasniqi |  |                            |                           |                          |                          |                           |
| <b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>                                  |  |  |                            |                           |                          |                          |                           |
| <b>Vëllimi fizik</b>  | <b>Punët e realizuara</b>  | Infrastruktura nëntokësore, demolimi i vitrinave, dyerve dhe dritareve, si dhe montimi i tyre sipas kontratës. |                            |                           |                          |                          |                           |
|   | <b>Punët në realizim</b>   | Vazhdimi i rregullimit të dritareve në hapësira të ndryshme përgjatë rrugës.                                   |                            |                           |                          |                          |                           |
| <b>Vëllimi financiar</b>  | <b>Situacionet ( Pagesat e proceduara)</b>   | <b>Situacioni ( I )</b>  | <b>Situacioni ( II )</b>   | <b>Situacioni ( III )</b> | <b>Situacioni ( IV )</b> | <b>Situacioni ( V )</b>  | <b>Situacioni ( VI )</b>  |
|   |  | 0.0€   | 0.0€                       | 0.0€                      | 0.0€                     | 0.0€                     | 0.0€                      |
|   |  | <b>Situacioni ( VII )</b>  | <b>Situacioni ( VIII )</b> | <b>Situacioni ( IX )</b>  | <b>Situacioni ( X )</b>  | <b>Situacioni ( XI )</b> | <b>Situacioni ( XII )</b> |
|   |  | 0.0€   | 0.0€                       | 0.0€                      | 0.0€                     | 0.0€                     | 0.0€                      |
| <b>Vonesat Shkalla e cilësisë</b>   | Probleme- kërkesa nga banorët  |  |                            |                           |                          |                          |                           |
| <b>Rekomandime, masat për t’u ndërmarrë</b>   | ☞ Rritja e kapacitetit të fuqisë puntore   |  |                            |                           |                          |                          |                           |
| <b>Vlerësimi i progresit në projekt</b>   | ☞  |  |                            |                           |                          |                          |                           |

|  <b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b> |  | SHIFRA<br><b>19</b>                  |                 |                  |                 |                                     |                 |
|---|--|--------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
| Projekti :  | <i>"Ndërtimi i rugës nga Pallati i panairëve deri te rruga "Vëllezërit Fazliu"</i> |                                      |                 |                  |                 | Vlera e projektit:<br>153,430.00 €  |                 |
| Investuesi :  | Komuna e Prishtinës  |                                      |                 |                  |                 | Plani dinamik: 90 ditë              |                 |
| Operatori:  | <b>"Bashkim Meti" SHPK</b><br><b>"Bashkim Mali" SHPK</b>                           |                                      |                 |                  |                 | Nr. 616 20040 511<br>dt. 11.05.2021 |                 |
| Menaxheri i projektit :   | Irfete Zejneli   |                                      |                 |                  |                 | Projekti i vitit<br>2021            |                 |
| Organi mbikëqyrës :   | Zyrije Pllana dhe Behxhet Gashi .  |                                      |                 |                  |                 |                                     |                 |
| <b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>                                  |  |                                      |                 |                  |                 |                                     |                 |
| Vëllimi fizik   | Punët e realizuara   | ● Punimet kanë filluar para tri ditë |                 |                  |                 |                                     |                 |
|   | Punët në realizim  | Është duke u bërë gërmimi i dheut.   |                 |                  |                 |                                     |                 |
| Vëllimi financiar   | Situacionet (Pagesat e proceduara)   | Situacioni (I)                       | Situacioni (II) | Situacioni (III) | Situacioni (IV) | Situacioni (V)                      | Situacioni (VI) |
|   |  |                                      |                 |                  |                 |                                     |                 |
|   |  |                                      |                 |                  |                 |                                     |                 |
|   |  |                                      |                 |                  |                 |                                     |                 |
| Vonesat Shkalla e cilësisë  | ☞  |                                      |                 |                  |                 |                                     |                 |
| Rekomandime masat për tu ndërmarë   | Është rekomanduar operatori ekonomik që të respektohet kontrata.                   |                                      |                 |                  |                 |                                     |                 |
| Vlerësimi i progresit në projekt  | ☞  |                                      |                 |                  |                 |                                     |                 |



|  <b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b> |   | <b>SHIFRA</b><br><b>20</b>   |                            |                     |                   |                                     |                   |
|---|---|--|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Projekti :  | "Ndërtimi I parqeve rekreativo-sportive - renovimi i Kompleksit Qafa"                           |  |                            |                     |                   | Vlera e projektit:<br>883,783.42 €  |                   |
| Investuesi :  | Komuna e Prishtinës   |  |                            |                     |                   | Plani dinamik :<br>210 Ditë         |                   |
| Operatori:  | "Rexha" SHPK  |  |                            |                     |                   | Nr. 616 19110 511<br>dt. 17.09.2019 |                   |
| Menaxheri i projektit :   | Irfete Zejneli  |  |                            |                     |                   | Projekti i vitit<br>2019            |                   |
| Organi mbikëqyrës :   | Bujar Rama , Bashkim Statovci, Behxhet Gashi, Burbuqe Agushi, Ylber Jashari dhe Syzana Pllana . |  |                            |                     |                   |                                     |                   |
| Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara   |   |  |                            |                     |                   |                                     |                   |
| Vëllimi fizik   | Punët e realizuara  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Punimi i pllakave në zonën 1 dhe zonën 3,</li> <li>● Punimi i gardhit në zonën 1 dhe zonën 3 ,</li> </ul> |                            |                     |                   |                                     |                   |
|   | Punët në realizim   | Punimi i pllakave në zonën1 dhe 3 .  |                            |                     |                   |                                     |                   |
| Vëllimi financiar   | Situacionet ( Pagesat e proceduar a)  | Situacioni ( I )   | Situacioni ( II )          | Situacioni ( I II ) | Situacioni ( IV ) | Situacioni ( V )                    | Situacioni ( VI ) |
|   |   | 50,000.00€   | 50,000.00€                 | 50,000.00€          | 50,000.00€        | 100,000.00€                         | 50,000.00€        |
|   |   | Situacioni ( VII )   | Situacioni i punëve shtese |                     |                   |                                     |                   |
|   | 100,000.00€   | 5,460.50€  |                            |                     |                   |                                     |                   |
| Vonesat Shkalla e cilësisë  | ☞ Vonesado tëketëpërshkak se te problemeve ne banoret.  |  |                            |                     |                   |                                     |                   |
| Rekomandime masat për tu ndërmarrë  | Është njoftuar operatori ekonomik që punimet të zhvillohen sipas kontratës.                     |  |                            |                     |                   |                                     |                   |
| Vlerësimi i progresit në projekt  | ☞ Shpresojmë të zgjidhen problemet me banorët për zonën 2 dhe 4 .                               |  |                            |                     |                   |                                     |                   |

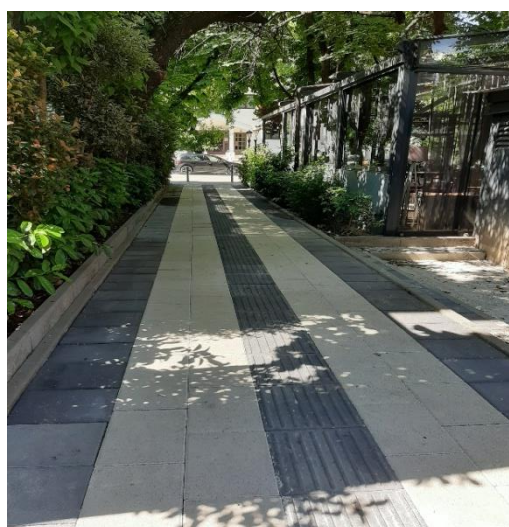

**Drejtori :**  
**Gëzim Mehmeti**

Prishtinë, qershor 2021
