



Raporti i vitit 2018 Tetor, 01.-31.10.2018

1. Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave


Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave, gjatë muajit tetor 2018, ka kryer këto aktivitete: kërkesat për hartimin e detyrave projektuese dhe identifikimin e nevojave, shqyrtimi i kërkesave të banorëve të bashkësive lokale dhe inkorporimi i tyre në planet e Komunës, njoftimi me kohë i kompanive publike dhe subjekteve relevante, me qëllim të koordinimit të punëve, incizimi i gjendjes ekzistuese të infrastrukturës në qytetin e Prishtinës, si dhe kompletimi i dokumentacionit teknik për procedimin e tyre në organet kompetente, mbikëqyrja e realizimit të projekteve konform marrëveshjes etj.

1.1. Shqyrtimi i kërkesave

Gjatë muajit tetor, Drejtoria ka proceduar 163 kërkesa të ndryshme të bashkësive lokale dhe banorëve: për ndërtimin e rrugëve, trotuareve dhe kanalizimeve, kërkesa për rregullimin e rrugëve dhe kanalizimeve, kërkesa nga kompanitë publike - leje për gropim dhe intervenime për sanimin e defekteve të ndryshme, kërkesa nga kompanitë për formime të komisioneve për kontrollimin e punëve, kërkesa të natyrave të ndryshme rreth definimit të zgjidhjes në terren etj. Nga numri i përgjithshëm prej 163 kërkesave të pranuar, 80 janë zgjidhur.


1.2. Dërgimi i kërkesave për hartimin e detyrave projektuese dhe identifikimin e nevojave

Duke marrë për bazë Ligjin mbi planifikimin hapësinorë, Ligjin mbi ndërtimin e objekteve investive, si dhe Ligjin për projektim, e në veçanti planet rregulluese, janë dërguar kërkesat për hartimin e detyrave projektuese për këto rrugë në zonat urbane dhe rurale.



1.3. Raportimi i menaxherëve të projekteve infrastrukturore


Drejtoria	Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave
Sektori	Menaxhimi i kontratave (Ndërtimi i ulët)
Drejtori	Gëzim Mehmeti
Raportoi	Dukagjin Buçaj, idn., u.d. i shefit të Sektorit
Kontrolloi – Përpunoi	Muhamed Emra, idn., zyrtar i lartë për ndërtim urban
Periudha raportuese	01- 31.10.2018, muaji tetor
Menaxhëret e projekteve	Ibrahim Gervalla Muhamed Emra Afërdita Hasimi Zyhrie Pllana Krenar Xhaferi Fevzi Jetullahu Irfete Zejneli Fatmir Uka Halil Fejziu Imer Mavriqi Suzana Pllana Merita Mihovci Qazim Bajrami
Organi mbikëqyrës	Azem Buzuku Aferdita Sopi Behxhet Gashi Ramadan Nebiu Hazir Krasniqi Amire Krasniqi

 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 01					
Projekti :	Ndërtimi i disa rrugëve me kubze betoni në Hajvali	Vlera e projektit: 359.351,97 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik 90 ditë					
Operatori :	NTP "REXHA COM"	Nr.616 17 060 521 dt.08,09,2017					
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra, idn	Projekti i vitit : 2017					
Organi mbikëqyrës:	Suzana Pllana, idh., Hazir Krasniqi, tek. i gjeod.						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën "Gostivari"; Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën "kuka"; Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën "krahu 1"; Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën "krahu 2"; Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën "Sherif Vitia"; Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën "krahu 1 (te xhamia)"; Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën "krahu 2" (te xhamia)"; Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën "krahu 3" (te xhamia)". 					
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën "Reshat Bardhi" (lagjja "Ulpiana e Re")"; Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën "Rexhep Plaki" (lagjja "Ulpiana e Re")". 					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50.000.0	50.000.0	50.000.0	50.000.0	50.000.0	50.000.0
Vonesat Shkalla e cilësisë	--			Mesatar			
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë	<p>Punimet jane duke u zhvilluar sipas planit dinamik, mirëpo do të kemi vonesa të ekzekutimit të punimeve për shkakë se, së pari, do të presim realizmin e kontratës "Ndërtimi i kolektorit në Hajvali, lagjja Vitiali" dhe "Ndërtimi i rrjeteve të kanalizimeve fekale në lagjen "Ulpiane e Re" në Hajvali " nga operatori tjetër, pastaj të vazhdojmë ekzekutimin e rrugëve të parapara me kontratë.</p> <p>Kemi ngecje të punimeve nga banorët e fshatit Hajvali, për shkakë se një pjesë e rrugicave nëpër lagje nuk janë përfshirë në këtë projekt dhe domosdoshmerisht këmbngulin që të ndërtohen edhe rrugicat e tyre.</p>						


Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik





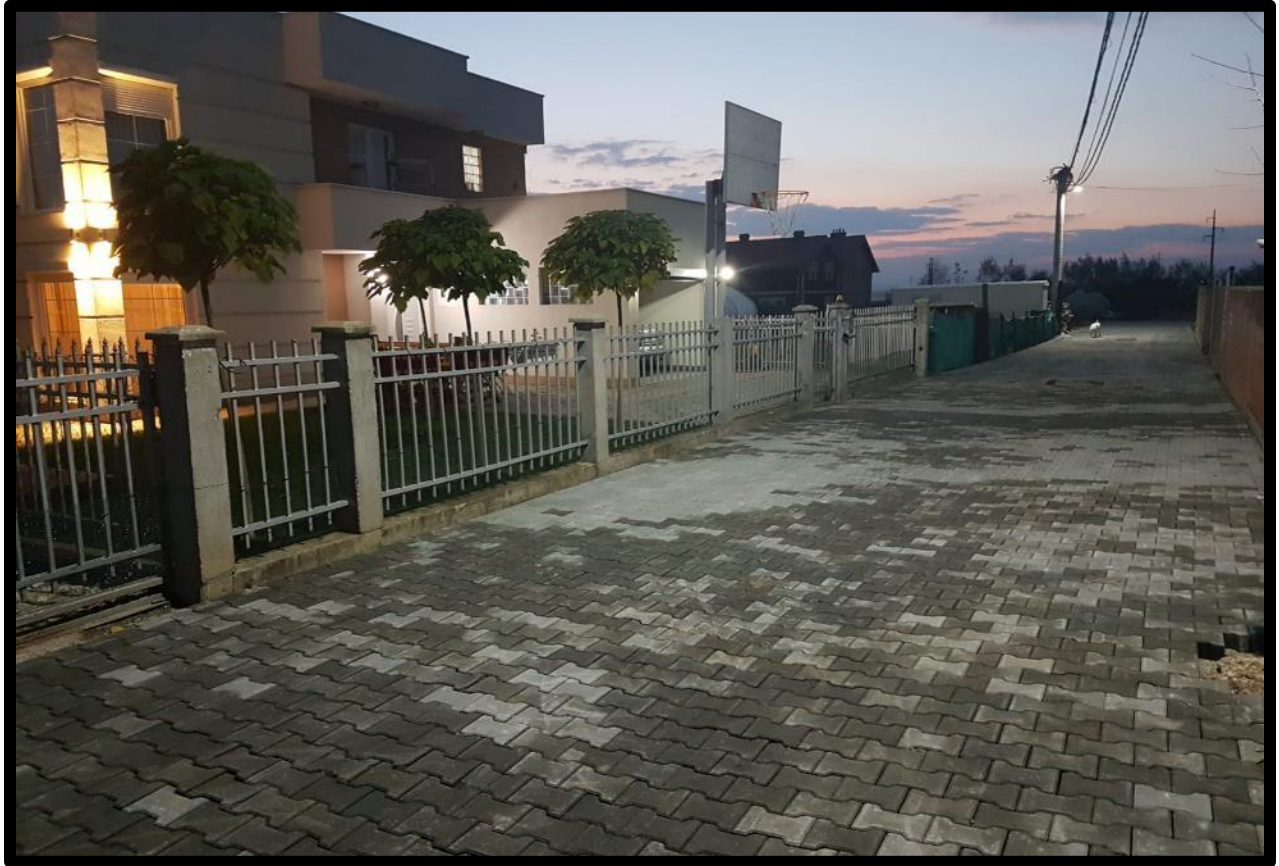

PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 02
Projekti :	Ndërtimi i disa rrugëve dhe i kanalizimit fekal dhe atmosferik në krahun e djathtë dhe të majtë të rrugës “Bajram Bahtiri” në Prishtinë	Vlera e projektit: 286.655,32 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik 150 ditë.					
Operatori :	SHPK “Gerlica Company”	Nr.616 17 087 521 dt. 02.10.2017					
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra, idn.	Projekti i vitit : 2017					
Organi mbikëqyrës:	Zyhrije Pllana, ida., Azem Buzuku, tek.ndërt.						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	- Vendosija e skajoreve betonarme në krahun e majtë të rrugës “Bajram Bahtiri”;					
	Punët në realizim	- Vendosija e skajoreve betonarme në krahun e rrugës “Bekim Mani”.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50.000.0	50.000.0	50.000.0	50.000.0	50.000.0	
Vonesat Shkalla e cilësisë		--			Mesatar		
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt		Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik					

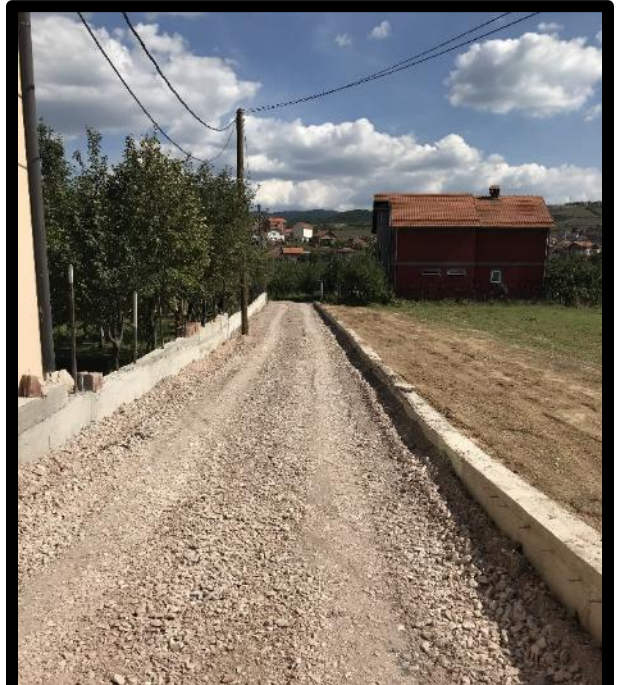
















PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS				SHIFRA 03	
Projekti :	<i>Rindërtimi, sanimi dhe zgjerimi i disa rrugëve sekondare në territorin e komunës së Prishtinës</i>					Vlera e projektit: 247,853.52 €	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik 12 muaj	
Operatori :	NTP "Bashkimi" dhe NPSH "Bageri"					Nr.616 17 132 521 dt.11,01,2018	
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra, idn.					Projekti i vitit : 2018	
Organi mbikëqyrës:	Halil Fejziu, idn., Afërdita Sopi, tek. i gjeod.						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> - Gërmimi i trupit të rrugës në fshatin Marec, lagjja "Vrajollët"; - Mbushja e trupit të rrugës me material rrethanor guror; - Gërmimi i trupit të rrugës në fshatin Marec, lagja "Kllokoqët" - Mbushja e trupit të rrugës me material rrethanor guror. 					
	Punët në realizim						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		11,198.40	20,316.60	50,000.0	18,400.0	71,850.0	
Vonesat Shkalla e cilësisë		-			Mesatar		
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë		<ul style="list-style-type: none"> - Kemi kërkuar nga operatori që të rritë kapacitetin dinamik të punimeve, gjegjësisht hapje në shumë fronte të punishteve në terren. 					
Vlerësimi i progresit në projekt		<ul style="list-style-type: none"> - Kemi kërkuar nga operatori që të rritë kapacitetin dinamik të punimeve, gjegjësisht hapje në shumë fronte të punishteve në terren. 					










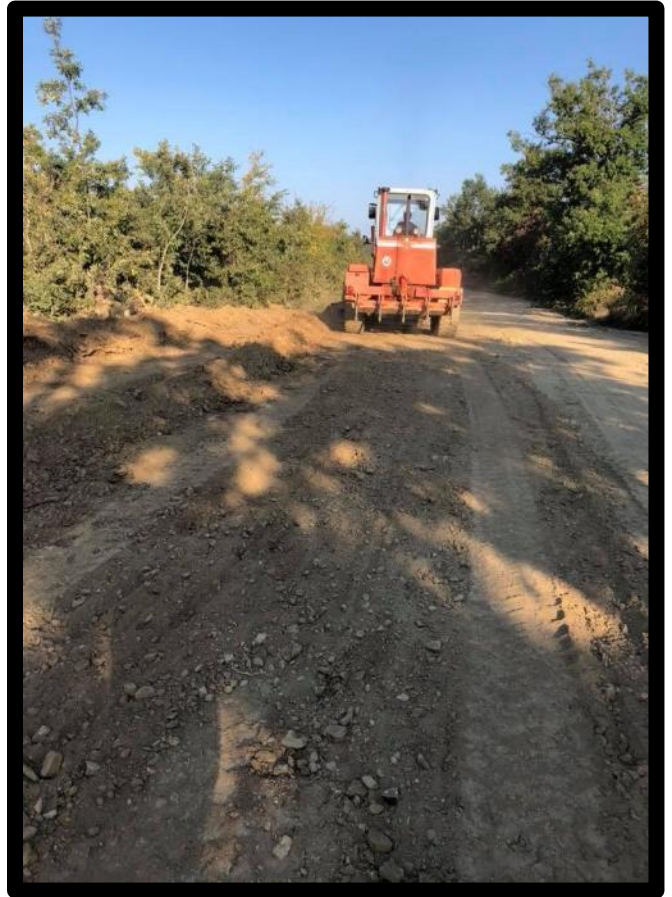

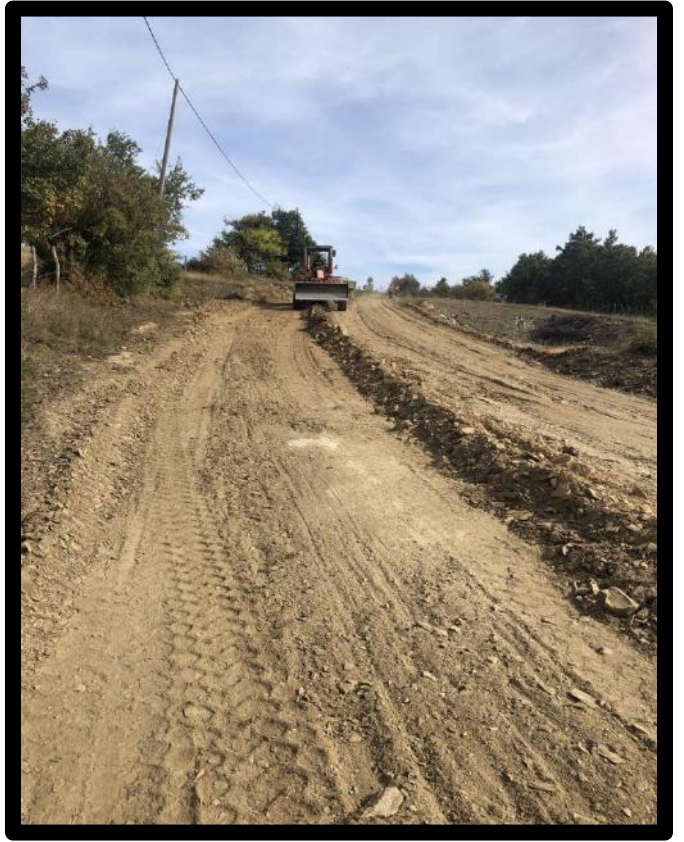















































PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 04
Projekti :	Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik në rrugët "Fehmi Agani" dhe "Hajdar Dushi", si dhe ujësjellësit në rrugën "Fehmi Agani"					Vlera e projektit: 348.679,20 €	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik : 60 ditë	
Operatori :	"NOTI BETON" SHPK					Nr i prokurimit: 6161794521 dt.12.12.2017	
Menaxheri i projektit :	Syzana Pllana					Projekti i vitit 2018	
Organi mbikëqyrës :	Aferdita Sopi, Behxhet Gashi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nenstokesore: Trasimi gjeodezik; Demolimi dhe pastrimi i terrenit; Gërmimi i kanalit me makineri; Gërmimi i kanalit me dorë; Planifikimi i fundit të kanalit; Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorrit të imët (0-16) mm, (0-32), (0-63) mm; Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me material gurorë(0-100)mm; Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø250,315,400,500, 630, 800mm; Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit; Furnizimi, transporti dhe vendosja e tubave për puseta, konuseve, shkalleve, kapakëve; Furnizimi transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit: t=15cm, (0-31, 5 mm, Mv>100Mn/m2) dhe shtreses së Bituzhavorit: BZH 22 me trashësi t=8cm; Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltbetonit nga materiali i njëtrajtshëm AB11, me trashësi t=4,0cm; Testimi i rrjetit të kanalizimit fekal dhe atmosferik; Furnizimi, transporti dhe vendosja e skajorëve standard 18/24, C-40/50, M100; Testimi dhe dezinfektimi i gypit të ujësjellësit.					
	Punët në realizim	Furnizimi transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit: t=15cm, (0-31, 5 mm, Mv>100Mn/m2) dhe shtreses së Bituzhavorit: BZH 22 me trashësi t=8cm; Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltbetonit nga materiali i njëtrajtshëm AB11 me trashësi t=4,0cm.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI) Përfundimtar
		50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	75,000.00€	50,000.00€	63,926.02€
Vonesat, Shkalla e cilësisë	--			Mesatar			
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë	<input checked="" type="checkbox"/> Është obliguar operatori nga organi mbikëqyrës, që të rritë kapacitetin dinamik të punimeve, si dhe të bëjë sigurimin e vendpunishtes, të bëjë sigurimin e kanalit, si dhe t'i përmbahet projektit. Me kërkesë të kryetarit dhe drejtorit dhe me pëlqim të operatorit ekonomik, është zëvendësuar pozicioni i pllakave të betonit me dy shtresa asfalt, duke qëndruar brenda vlerës së kontratës.						
Vlerësimi i progresit në projekt	<input checked="" type="checkbox"/> Kemi hasur në pengesa të shumta gjatë realizimit të projektit në rrugët "Fehmi Agani" dhe "Hajdar Dushi".						

--	--



PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 05
Projekti :	Ndërtimi i kanalizimeve fekale dhe atmosferike në territorin e komunës së Prishtinës	Vlera e projektit: 355,555.55 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë					
Operatori :	"NOTI BETON" SHPK	Nr i prokurimit: 61617100521 dt. 30.11.2017					
Menaxheri i projektit :	Syzana Pllana	Projekti i vitit 2018					
Organi mbikëqyrës :	Aferdita Sopi, Behxhet Gashi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Kontrollimi dhe evidentimi I instalimeve nëntokësorë, Trasimi gjeodezik, Demolimi dhe pastrimi I terrenit, Gërmimi I kanalit me makineri, Gërmimi I kanalit me dore Planifikimi I fundit të kanalit, Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material rrethor jo koherent. Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø 250mm Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit, Furnizimi, transporti dhe vendosja e tubave për puseta, konuseve, shkalleve, kapakëve.					
	Punët në realizim	Gërmimi I kanalit me makineri, Gërmimi I kanalit me dore Planifikimi I fundit të kanalit, Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material rrethor jo koherent. Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø 250,315,800mm					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50.,000.00	50,000.00€	50,000.00€€	50,000.00€	0.0€	0.0€
Vonesat Shkalla e cilësisë		--			Mesatar		
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë	☞ Është obliguar operatori nga organi mbikëqyrës, që të rritë kapacitetin dinamik të punimeve, si dhe të bëjë sigurimin e vendpunishtes, të bëjë sigurimin e kanalit, si dhe t'i përmbahet projektit.						
Vlerësimi i progresit në projekt	☞ Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik						

*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve



PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS				SHIFRA 06	
Projekti :	Ndërtimi i kanalizimit fekal tek "Rezonanca", ndërtimi i kanalizimit fekal, kanalizimit atmosferik, si dhe ujësjellësit në rrugët "Bedri Pejani" dhe "Andrea Gropa", ndërtimi i kanalizimit fekal dhe kanalizimit atmosferik në rrugët "Meto Bajraktari" dhe "Qajupi".				Vlera e projektit: 191,687.46 €		
Investuesi :	Komuna e Prishtinës				Plani dinamik : 90 ditë		
Operatori :	NNTPP "GASHI ING" SHPK				Nr i prokurimit: 616-17-4307-5-2-1 dt. 09.11.2017		
Menaxheri i projektit :	Syzana Pllana				Projekti i vitit 2018		
Organi mbikëqyrës :	Aferdita Sopi, Azem Buzuku						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësorë, Trasimi gjeodezik, Demolimi dhe pastrimi i terrenit, Gërmimi i kanalit me makineri, Gërmimi i kanalit me dore Planifikimi i fundit të kanalit, Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material rrethor jo koherent rrethorë d 0-100mm. Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø 400 mm Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit, Furnizimi, transporti dhe vendosja e tubave për puseta, konuseve, shkalleve, kapakëve. Furnizimi dhe asfaltimi i rrugëve, Kthimi i kalldermit,					
	Punët në realizim	Gërmimi i kanalit me makineri, Gërmimi i kanalit me dore Planifikimi i fundit të kanalit, Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material rrethor jo koherent. Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø 250-500-400mm					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50,000€	50,000€	50.000€	0.0€	0.0€	0.0€
Vonesat Shkalla e cilësisë		--			Mesatar		
Rekomandime, masat për t'u ndërmarë		<input checked="" type="checkbox"/> Për shkak të rrezikshmërisë nga shembja, projekti tek "Rezonanca" është ndërprerë, për të vazhduar në rrugët "Meto Bajraktari", "Qajupi", si dhe "Bedri Pejani" dhe "Andrea Gropa", ku tek rruga "Qajupi" e kemi ndërprerë projektin, për shkak se kuota fundore e projektuar është 4.30 m, ndërsa gjendja faktike në terren 5.30, si dhe shkarkimi me rënie të kundërt.					
Vlerësimi i progresit në projekt		<input checked="" type="checkbox"/> Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik.					

*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve



PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS						SHIFRA 06	
Projekti :	Ndërtimi i rrugëve dhe kanalizimi fekal te rruga "Ulqini"						Vlera e projektit: 82,625.13 €		
Investuesi :	Komuna e Prishtinës						Plani dinamik : 120 ditë		
Operatori :	NNTP "Gashi ING"						Nr 616 17 144 521 dt. 26.01.2018		
Menaxheri i projektit :	Afërdita Hasimi						Projekti i vitit 2018		
Organi mbikëqyrës :	Syzana Pllana, Ramadan Nebihi								
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara									
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Zyrtarisht kanë filluar punimet më 19.03.2018.							
	Punët në realizim	Jemi në fazën përfundimtare të kontratës, duke bërë vendosjen e pahive elastike dhe sinjalizimin vertikal.							
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni Aneks Kontrate (I)	Situacioni Kontrate (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)		
		8,262.51€	50,000.00€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€		
	Situacioni (VI)	Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)			
Vonesat Shkalla e cilësisë	Brenda planit dinamik				Mesatar				
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë									
Vlerësimi i progresit në projekt									

*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve

PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 07
Projekti :	Ndërtimi i disa rrugëve në fshatin Trudë	Vlera e projektit: 375,501.30 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë					
Operatori :	OE "Pro & Co Group" SHPK	Nr 616 17 142 521 dt. 27.02.2018					
Menaxheri i projektit :	Afërdita Hasimi	Projekti i vitit 2018					
Organi mbikëqyrës :	Krenar Xhaferi, Ramadan Nebihi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Zyrtarisht kane filluar punimet me datë 19.03.2018					
	Punët në realizim	Jemi duke punuar në rrugën " Sanxhaku i Nishit" sipas projektit, ndërsa rrugët me kubëza betoni pothuajse kanë përfunduar.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		150,000.00€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
	Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	Situacioni (XII)	
Vonesat Shkalla e cilësisë	--			Mesatar			
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt							

*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve

PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 08
Projekti :	Rikonstruktimi i rrugës "Eqrem Çabej", nga udhëkryqi i Katedrales deri tek udhëkryqi i Mensës së Studentëve, si dhe rikonstruktimi i rrugëve "Shkodra", "Rasim Këçina" dhe "Fan Noli" në lagjen "Taslixhe"					Vlera e projektit: 160,981.01 €	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik : 90 ditë	
Operatori :	OE "Papenburg&Adriani Company" SHPK					Nr 616 18 071 521 dt.14.09.2018	
Menaxheri i projektit :	Afërdita Hasimi					Projekti i vitit 2018	
Organi mbikëqyrës :	Syzana Pllana, Bujar Rama						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Rregullim trotuari, frezim i rruges, ngritja e pusetave dhe pergaditja e trases per asfaltim					
	Punët në realizim	Jemi duke punuar në rrugën " Eqrem Qabej " sipas projektit.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
		Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	Situacioni (XII)
Vonesat Shkalla e cilësisë	--			Mesatar			
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt							

RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 09					
Projekti :	Ndërtimi i kolektorit betonarme për largimin e ujit atmosferik dhe kanalizimi fekal në rrugën mbi lumin Mat, në lagjen “Kalabria”	Vlera e projektit: 1, 696,063.32€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani Dinamik : 180 ditë					
Operatori :	GO „Jehona”SHPK, NN “Beni Construction” dhe NNP”Arhiko.ing”	nr.identifikues: 616 16 111 511					
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla, idn.	Projekti i vitit 2016					
Organi mbikëqyrës :	Fevzi Jetullahu, Afërdita Sopi						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e parapara	<ul style="list-style-type: none"> - Ndërtimi i kolektorit betonarme, në gjatësi prej 850 m; - Ndërtimi i kanalizimit fekal, në gjatësi prej 2x850 m. 					
	Punimet në realizim-vërejtjet	-Punimet nuk kanë vazhduar, për shkakë të problemeve pronore dhe neglizhencës së punëkryerit					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduar a)	Situacionet e paguara ne 2017	Situacioni shkurt	Situacioni mars	Situacioni	Situacioni	Situacioni
		209.256.70 €					



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 10					
Projekti :	Ndërtimi i stadiumit të futbollit në Hajvali, faza II	Vlera e projektit: 414,828.79 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani Dinamik : 120 ditë					
Operatori :	SHPK "Vizion Capital Partners" dhe SHPK "Conex Group"	nr.identifikues: 616 16 088 521					
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla idn ;	Projekti i vitit 2016					
Organi mbikëqyrës	Zyhrije Pllana, Fevzi Jetullahu, Behgjet Gashi						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	- Punimet e vazhdata, përdhes, kati 1, kati 2.					
	Punët në realizim e sipër	- Punimet janë duke vazhduar në vendosjen e konstrukacionit të mbulesës së tribunave dhe fasadës.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduar a)	Situacionet e paguara 1-4 (2017)	Situacioni 5 (qershor)	Situacioni	Situacioni	Situacioni	Situacioni
		200,000.00€	50,000.00€				





RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 11					
Projekti :	Ndërtimi i rrugës Prishtinë-Sinidoll-Bërnice e Epërme-Bardhosh	Vlera e projektit: 343,167.06€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë					
Operatori :	NNP "Bashkimi"	nr.identifikues: 616 16 120 521					
Menaxheri i projektit :	Zyhrije Pllana	Projekti i vitit 2017					
Organi mbikëqyrës:	Ibrahim Gërvalla, Behgjet Gashi						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e parapara	-Trajtimi dhe asfaltimi i rrugës; -Punimi i kanalizimit atmosferik; -Punimi i trotuarit.					
	Punët në realizim e sipër	-Punimet janë në fazën përfundimtare-vendosja e trotuareve (punimet janë të ndërprera, për shkakë të problemeve pronësore)					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduar a)	Situacionet e paguara ne 2017	Situacioni shkurt	Situacioni prill	Situacioni	Situacioni	Situacioni
		308,000.00 €					



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 12					
Projekti :	Ndërtimi i rrugës “Riqard Holbruk” (krahu 1 e 2)	Vlera e projektit: 470,047.05€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 240 ditë					
Operatori :	SHPK “TOIFOR”	nr.identifikues: 616 17 047 511					
Menaxheri i projektit :	Zyhrije Pllana	Projekti i vitit 2017					
Organi mbikëqyrës:	Ibrahim Gërvalla, Fevzi Jetullahu, Amire Krasniqi						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e parapara	-Trajtimi dhe asfaltimi i rrugës; -Punimi i kanalizimit fekal, atmosferik dhe kabllor; -Ndriçimi.					
	Punët në realizim e sipër	-Punimet janë duke vazhduar, zgjerim dhe tamponizim të trasesë, si dhe rregullimin e trotuarëve dhe stazave të biçiklistëve					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduar a)	Situacionet e paguara me 2017	Situacioni maj	Situacioni qershor	Situacioni tetor	Situacioni	Situacioni
		50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€		







RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 15					
Projekti :	Ndërtimi i rrugës paralele me rrugën “B”	Vlera e projektit: 279,939.59€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 120 ditë					
Operatori :	NN “Beni Construction”	nr.identifikues: 616 15 216 521					
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla, idn.	Projekti i vitit 2015					
Organi mbikëqyrës:	Fevzi Jetullahu, Behgjet Gashi						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	-Vendosja e pikave të trasesë së rrugës, gërmimi i dheut, stabilizimi me material guror, kanalizimi fekal, kanalizimi atmosferik.					
	Punët në realizim e sipër	-Punimet janë ndërprerë përkohësisht, deri në zgjidhjen e kontesteve pronësore.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduar a)	Situacionet e paguara me 2017	Situacioni 2 (qershor)	Situacioni	Situacioni	Situacioni	Situacioni
		50,000.00 €	50,000.00 €				




RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 16					
Projekti :	Ndërtimi i rrugëve në Makoc, lagjja “Balaj” dhe në Grshticë të Epërme, lagjet “Musaj”, “Rexhaj” dhe “Obzovik”	Vlera e projektit: 207,000.00€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 150 ditë					
Operatori :	SHPK “Gerlica Company”	nr.identifikues: 616 17 093 521					
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla	Projekti i vitit 2017					
Organi mbikëqyrës:	Behgjet Gashi, Azem Buzuku						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e parapara	-Trajtimi i rrugicave me kubze betony.					
	Punët në realizim e sipër	-Punimet janë duke vazhduar në lagjen “Obzovik” dhe në Grshticë.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni 1 (prill)	Situacioni 2 (maj)	Situacioni 3 (qershor)	Situacioni	Situacioni	Situacioni
		50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€			




RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 17					
Projekti :	Sanimi i gropave dhe deformimeve të shtresave të asfaltit në rrugët dhe trotualet e komunës së Prishtinës për vitin 2017	Vlera e projektit: 327,550.00€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani Dinamik : 12 muaj					
Operatori :	SHPK "Toifor"	nr.identifikues: 616 17 117 521					
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla, idn.	Projekti i vitit 2017					
Organi mbikëqyrës:	Azem Buzuku, Bexhet Gashi						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	- Sanimi i gropave me asfalt; - Sanimi i rrugëve me kubza; - Furnizimi dhe vendosja e kapakëve të pusetave dhe grilave.					
	Punët në realizim e sipër	- Sanimi i gropave me asfalt; - Sanimi i rrugëve me kubze; - Punimi i shtresave të asfaltit.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacionet e paguara me (2017)	Situacionet (shkurt-prill)	Situacioni (maj - korrik)	Situacioni (shtator)	Situacioni (tetor)	Situacioni
		66.000.00€	73.000.00€	160.000.00€	30.000.00€	25.000.00€	




PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 18
Projekti :	Ndërtimi i rrugës dhe trotuareve në fshatin Drenovc					Vlera e projektit: 367,972.12 €	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik: 150 ditë	
Grupi i operatorëve:	"Erdi Group" SHPK dhe "EL-BAU" SHPK					Nr. 616 17 138 511 dt. 22.02.2018	
Menaxheri i projektit :	Irfete Zejneli					Projekti i vitit 2018	
Organi mbikëqyrës:	Krenar Xhaferi dhe Bujar Rama						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> ● Aksi te Xhafollët, kryerja e punimeve në rrugë; ● Aksi te Xhafollët, kryerja e punimeve në trotuar; ● Aksi A dhe aksi B, kryerja e punimeve në trotuar; ● Aksi 1, aksi 2, aksi 3, aksi 4 dhe aksi 5, kryerja e punimeve në rrugë; ● Aksi majtas, zgjerimi i rrugës; ● Aksi majtas, kryerja e punimeve në trotuar. 					
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> ● Ndërtimi i kanalizimit atmosferik dhe zgjerimi i rrugës në aksin kryesor. 					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	00.00€	00.00€
Vonesat Shkalla e cilësisë	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Vonesa sigurisht se do të ketë për shkak të mangësive të shumta në projekt. 						
Rekomandime masat për tu ndërmarrë	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Është rekomanduar operatori ekonomik, që cilësia e punimeve të jetë konform kontratës dhe paramasës. 						
Vlerësimi i progresit në projekt	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Tash për tash punimet nuk janë duke u zhvilluar, për shkak të problemeve në projekt, për këtë është njoftuar drejtori i DIKMK-së. 						

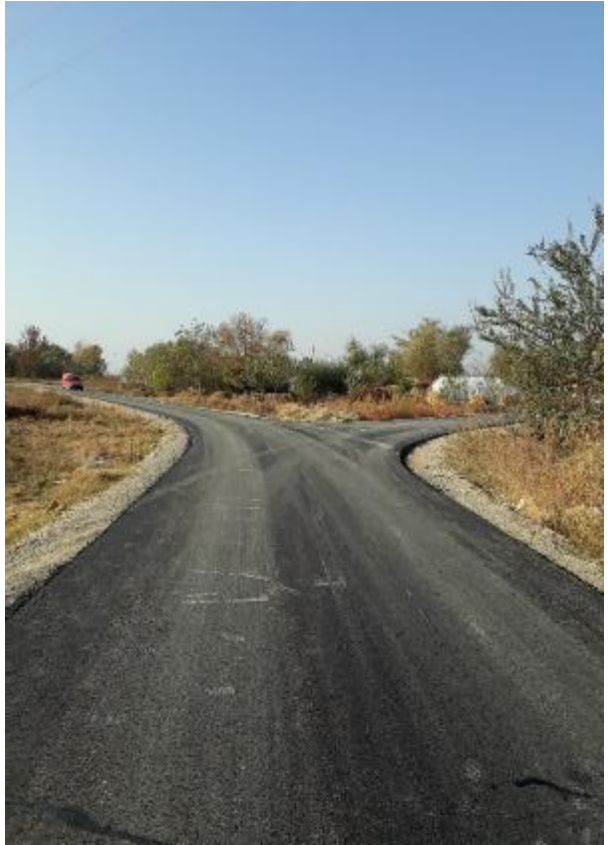



 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 19					
Projekti :	Implementimi i projektit “Bllok pas blloku”, n[lagjen “Bregu i Diellit”						Vlera e projektit: 166,274.11€ Punët shtesë 10,340.00€
Investuesi :	Komuna e Prishtinës						Plani dinamik : 90 ditë
Grupi i operatorëve:	NPN “Vision Projekt”						Nr. 616 16 072 521, dt.19.08.2016
Menaxheri i projektit :	Më herët: Dhurata Ramadani Tani: Irfete Zejneli						Projekti i vitit 2016
Organi mbikëqyrës :	Më herët Enolida Berisha, tani Qazim Bajrami Amire Krasniqi, Mehdi Hoxha						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	● Rreth 80% e punimeve janë realizuar gjatë menaxhimit të Dhurata Ramadani.					
	Punët në realizim	● Gjatë kohës prej kur jam menaxhere e projektit, thajse asgjë nuk është realizuar, vetëm disa sanime.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni I punëve shtesë	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50,002.80€	50,000.02€	10,340.00€	00.00€	00.00€	00.00€
Vonesat Shkalla e cilësisë	☞ Sigurisht se vonesa do të ketë, për shkak të neglizhencës në punë nga operatori ekonomik						
Rekomandime masat për tu ndërmarrë	☞ Është rekomanduar ndërprerja e kontratës në Zyrën e Prokurimit, për shkak të mos zhvillimit të punimeve nga operatori ekonomik, përkundër vërejtjeve të dhëna.						
Vlerësimi i progresit në projekt	☞ Jemi duke përmbyllur kontratën.						

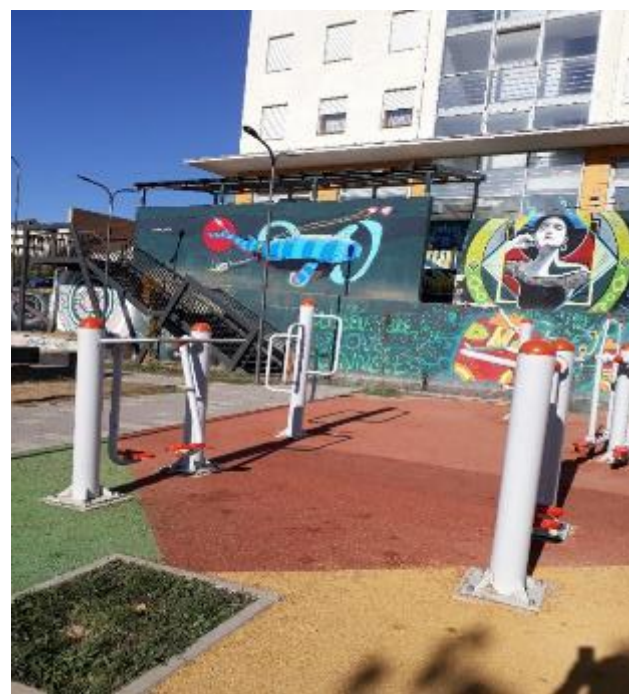

RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 20					
Projekti :	Ndërtimi i rrugës lidhëse me rrugët: “Fatime Sokoli”, “Vehap Shita” dhe “Tahir Zajmi”, me nr. identifikues: 616 1886 521	Vlera e Kontratës: 186,721.76 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 60 ditë					
Operatori :	NNTPP "Gashi Ing" Suharekë	Inspektimi: Vizita në punishtë ka pasur shumë shpesh.					
Menaxher	Imer Mavriqi, idn.	Projekti i vitit /2018					
Mbikëqyrja:	Krenar Xhaferi, ing. i hidros.						
	Amira Krasniqi, ing. e elektros.						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Punimet kanë filluar në shtator të vitit 2018					
	Punët në realizim	- Punimet janë duke u zhvillue sipas kontratës.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
						€	
Vonesat Shkalla e cilësisë sjell		Punimet janë duke u zhvillue sipas dinamikës					
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë		Punimet janë duke vazhdue, kurse situacionë-pagesë nuk ka pasë, realizimet janë duke u zhvillue sipas planit dinamik, ka pasur disa pengesa të vogëla, por janë eliminuar. Rekomandimet e mia janë që të përshpejtohen punimet, pasi që sezoni i dimrit po afrohet.					

RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 21					
Projekti :	Ndërtimi i disa rrugëve në lagjen “Sofalia” - Komuna e Prishtinës” nr. i prokurimit: 616 17 3304 521, dt. 26.09.2017.	Vlera e Kontratës: 279,471.68€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik: 150 ditë					
Operatori :	“Kema Company” SHPK, QMI - Lipjan	Inspektimi: Kanë qenë më së paku 15 vizita gjatë këtij muaji.					
Menaxher	Imer Mavriqi, idn.	Projekti i vitit 2017/2018					
Mbikqyrja:	Syzana Pllana, ing.hidro.						
	Afërdita Sopi, tek.e gjeod.						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve, sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Punimet kanë filluar në tetor 2017 dhe deri në dhjetor-fund të sezonit, është realizuar situacioni me vlerë:100.000€					
	Punët në realizim	- Punimet janë duke u zhvillue sipas kontratës.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		100.000€	50.000€				
Vonesat Shkalla e cilësisë	Punimet janë duke u zhvillue sipas dinamikës.						
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë	Punimet kanë vazhduar gjatë sezonit veror, por duhet të pasur parasysh se ka pasur pengesa të shumta në realizimin e këtij projekti, dhe projekti është krejtësishtë nga përfundimi, pagesa-situacion nuk ka pasur në këtë muaj.						

PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 22	
Projekti :	Revitalizim i shkallëve dhe ndërtimi i mbikalimit, në lagjen “Arbëria”	Vlera e projektit: 463 262.41 €						
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 120 ditë						
Operatori :	“NBT-ING”, SHPK	Nr.616-17-4891-511, dt. 05.02.2018						
Menaxheri i projektit :	Merita Mihovci	Projekti i vitit 2018						
Organi mbikëqyrës :	Fevzi Jetullahu, Hazir Krasniqi, Jeton Zherka, Azem Buzuku							
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> • Punët përgaditore; • Punët e gurit, pjesërisht; • Punët metalike, pjesërisht; • Kanalizimi atmosferik dhe rrjeti i furnizimit me ujë për ujitje për projektin e shkallëve dhe mbikalimit; • Rrjeti i ujësjellësit dhe sistemi i ujitjes; • Punët e ndërtimit të rezervuarit 1 dhe 2; • Punët e elektrikës, pjesërisht. 						
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> • Vazhdim i punëve, “Mveshja e shkallëve me pllaka guri”; • Vazhdimi i punimeve në këndin e lodrave; • Presim montimin e parrakeve në pjesët e punuara nga pllakat e gurëve • Vazhdim i punëve elektrike; • Vazhdim i punëve të instalimeve të ujësjellësit dhe kanalizimit; • Punët e vegjetacionit. 						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)		
		50 000.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	.0€
Vonesat Shkalla e cilësisë	<p>Mund të konkludojmë se do të kemi vonesa në punime:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si pasojë e rezultateve të mostrave të pllakave të gurit; - Vonesa e atesteve të punëve metalike; - Vonesa e atesteve për këndin e lodrave; - Plotësim ndryshim i Vendimit, nr. 05.nr. 351/01-0042989/18, dt. 18.04.2018. <p>Punëkryesi ka munguar 18 ditë në punishte me tërë stafin e tij, ku edhe është njoftuar DIKMK dhe Drejtoria e Prokurimit.</p>							
Rekomandime masat për tu ndërmarrë	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Është rekomanduar operatori ekonomik, që cilësia e punimeve të jetë komfor kontratës dhe specifikimeve teknike; ☞ Është obliguar operatori nga organi mbikëqyrës, që ta rrisë kapacitetin dinamik të punimeve, si dhe të bëjë sigurimin e punishtes; ☞ Duhet të rritet fuqia punëtore dhe mekanizimi i nevojshëm për të përfunduar projektin; ☞ Sjellja e atesteve për punët metalike, për këndin e lodrave dhe pllakat e gurit. 							
Vlerësimi i progresit në projekt	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Punime nuk janë duke u zhvilluar; ☞ Presim sjelljen e atesteve për materialet të cilat kanë me u përdorur në pozicionin e shkallëve, këndin e lodrave dhe shkallëve. 							

Foto 1.



Foto 2, 3 & 4





RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 23					
Projekti :	Ndërtimi i urave në pjesën perëndimore të Unazës qendrore	Vlera e projektit: 1 969 163.08 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik: 180 ditë					
Operatori :	OE "REXHA" SHPK, Prishtinë	Nr.616 15 236 511.					
Menaxheri i projektit : Organi mbikëqyrës:	Halil Fezriu idn. Afërdita Sopi, Imer Mavriqi, Behxhet Gashi.	Projekti i vitit : 2016					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	-Ura e parë 74 m', është betonuar deri te shtylla e fundit.					
	Punët në realizim	-Është në përfundim armirimi i pjesës së parë të urës 194m'; - Punimet nuk mund të vazhdojnë sipas dinamikës së kontratës, për shkak të mos dislokimit të hekurudhave, për të cilën çështje është lajmëruar edhe drejtori dhe kryetari i Komunës.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I-VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	Situacioni (XII)	Situacioni ()
		406 976.61€	50 000.0€	50 000.0€	50 000.0€	50 000.0€	0.0€
Vonesat Shkalla e cilësisë		10 Ditë			Mesatar		
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë		- Armimi i urës 194 m', të bëhet sipas projektit dhe po presim përgjigje nga Prokurimi për rrënimet e paparapara të cilat nuk kanë çmime.					
Vlerësimi i progresit në projekt		- Ura 74 m', është duke u përfunduar mbushja, ashtu që të përgatitet për betonim, izolim dhe asfaltim.					







RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 24					
Projekti :	Ndërtimi i infrastrukturës në disa rrugë të fshatrave Sinidoll, Bardhosh, Bërnice dhe lagjja “Kodra e Trimave” në Prishtinë.	Vlera e projektit: 283 470.50 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik: 90 ditë					
Operatori :	OE, NNTPP “Gashi Ing” nga Suhareka.	Nr. 616 17 106 521.					
Menaxheri i projektit : Organi mbikëqyrës:	Halil Fejziu, idn. Afërdita Sopi, Azem Buzuku.	Projekti i vitit : 2017					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	- Shënimi i trasesë, mobilizimi i ndërmarjes; - Gërmimi i trupit të disa rrugëve në tërë gjatësin e trasesë; - Mbushja e trupit të rrugës me material mbushës.					
	Punët në realizim	-Përfundimi i punimeve sipas kontratës.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50 000.0€	50.000€	50 000.0€	50 000.0€	50 000.0€	0.0€
Vonesat Shkalla e cilësisë	10 Ditë			Mesatar			
Rekomandime, masat për t’u ndërmarrë	-Përfundimi i punimeve sipas kontratës.						
Vlerësimi i progresit në projekt	- Projekti është duke u realizuar sipas planit dinamik.						



RAPORTI MBIKËQYRËS						SHIFRA 25	
Projekti :	<i>Ndërtimi i rrugëve “Evlja Qelebiu”, “Luan Qelaj” dhe “Halil Alidemaj”</i>					Vlera e projektit: 122 234.10 €	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik : 90 ditë	
Operatori :	<i>OE, NNTPP “Gashi Ing” nga Suhareka.</i>					Nr.616 18 56 521	
Menaxheri i projektit : Organi mbikqyrës:	Halil Fejziu, idn. Fevzi Jtullahu, idh., Jeton Zherka, ida.					Projekti i vitit : 2018	
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	- Shënimi i trasesë, mobilizimi i ndërmarjes; - Gërmimi i trupit të rrugëve në tërë gjatësinë e trasesë; - Mbushja e trupit të rrugës me material mbushës .					
	Punët në realizim	Punimi i kanalizimit në rrugën “Halil Alidema” dhe ujsjellësit në rrugën “Evlja Qelebiu”.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	
		40 000.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	
Vonesat Shkalla e cilësisë	10 Ditë			Mesatar			
Rekomandime, masat për t’u ndërmarrë	- Punimet duhet të kryhen sipas kontratës dhe projektit.						
Vlerësimi i progresit në projekt	- Projekti është duke u realizuar sipas planit dinamik.						



 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 26					
	<i>Ndërtimi i rrugëve në brendësi të fshatit Slivovë</i>	Vlera e projektit: 99,385.36 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 60 ditë					
Operatori :	<i>NTP "BASHKIMI" Koliq - Prishtinë</i>	616 17 146 521, dt.12.02.2018					
Menaxheri i projektit :	Qazim Bajrami nga DIKMK	Projekti i vitit : 2018					
Organi mbikëqyrës :	Bujar Rama, Ramadan Nebihi nga DIKMK						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara						
	Punët në realizim						
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni I	Situacioni II	Situacioni III	Situacioni IV	Situacioni V	Situacioni VI
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë		<i>Pas analizimit të projektit, kam vërejtur se rruga e projektuar kalon nëpër pronë private. Kam njoftuar B.Lokale që të kontaktojnë pronarët e parcelave dhe të deklarojnë me shkrim nëse janë të gatshëm që pa kompenzim të lirojnë pronat, në mënyrë që të përfundohen punimet sipas projektit. Poashtu, edhe kushtet atmosferike tash për tash ndikojnë në fillimin e punimeve dhe për këto arsye nuk mund të parashikojmë datën e fillimit të punimeve pa u zgjedhur problemet pronësore.</i>					
Vlerësimi i progresit në projekt		Nuk kanë filluar punimet.					

 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 27					
Projekti :	Ndërtimi i rrugëve në lagjet “Myrtaj”, “Bekaj”, “Bahtirovit” dhe “Nezirovit” në fshatin Busi	Vlera e projektit: 347,880.30 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë					
Operatori :	KNPSH “PAPENGURG” “ADRIANI COMPANY” SHPK	<i>616 17 4861 511, dt. 22.02.2018</i>					
Menaxheri i projektit :	Qazim Bajrami nga DIKMK	Projekti i vitit : 2017					
Organi mbikëqyrës :	Dukagjin Buçaj, Hazir Krasniqi nga DIKMK						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Janë përfunduar të gjitha punët, duke përfshirë edhe asfaltimin.					
	Punët në realizim						
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni I dhe II	Situacioni III	Situacioni IV	Situacioni V	Situacioni VI	Situacioni Perfundim. VII
		100,000.0	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	47,786.76
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt		Projekti ka përfunduar më 19.10.2018, mbrenda afatit.					







Pengesa e shtyllave elektrike, në mes të rrugës ,KEDS-i nuk po e bën zhvendosjen e tyre.











1.3. Projektet infrastrukturore të periudhës 2015-2017, të bartura në vitin 2018

Nr	Emri i projektit	Punëkryesi	Vlera e kontraktuar
1.	Ndërtimi i Bulevardit mbi "Kurriz"	"REXHA"	977,725.51€
2.	Ndërtimi i rrugës paralele me rrugën "B"	"Beni-Construction"	279,939.59€
3	Renovimi i stadiumit të qytetit të Prishtinës	Konzorciumi "Al-Trade" SHPK NP "Izolimi"	3,843,715.42€
4.	Ndërtimi i urave në pjesën perëndimore të Unazës qendrore - Prishtine	"Rexha&Arhiko& Benita" – Prishtinë	1,969,163.08€
5.	Ndërtimi i stadiumit të futbollit në Hajvali, faza II	"Vision Capital" "Conex Group" Fushë Kosovë	414,828.79€
6.	Sanimi i gropave dhe deformimeve të shtresave të asfaltit në rrugët dhe trotualet në komunën e Prishtinës për vitin 2017	"TOIFOR" Prishtinë	327.550.00€
7	Ndërtimi i disa rrugicave me kubze betoni në Shkabaj, "Kalabri" dhe Prishtinë	SHPK "PRO & CO GROUP"	199,837.39€
8	Ndërtimi i rrugës "Riqard Holbruk" (krahu 1 e 2)	SHPK "TOIFOR"	470,047.05€
9	Implementimi i projektit "Bllok pas blloku" në lagjen "Bregu i Diellit"	OE NPN "Vision Projekt" Gjilani	166,274,11€
10	Ndërtimi i kolektorit betonarme dhe kanalizimi fekal në rrugën mbi lumin Prishtina	Grupi i OE., "Noti Beton" SHPK "Ileaa-Gr" "H&B Consulting" me lider "Noti Beton"	2,192,854,6€
11	Ndërtimi i rrugëve dhe kanalizimeve fekale dhe atmosferike në krahun e djathtë dhe të majtë të rrugës "Bajram Bahtiri"	SHPK "Gerlica Company"	286.655.32 €
12	Ndërtimi i disa rrugëve me kubze betoni në Hajvali	Rexha-Com	359.351.97 €
13	Ndërtimi i disa rrugëve në fshatin Barilevë	NNP "SOPI"	324.457,38 €
14	Ndërtimi i kanalizimit Besi – Barilevë - Lebanë – lagja "Kodra e Trimave"	"Kema Company" SHPK NNSH "Dimi Bau"	196.675,20€
15	Ndërtimi i disa rrugëve me kubze betoni në Prugoc	SHPK "Gerlica Company"	329,112.15€
16	Ndërtimi i disa rrugëve me kubze betoni në Veternik, Kalabri dhe Hajvali	NNTPP "Gashi Ing"	325, 648.00 €
17	"Rregullimi i oborrit të objekteve me banim social në Hajvali	"Delta-Ing "	196, 579.09 €
18	Ndërtimi i rrugës Prishtinë-Sinidoll-Bërnice e Epërme-Bardhosh	NNP "Bashkimi"	260,584.00€
19	Ndërtimi i kolektorit betonarme për largimin e ujit atmosferik dhe kanalizimi fekal në rrugën mbi lumin Mat në lagjen "Kalabria"	GO "Jehona" SHPK, NN "Beni Construction" dhe NNP "Arhiko Ing"	1, 696,063.32€
20	Ndërtimi i rrugës paralele me kanalën "Ibër – Lepenc" në fshatin Bërnice e Poshtme	KNPSH "Papenpurg" "Adriani Company" SHPK	347,927.05 €
22	Ndërtimi i rrugës "Barilevë-Besi"	HPK, "Benita Company" SHPK, "Arh Arhiko Ing" "Rexha"	965,582.96 €
23	Ndërtimi i rrugëve në Sofali	"Kema Kompany"	279,471.68€
24	Ndërtimi i rrugëve në Prapashtice, lagjet "Fanaj" dhe "Balaj"	NNTPP "Gashi Ing"	332,797,88€
25	Ndërtimi i rrugëve në Makoc, lagja "Balaj" dhe Grashticë e Epërme, lagjet "Musaj", "Rexhaj" dhe "Obzovik"	SHPK "Gerlica Company"	207,000.00€
26	Ndërtimi i infrastrukturës në disa rrugë të fshatrave Sinidoll, Bardhosh, Bernice dhe lagja "Kodra e Trimave"	NNTPP "Gashi Ing"	283,470.50€
27	Ndërtimi i rrugëve në fshatin Hajkobillë, lagja "Taliri"	NTP "Bashkimi"	70,153,05€
28	Ndërtimi i kanalizimeve fekale të "Rezonanca", ndërtimi i kanalizimit fekal, kanalizimit atmosferik, si dhe ujësjellësit në rrugët "Bedri Pejani", "Andrea Gropa", ndërtimi i kanalizimit fekal dhe kanalizimi atmosferik në rrugën "Meto"	NNTPP "Gashi Ing"	191,687,46€
29	Rregullimi i rrugëve "Reshat Maliq", "27 Nëntori" dhe të Trafoja, si dhe rregullimi i infrastrukturës në rrugët "Aziz Kelmendi", "Malush Kosova" dhe	SHPK "Kema Company"	341,901,86€
30	Ndërtimi i kanalizimeve fekale dhe atmosferike në teritorrin e komunës së Prishtinës	"Noti-Beton"	355,555,55€
31	Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik në rrugët "Fehmi Agani" dhe "Hajdar Dushi", si dhe ndërtimi i ujësjellësit në rrugën "Fehmi Agani"	"Noti-Beton"	348,679,2€

1.4. Projektet infrastrukturore të vitit 2018

Nr	Emri i projektit	Punëkryesi	Vlera e kontraktuar
1.	Rindërtimi, sanimi dhe zgjerimi i disa rrugëve sekondare në territorin e komunës së Prishtinës	NTP "BASHKIMI" NPSH "BAGERI"	247,853.52 €
2.	Sanimi dhe asfaltimi i rrugës "Fehmi Lladrovci"	"Beni-Construction"	59,480.30 €
3	Hartimi i projekteve të infrastrukturës rrugore	"3 D Projekt"	0.192 €, sipas specifikacionit.
4.	Sanimi i kanalizimeve fekale, primare dhe sekondare, në territorin e komunës së Prishtinës	"Famis"	38,015 €
5.	Ndërtimi i kolektorit në Hajvali, lagja "Vitali"	KNTSH "Teuta-M" SHPK	463.262.41€
6.	Ndërtimi i rrugëve dhe kanalizimit fekal te rruga "Ulqini"	"Gashi Ing"	82,625.13 €
7.	Ndërtimi i rrugëve në brendi të fshatit Slivovë	"Bashkimi"	99,385.36 €
8	Rivitalizimi i shkallëve në lagjen "Arbëria"	"NBT-ING" SHPK	463.262.41€
9	Ndërtimi i rrugëve në lagjet "Myrtaj", "Bekaj", "Bahtirovit" dhe "Nezirovit" në fshatin Busi	"Papenburg"	347,880.30 €
10	Ndërtimi i rrugës dhe trotuareve në fshatin Drenovc, LOT 2	"Erdi Group" SHPK	
11	Ndërtimi i disa rrugëve në fshatin Trudë	"Pro & Co Group"	375,501.30 €
12	Ndërtimi i rrugës Rimanishtë - Siqevë	"Nëntë Vëllezërit" SHPK	167,748.21 €

Drejtori :
Gëzim Mehmeti

Prishtinë, tetor 2018

