



Raporti i vitit 2020

Shtator 01-30.09.2020

1. Drejtoria e Shërbimeve Publike Mbrojtje dhe Shpëtim

Drejtoria e Shërbimeve Publike Mbrojtje dhe Shpëtim është e ndarë në katër sektorë;

- *Spektori për Shërbime Publike;*
- *Spektori për Menaxhimin e Mbeturinave dhe Ambientit;*
- *Spektori për Mbrojtje dhe Shpëtim;*
- *Spektori i Transportit dhe Trafikut;*

1.1 Spektori për Shërbime Publike

Drejtoria e Ky sektor merret me menaxhimin dhe shfrytëzimin e hapësirave publike në përputhje me planet komunale, është përgjegjëse për dhënien e lejeve për shfrytëzimin e hapësirave publike, mirëmbajtjen, modernizimin dhe zgjerimin e ndriçimit publik, kujdeset për ashensorët (riparimi dhe rregullimi), kujdeset për mirëmbajtjen dhe funksionimin normal të fontanave dhe monumenteve publike, kryen edhe punë të tjera, në bazë të ligjeve të aplikueshme në kuadër të fushë veprimtarisë së Drejtorisë.

1.2 Spektori për menaxhimin e Mbeturinave dhe Ambientit:

Organizon mirëmbajtjen verore dhe dimërore të rrugëve lokale dhe në vendbanime, pastrimin e rrugëve dhe trotuareve të qytetit, mbikëqyrë realizimin e punëve për rregullimin e gjelbërimit dhe shqyrton kërkesat e ndryshme, kujdeset për menaxhimin, kontrollimin dhe pastrimin e të gjitha shesheve që i përkasin komunës, organizon dhe menaxhon mbledhjen e mbeturinave dhe zhvillon projekte të ndryshme që ndikojnë në përmirësimin e shërbimit të mbledhjes së mbeturinave, zvogëlimin e ndotjes dhe promovimin e uljes së sasisë së mbeturinave, organizon mirëmbajtjen dhe zhblokimin e rrjetit të kanalizimit atmosferik dhe planet për ngrohtoret lokale, organizon sigurimin dhe mirëmbajtjen e hapësirave publike, hapësirave gjelbëruese, parqeve publike dhe varrezave, organizohet për zvogëlimin gradual të ndotjes, degradimit dhe të dëmit mjedisor, si dhe zvogëlimin ose ndalimin e atyre aspekteve ekonomike dhe të aktiviteteve të tjera që përbëjnë rrezik për shëndetin e njeriut dhe mjedisin.

1.3 Spektori për Mbrojtje dhe Shpëtim:

Merret me parandalimin e fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive tjera, vlerëson rrezikshmërinë e tyre brenda territorit të komunës, shpëtimin e njerëzve dhe të mirave materiale, si dhe harton planet operative për mbrojtje nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera siç janë; tërmetet, vërshimet, rrëshqitjet e dheut, ortekët e borës, erëra të fuqishme, breshër, borë me acar, thatësi, zjarre, bllokim të rrugëve, shpërthim i sëmundjeve infektive që ndikojnë në njerëz, kafshë ose bimë si dhe fatkeqësi tjera të shkaktuara nga natyra apo njerëzit.

1.4 Spektori i Transportit dhe Trafikut:

Koordinon aktivitetin dhe jep pëlqimin për veprimtarinë e transportit publik të udhëtarëve dhe mallrave, me kompanitë publike dhe shoqatat e taksistëve individualë dhe

operatorëve juridikë, sipas rregulloreve; cakton linjat dhe rendin e udhëtimit për transportin publik të udhëtarëve, menaxhon sektorin me "merimangë", sipas rregullores, organizon procedurat për ankand publik për automjetet e konfiskuara, që kalojnë afatin e paraparë me ligj, bashkëpunon me policinë për rregullimin e komunikacionit dhe ngritjen e sigurisë në komunikacion, kujdeset për sinjalizimin vertikal dhe horizontal të rrugëve ekzistuese dhe rregullon komunikacionin në qytetin e Prishtinës, vendos për mbylljen e përkohshme të rrugëve për shfrytëzimin e tyre.

2. Shqyrtimi i kërkesave

Gjatë muajit Shtator drejtoria ka proceduar 369 kërkesa të ndryshme: për shfrytëzim të hapësira para lokaleve, reklama, transport, parkingje, siguri në trafik për emergjenca (vërshime, zjarre, shembje të rrugëve, trotuareve, drunjtëve të ndryshëm), për shitje ambulante, për mbeturina. Nga numri i përgjithshëm prej 369 kërkesave të pranuar, 51 janë në proces ndërsa të tjerat janë të përfunduara.

Rastet e intervenimeve Emergjente 23

Lëndet e Komisionit për mbeturina 384

Rastet e pranuar në Qendren e thirrjeve 474

2.1. Dërgimi i kërkesave për Hartimin e detyrave projektuese dhe identifikimi i nevojave

Pergatitja e projekteve paramasave dhe specifikimeve për projektet e planifikuara gjatë kësaj perjudhe.

3.1. Raportimi i Menaxhereve te projekteve dhe Kontratave

Drejtoria	Drejtoria e Shërbimeve Publike Mbrojtje dhe Shëtim
Sektori	Shërbimeve Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim, Menaxhimin e mbeturinave dhe Ambientit, Transportit dhe Trafikut.
Drejtoresha	Medina Braha
Raportori	Habib Qorri, Fatmir Bilalli, Dukagjin Gashi / shef sektori
Kontrollori – Përpunoi	
Periudha raportuese	01- 30.09.2020 muaji Shtator
Menaxhëret e projekteve dhe Organi mbikqyrës	Habib Qorri Dukagjin Gashi Fatmir Bilalli Xhemshit Gashi Bashkim Gashi Enver Kadriu

	Afrim Gashi Xhevdet Ibrahimaj Halil Halili Lumnije Hyseni Xhemile Gashi Sabri Gashi
--	--

		RAPORTI MBIKËQYRËS				SHIFRA 01	
Projekti :	Mobiliera urbane-Furnizimi dhe vendosja pritoreve për autobus të transportit publik të udhëtareve				Vlera e projektit: 292,500.00€		
Investuesi :	Komuna e Prishtinës				Plani dinamik		
Operatori :	“Selmans Network” shpk “BM Group”				Nr.616-19-5545-1-1-1 dt.30.10.2019		
Menaxheri i projektit :	Halil Halili				Projekti i vitit: 2019		
Organi mbikëqyrës :	Habib Qorri Enver Kadru						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Deri me tani janë instaluar 35 konstruksionet të pritoreve sipas lokacionet të kërkuara nga Komuna e Prishtinës					
	Punët në realizim	Janë duke u realizuar bazamentet në lokacionet dhe prodhimin dhe furnizimin me elementet baze të pritores (LCD).					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	
		/	/	/		/	
Vonesat Shkalla e cilësisë	Vonesa janë për shkaqe qe ndryshimeve ne projekte dhe mangësi në specifika teknike për të kompletuar pritoren						
Rekomandime masat për tu ndërmarë	Rekomandimet qe duhen të ndermirën për shkak të vonesave nga OE duke bazuar në kushtet e kontratës duhen të ndërmarrën masa për ndërprerje të kontratës						
Vlerësimi i progresit në projekt							


PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					02	
	Projekti :	Rregullimi dhe rrethimi i varrezave të Komunës së Prishtinës					Vlera e projektit: 100,00.00 €	
	Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik	
	Operatori :	I.P.N.EU SHPK					Nr.616 19 059 521 dt.29.04.2020	
	Menaxheri i projektit :	Habib Qorri					Projekti i vitit: 2019	
	Organi mbikëqyrës :	Xhemshit Gashi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Vazhdim i punimeve për rrethoja te Komunës së Prishtinës						
	Punët në realizim	Vendosja e rrethojave në varrezat e fshatrave, me të njëjtat pozicione.						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)		
		9,711.00€						
Vonesat Shkalla e cilësisë								
Rekomandime masat për tu ndërmarë		Kërkesat tona për punëkryesin për vazhdimin e punëve.						
Vlerësimi i progresit në projekt								



Rrethimi i varrezave

PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					03
Projekti :	Kontrata në Shtëpi					Vlera e projektit: 1,440,000.00 €	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik	
Operatori :	KRM 'Pastrimi'					Nr.	
Menaxheri i projektit :	Lumnije Hyseni					Projekti i vitit: 2020	
Organi mbikëqyrës :	1.Xhevdet Ibrahimaj 2. Qëndresa Ramadani						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	1.Mbledhja,largimi dhe transportimi i mbeturinave të amvisërisë, bizneseve dhe animale 2.Mbledhja,largimi dhe transportimi i mbetjeve urbane-inerte dhe atyre të vëllimshme 3.Mbledhja dhe largimi i mbetjeve inerte. 4. Faturimi dhe shpërndarje e faturave për mbeturina 5. Larja dhe dezinfektimi i lokacioneve edhe kontejnerëve 6.Lokimi dhe dislokimi i kontejnerëve sipas kërkesës nga ana e komunës.					
	Punët në realizim	Të gjitha pikat e lartë cekura					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni I	Situacioni II	Situacioni	Situacioni	Situacioni	
		222,335.00€	342,818.00€				
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime masat për tu ndërmarë		Për arritjen e evitimit të deponive ilegale rekomandojmë që pas largimit të mbeturinave të vendosen rrethojat në hapësirat e pastruara dhe mundësisht të gjelbërimi i tyre					
Vlerësimi i progresit në projekt							



 RAPORTI MBIKËQYRËS		04				
Projekti :	Ngritja e vendkalimeve të këmbësorëve dhe vendosja e paneleve ndriçuese	Vlera e projektit: €				
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik				
Operatori :	Infotrast SH.P.K	Nr.616-19-5692-5-2-1 dt.04,10,2019				
Menaxheri i projektit :	Xhymshit Gashi	Projekti i vitit: 2020				
Organi mbikëqyrës :	Halil Halili					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara						
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Vendosja e paneleve ndriçuese Ngritja e vendkalimeve të këmbësorëve				
	Punët në realizim	Ndërtimi i ishujve Vendosja e zebrave drithëruese				
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)
Vonesat Shkalla e cilësisë		<p>Punimi i ishujve neglizhim i punës, ende nuk është mbjell bari.</p> <p>Problemi i vendosjes së zebrave drithëruese është që nga përshkrimi teknik i tyre, e deri te dëmtimi i tyre brenda një periudhe të shkurtër kohore. Neglizhimi i punëve dhe tejkalimi i afateve kohore për realizimin e kontratës edhe përkundër angazhimit, thirrjeve dhe vërejtjeve tona të vazhdueshme për ngritje të cilësisë së punimeve dhe për përfundim të projektit.</p>				
Rekomandime masat për tu ndërmarë		<p>Kompania ka bërë vazhdim të sigurimit të ekzekutimit të punimeve, në bazë kërkesës sonë.</p> <p>Ftesa për ngritje të cilësisë së punimeve, për përmirësim të zebrave të dëmtuara dhe vazhdimi i vendosjes së zebrave drithëruese në lokacionet e reja të përcaktuara nga ana jonë.</p> <p>Përfundimi i punës së ishujve.</p>				

	Ende nuk ka filluar me përmirësimin e zebrave të dëmtuara dhe ishujve të pa përfunduar.
Vlerësimi i progresit në projekt	Edhe pas rekomandimeve tona për përmirësim të cilësisë dhe përfundim të punimeve ende nuk i ka filluar.

		RAPORTI MBIKËQYRËS				05
Projekti :	Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit – pjesa e pare	Vlera e projektit: 138,255.87 €				
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik				
Operatori :	VZ Company Sh.p.k	Nr.616 18 015 211 dt.29/05/2018				
Menaxheri i projektit :	Dukagjin Gashi	Projekti i vitit: 2018- 2020				
Organi mbikëqyrës :	Halil Halili Xhemajl Vllasaliu					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara						
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në javë) : 1 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 6 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 29 rrugë Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 166 rrugë				
	Punët në realizim	Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në javë) : 1 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 6 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 29 rrugë Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 166 rrugë				
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)
		15,704.34€	15,346.49€	15,704.34€	15,704.34€	14,298.98€
Vonesat Shkalla e cilësisë						
Rekomandime masat për tu ndërmarrë						
Vlerësimi i progresit në projekt						

PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS				06	
Projekti :	Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve te qytetit – pjesa e dyte	Vlera e projektit:				113,177.98 €	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik					
Operatori :	Toifor Sh.p.k	Nr.616 18 015 211 dt.03/04/2019					
Menaxheri i projektit :	Dukagjin Gashi	Projekti i vitit:				2019-2020	
Organi mbikëqyrës :	Halil Halili Bashkim Sadiku						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në javë) : 2 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 2 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 27 rrugë Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 128 rrugë					
	Punët në realizim	Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në javë) : 2 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 2 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 27 rrugë Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 128 rrugë					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	
		19,256.13€	18,749.96€	19,256.13€	12,875.83€	11,241.94€	
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime masat për tu ndërmarë							
Vlerësimi i progresit në projekt							

PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS				07	
Projekti :	Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve te qytetit – pjesa e tretë	Vlera e projektit:				284,997.96 €	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik					
Operatori :	NPN Dardania	Nr.616 18 015 211 dt.29/05/2018					
Menaxheri i projektit :	Dukagjin Gashi	Projekti i vitit:				2018-2020	
Organi mbikëqyrës :	Halil Halili Xhemajl Vllasaliu						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Larja e rrugëve të kategorisë A/ shesheve (rrugët 4 herë në javë/ sheshet 7herë në javë) : 16 hapësira publike Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 24 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 20 rrugë Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 60 rrugë					
	Punët në realizim	Larja e rrugëve të kategorisë A/ shesheve (rrugët 4 herë në javë/ sheshet 7herë në javë) : 16 hapësira publike Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 24 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 20 rrugë Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 60 rrugë					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	
		24,224.48€	23,515.92€	23,710.65€	24,164.73€	23,280.84€	
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime masat për tu ndërmarë							
Vlerësimi i progresit në projekt							


PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS				08	
Projekti :	Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve te qytetit – pjesa e katerte	Vlera e projektit:				187,823.26 €	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik					
Operatori :	Niti - N	Nr.616 18 015 211 dt.29/05/2018					
Menaxheri i projektit :	Dukagjin Gashi	Projekti i vitit:				2018-2020	
Organi mbikëqyrës :	Bashkim Sadiku Enver Kadriu						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në javë) : 2 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 5 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 35 rrugë Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 99 rrugë					
	Punët në realizim	Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në javë) : 2 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 5 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 35 rrugë Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 99 rrugë					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	
		20,459.26€	20,779.27€	21,360.19€	20,243.73€	20,643.85€	
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime masat për tu ndërmarë							
Vlerësimi i progresit në projekt							

PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS				09	
Projekti :	Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve te qytetit – pjesa e peste					Vlera e projektit: 192,896.00 €	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik	
Operatori :	NShT Zahiri					Nr.616 18 015 211 dt.29/05/2018	
Menaxheri i projektit :	Dukagjin Gashi					Projekti i vitit: 2018- 2020	
Organi mbikëqyrës :	Afrim Gashi Enver Kadriu						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 7 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 27 rrugë Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 114 rrugë					
	Punët në realizim	Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 7 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 27 rrugë Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 114 rrugë					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	
		21,327.55€	18,436.48€	19,637.14€	20,243.73€	16,761.83€	
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime masat për tu ndërmarë							
Vlerësimi i progresit në projekt							



LLOTO 5

PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					10
Projekti :	Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve te qytetit – pjesa e gjashtë	Vlera e projektit: 192,896.00 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik					
Operatori :	KRM Pastrimi	Nr.616 18 015 211 dt.29/05/2018					
Menaxheri i projektit :	Dukagjin Gashi	Projekti i vitit: 2018- 2020					
Organi mbikëqyrës :	Afrim Gashi Enver Kadriu						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në javë) : 8 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 5 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 38 rrugë Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 116 rrugë					
	Punët në realizim	Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në javë) : 8 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 5 rrugë Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 38 rrugë Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 116 rrugë					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	
		24,879.59€	24,624.08€	25,449.03€	24,773.92€	24,384.28€	
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime masat për tu ndërmarë							
Vlerësimi i progresit në projekt							

LLOTO 6

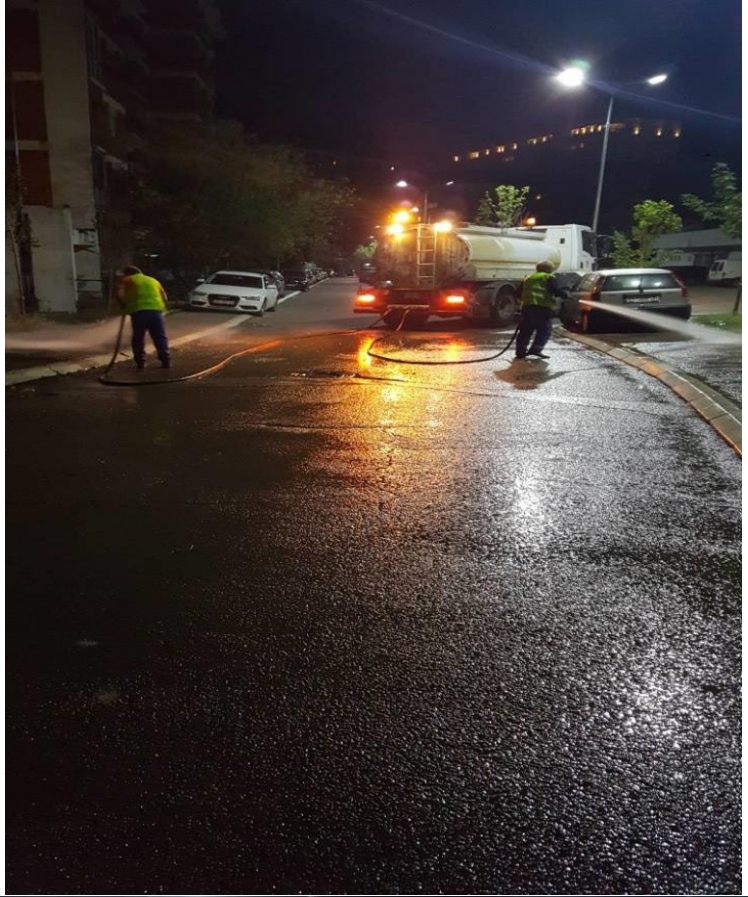

PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS								11
Projekti :	RIPARIMI DHE RREGULLIMI I ASHENSORËVE									Vlera e projektit: 200,000.00€
Investuesi :	Komuna e Prishtinës									Plani dinamik 365 ditë
Operatori :	SH.P.K “EJONA”									Nr.616 19 1538 521 dt.08.11.2019
Menaxheri i projektit :	Bashkim Sadiku									Projekti i vitit: 2019
Organi mbikëqyrës :	Enver Kadriu									
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara										
Vëllimi	Punët e realizuara	Janë realizuar vetëm mirëmbajtje në institucione publike komunale.								
	Punët në realizim	Mirëmbajtja në institucione publike komunale dhe fillimi i riparimit të ashensorëve në hyrjet e përcaktuara.								
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)	Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)
		8,432.00€	8,200.80€	4,699.00€	5,435.00€	2,902.00€	3,222.80€	4,426.00€	3,629.40€	4.429.00€
Vonesat Shkalla e cilësisë		Vones për shkak të lirimit të hapësirave në dhomat e makinerive nga banorët								
Rekomandime masat për tu ndërmarë		Caktimi i Ekipeve dhe organizimi i punëve nga 6 hyrjet pas participimit.								
Vlerësimi i progresit në projekt		Përfundimi i Ashnsorit në rr.Qamil Bala-Bregu i Diellit Hyrja nr.3 si dhe vendoja e paisjeve në 4 hyrje tjera –Motorët, dyert, sajilet dhe materialet tjera përcjellëse janë duke vazhduar.								

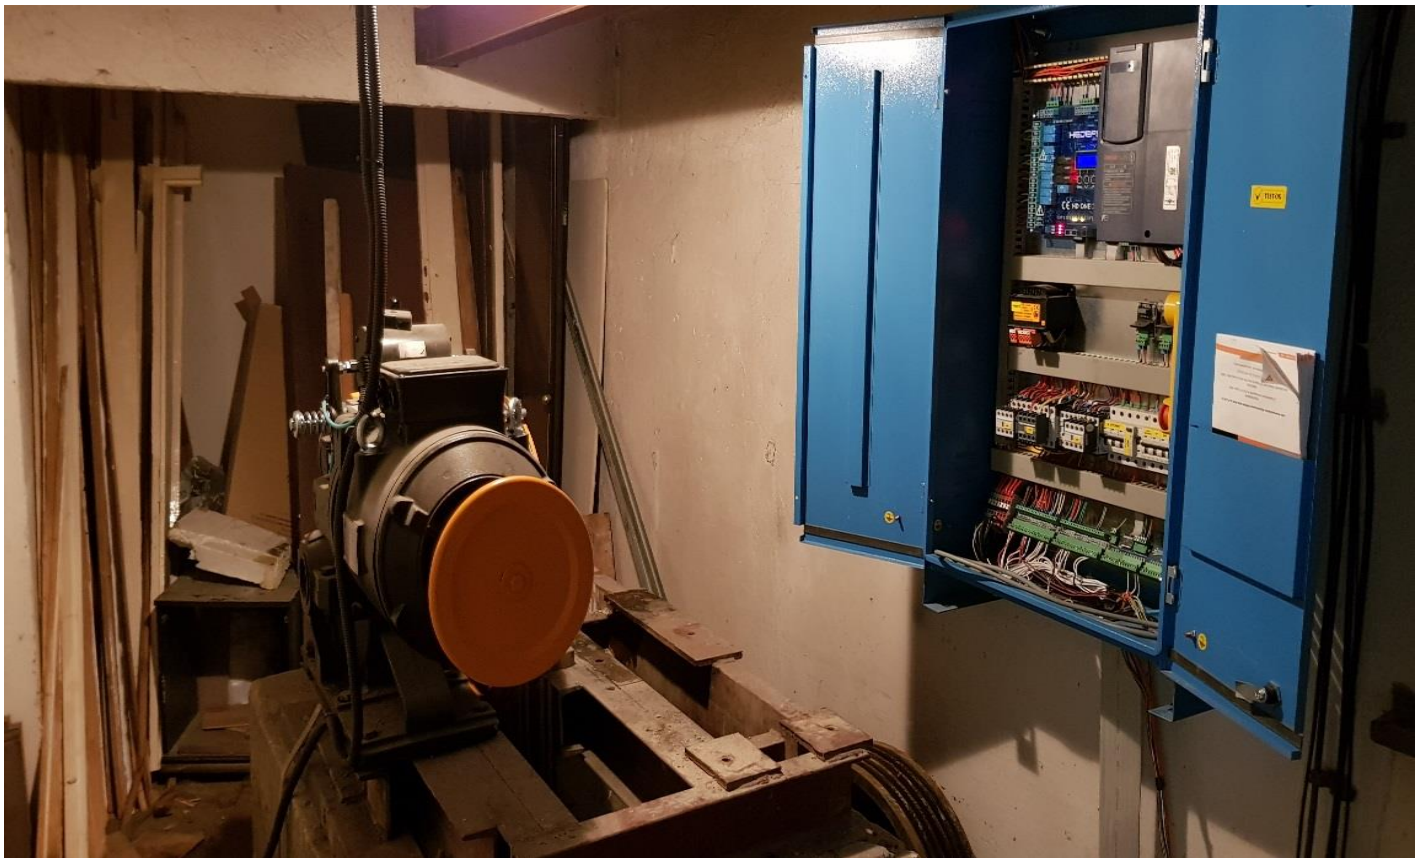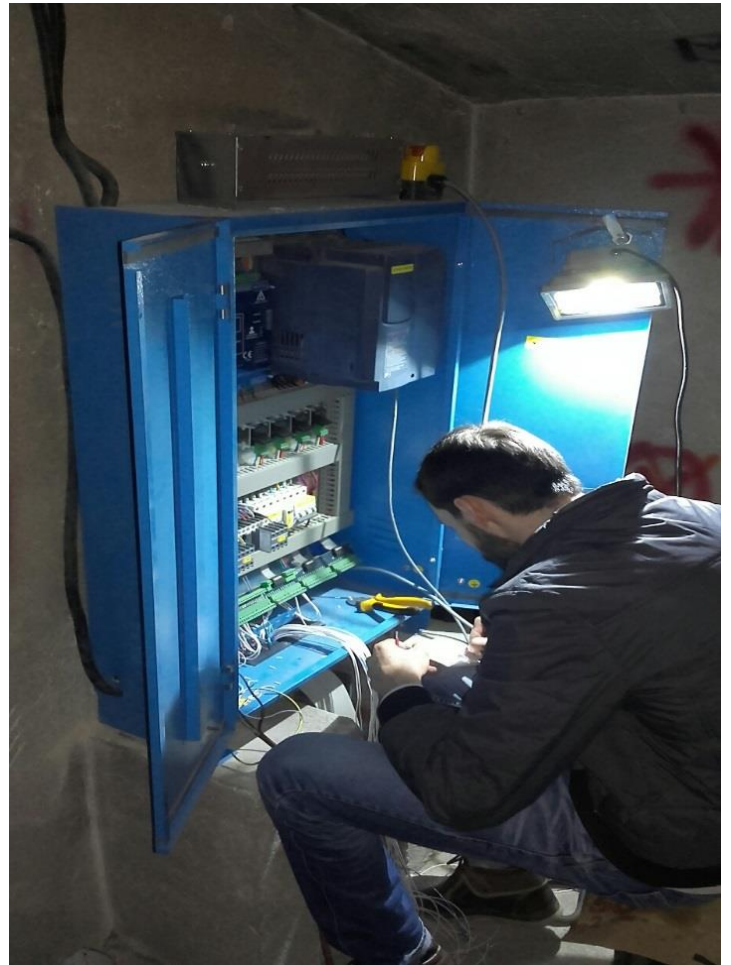


 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 12				
Projekti :	Sinjalizimi horizontal dhe vertikal i rrugëve dhe vendbanimeve	Vlera e projektit: 593,650.00 €				
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik				
Operatori :	SHPK "RSM Company"	Nr.616 19 146 511 dt.31.03.2020				
Menaxheri i projektit :	Enver Kadriu	Projekti i vitit: 2020				
Organi mbikëqyrës :	Halil Halili					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara						
Vëllimi fizik	Punët e realizuara					
	Punët në realizim					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)
		9,400.00				
Vonesat Shkalla e cilësisë	95% janë vonuar porosit dhe realizmi i tyre në teren					
Rekomandime masat për tu ndërmarrë	Nëse OE nuk tregohet ma i përgjegjshëm ne realizimin e punëve duhet te shikohet mundësia e shkëputjes					
Vlerësimi i progresit në projekt						




Sinjalizimi horizontal dhe vertikal

 RAPORTI MBIKËQYRËS		13				
Projekti :	Intervenimi dhe mirëmbajtja në pompa, kanalizim atmosferik, Fontana, kroje publike, monumente dhe mure rezistuese Loto 2	Vlera e projektit: 25,000.00 €				
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik				
Operatori :	“NITI-N” SH.P.K	Nr.616 20 060 521 dt.10.08.2020				
Menaxheri i projektit :	Fatmir Bilalli	Projekti i vitit: 2020				
Organi mbikëqyrës :	Dukagjin Gashi					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara						
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Renovimi i Fontanave; Sheshi “Edit Durham”, “Ibrahim Rugova” izolim, vendosja e pllakave, reflektorve. Pastrimi dhe renovimi i fontanave sheshi “Zahir Pajaziti”, “Nëna Tereze” ndriçimi me reflektor i monumenteve sheshi “Skënderbeu” Sheshi “Edit Durham” monumenti i “KFOR”. Pastrimi i fontanave dhe monumenteve sipas kontratës ne gjith Komunen e Prishtinës.				
	Punët në realizim	Vendosja e reflektorëve dhe mirëmbajtja e fontanave				
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)
Vonesat Shkalla e cilësisë	Nuk ka vonesa					
Rekomandime masat për tu ndërmarë						
Vlerësimi i progresit në projekt	Punët janë duke shkuar sipas kontratës					

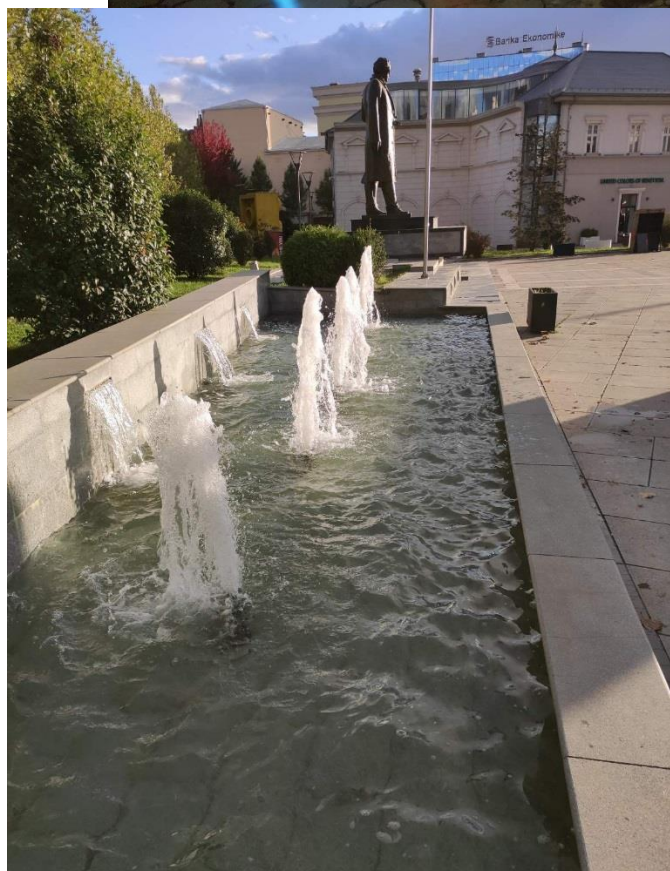

Mirëmbajtja e monumenteve dhe fontanave

 RAPORTI MBIKËQYRËS		14				
Projekti :	Intervenimi dhe mirëmbajtja në pompa, kanalizim atmosferik, Fontana, kroje publike, monumente dhe mure rezistuese Loto – III -	Vlera e projektit: 75,000.00 €				
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik				
Operatori :	“Agro Invest 1” Shpk & “Is Company” Shpk.	Nr.616 20 060 521 dt.10.08.2020				
Menaxheri i projektit :	Fatmir Bilalli	Projekti i vitit: 2020				
Organi mbikëqyrës :	Xhevdet Ibrahimaj					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara						
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Intervenime Emergjente në disa rrugë rurale, hapja e kanaleve si dhe intervenim me eskavator, mbulimi i gropave të shkaktuara nga vërshimet dhe largimi i grumbullimit të mbeturinave nga rruga.				
	Punët në realizim					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)
Vonesat						
Shkalla e cilësisë						
Rekomandime masat për tu ndërmarë						
Vlerësimi i progresit në projekt						

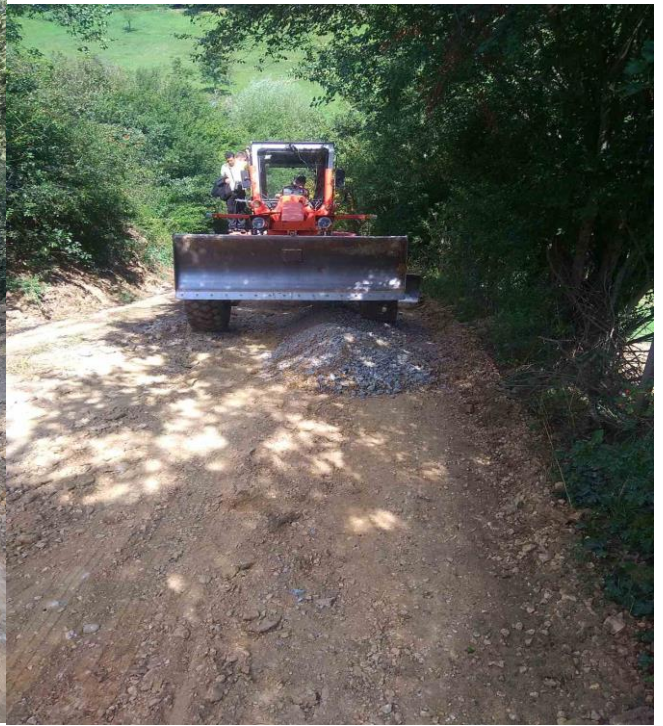




Intervenimet Emergjente

 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 01				
Projekti :		Vlera e projektit: 50,000.00€				
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik Ditë				
Operatori :	NTSH "Ekoinvest"	616 20 088 221 dt.04.09.2020				
Menaxheri i projektit :	Habib Qorri	Projekti i vitit: 2020				
Organi mbikëqyrës :	Bashkim Sadiku Enver Kadriu Halil Halili					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara						
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Intervenime të ndryshme në nyjet semaforike sipas nevojës dhe dëmtimeve të ndryshme				
	Punët në realizim	Kontratë është në realizim				
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)
Vonesat Shkalla e cilësisë	Pas nënshkrimit të kontratë punët kanë filluar të realizohen sipas kërkesave të menaxherit dhe mbikëqyrësve dhe nevojave në teren.					
Rekomandime masat për tu ndërmarë						
Vlerësimi i progresit në projekt	Kontrata është duke u realizuar sipas kushteve të kontratës dhe nevojave që paraqiten në teren nga defektet.					

Viti 2020	Te hyrat nga pag. e mbetur.	Te hyrat nga Hortikultura	Konfiskimi i Automjeteve	Parkingu te Pallati i Rinisë	Taks nga shfrytëzimi i Hapësirave publike	Gjithsej
Janar	179,712.50 €	20,260.00 €	4,607.25 €	6,765.65 €	15,109.20 €	219,689.05 €
Shkurt	170,995.65 €	23,335.50 €	4,498.75 €	0	1,701.00 €	207,296.55 €
Mars	124,027.61 €	18,832.00 €	3,212.00 €	0	598.00 €	146,669.61 €
Prill	63,005.31 €	3,011.00 €	895.00 €	0	0	66,911.31 €
Maj	102,494.46€	0	2,266.25€	0	2,124.78€	106,885.49€
Qershor	134,021.84€	15,270.00€	6,780.00€	0	10,397.00€	166,468.84€
Korrik	151,514.00€	20,937.00€	10,962.75€	0	0	183,413.75 €
Gusht	170,710.78€	14,253.00€	9,275.00€	0	2959.78€	197,198.56 €
Shtator	210,210.91€	9,988.00€	9,110.50€	0	980.00€	230,289.41 €



Viti 2020	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator
Rastet	455	425	427	333	499	516	471	591	474

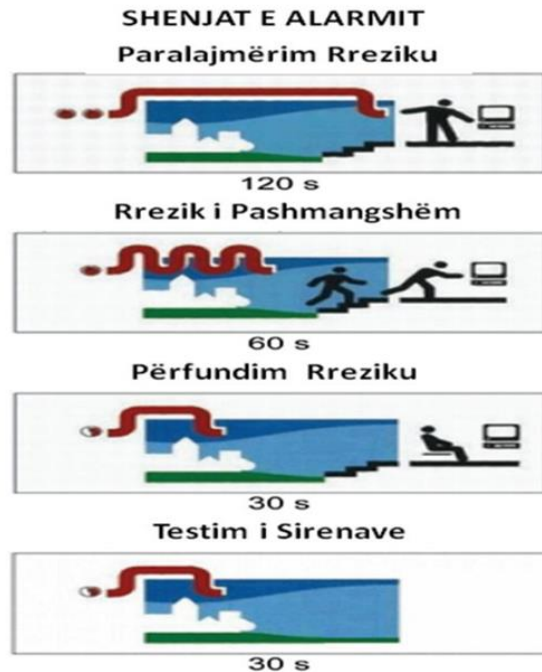

Testimi i sistemit të alarmimit publik pa zë, më 05.09.2020

RREZIK NGA AJRI - Sinjali i alarmimit rrezik nga ajri është: 60 sekonda zë valor pa ndërprerë.

RREZIK NGA MJETET KIMIKE, BIOLOGJIKE DHE RADIOLOGJIKE - Sinjali i alarmimit rrezik nga mjetet kimike, biologjike dhe radiologjike është: tre zëra valorë nga 20 sekonda, me dy pauza nga 15 sekonda në mes (20 sek. zë valor + 15 sek. pauzë + 20 sek. zë valor + 15 sek. pauzë + 20 sek. zë valor).

RREZIK NGA FATKEQËSITË ELEMENTARE DHE NATYRORE - Sinjali i alarmimit rrezik nga fatkeqësitë elementare dhe natyrore është: dy zëra të njëtrajtshëm me nga 20 sekonda dhe një zë valor prej 20 sekondave në mes (20 sek. zë i njëtrajtshëm + 20 sek. zë valor + 20 sek. zë i njëtrajtshëm).

RREZIK NGA ZJARRI - Sinjali i alarmimit rrezik nga zjarri është: tre zëra të njëtrajtshëm nga 20 sekonda dhe dy pauza nga 15 sekonda në mesë (20 sek. zë i njëtrajtshëm + 15 sek. pauzë + 20 sek. zë i njëtrajtshëm + 15 sek. pauzë + 20 sek. zë i njëtrajtshëm).

KALIMI I RREZIKUT - Sinjali i alarmimit kalimi i rrezikut është: 60 sekonda zë i njëtrajtshëm pa ndërprerë.



Mirëmbajtja e sistemit të alarmimit publik dhe testimi i tyre çdo muaj, si dhe R-L, kamerave dhe pajisjeve tjera teknike në qendër.

**Drejtores :
Medina Braha**

Shtator 2020
Prishtinë.
