



Raporti i vitit 2020

Korrik 01.-31.07.2020

1. Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtjes dhe Shpëtimit

Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtjes dhe Shpëtimit, është e ndarë në katër sektorë:

- *Sektori për shërbime Publike;*
- *Sektori për menaxhimin e mbeturinave dhe ambientit;*
- *Sektori për mbrojtje dhe shpëtim;*
- *Sektori i transportit dhe trafikut.*

1.1 Sektori për shërbime publike

Ky sektor merret me menaxhimin dhe shfrytëzimin e hapësirave publike në përputhje me planet komunale, është përgjegjës për dhënien e lejeve për shfrytëzimin e hapësirave publike, mirëmbajtjen, modernizimin dhe zgjerimin e ndriçimit publik, përkujdeset për ashensorët (riparimi dhe rregullimi), kujdeset për mirëmbajtjen dhe funksionimin normal të fontanave dhe monumenteve publike, njëherësh kryen edhe punë të tjera në bazë të ligjeve të aplikueshme në kuadër të fushëveprimtarisë së Drejtorisë.

1.2 Sektori për menaxhimin e mbeturinave dhe ambientit:

Organizon mirëmbajtjen verore dhe dimërore të rrugëve lokale dhe në vendbanime, pastrimin e rrugëve dhe trotuareve të qytetit, mbikëqyrë realizimin e punëve për rregullimin e gjelbërimit dhe shqyrton kërkesat e ndryshme, kujdeset për menaxhimin, kontrollimin dhe pastrimin e të gjitha shesheve që i përkasin komunës, organizon dhe menaxhon mbledhjen e mbeturinave dhe zhvillon projekte të ndryshme që ndikojnë në përmirësimin e shërbimit të mbledhjes së mbeturinave, zvogëlimin e ndotjes dhe promovimin e uljes së sasisë së mbeturinave, organizon mirëmbajtjen dhe zhbllokimin e rrjetit të kanalizimit atmosferik dhe planet për ngrohtoret lokale, organizon sigurimin dhe mirëmbajtjen e hapësirave publike, hapësirave gjelbëruese, parqeve publike dhe varrezave, organizohet për zvogëlimin gradual të ndotjes, degradimit dhe të dëmit mjedisor, si dhe zvogëlimin ose ndalimin e atyre aspekteve ekonomike dhe të aktiviteteve të tjera që përbëjnë rrezik për shëndetin e njeriut dhe mjedisin.

1.3 Sektori për mbrojtje dhe shpëtim:

Merret me parandalimin e fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive të tjera, vlerëson rrezikshmërinë e tyre brenda territorit të komunës, shpëtimin e njerëzve dhe të mirave materiale, si dhe harton planet operative për mbrojtje nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera, siç janë; tërmetet, vërshimet, rrëshqitjet e dheut, ortekët e borës, erëra të fuqishme, breshër, borë me acar, thatësi, zjarre, bllokim të rrugëve, shpërthim i sëmundjeve infektive që ndikojnë në njerëz, kafshë ose bimë, si dhe fatkeqësi të tjera të shkaktuara nga natyra apo njerëzit.

1.4 Sektori i transportit dhe trafikut:

Koordinon aktivitetin dhe jep pëlqimin për veprimtarinë e transportit publik të udhëtarëve dhe mallrave, me kompanitë publike dhe shoqatat e taksistëve individualë dhe

operatorëve juridikë, sipas rregulloreve; cakton linjat dhe rendin e udhëtimit për transportin publik të udhëtarëve, menaxhon sektorin me "merimangë", sipas rregullores, organizon procedurat për ankand publik për automjetet e konfiskuara, që kalojnë afatin e paraparë me ligj, bashkëpunon me policinë për rregullimin e komunikacionit dhe ngritjen e sigurisë në komunikacion, kujdeset për sinjalizimin vertikal dhe horizontal të rrugëve ekzistuese dhe rregullon komunikacionin në qytetin e Prishtinës, vendos për mbylljen e përkohshme të rrugëve për shfrytëzimin e tyre.

2. Shqyrtimi i kërkesave

Gjatë muajit korrik, 2020, Drejtoria ka proceduar 283 kërkesa të ndryshme: për shfrytëzim të hapësira para lokaleve, reklama, transport, parkingje, siguri në trafik për emergjenca (vërshime, zjarre, shembje të rrugëve, trotuareve, drunjve të ndryshëm), për shitje ambulante, për mbeturina. Nga numri i përgjithshëm, prej 283 kërkesave të pranuar, të gjitha kërkesat janë të përfunduara.

Rastet e intervenimeve emergjente – 22;

Rastet e pranuar në Qendrën e thirrjeve – 471.

2.1. Dërgimi i kërkesave për hartimin e detyrave projektuese dhe identifikimi i nevojave

Pergatitja e projekteve, paramasave dhe specifikimeve për projektet e planifikuara gjatë kësaj perjudhe.

3.1. Raportimi i menaxherëve të projekteve dhe kontratave

Drejtoria	Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtjes dhe Shëtimit
Spektori	Spektori i shërbimeve publike, mbrojtje dhe shpëtimit, Spektori i menaxhimit të mbeturinave dhe Ambientit dhe Spektori i transportit dhe trafikut.
Drejtoresha	Medina Braha
Raportori	Habib Qorri, Fatmir Bilalli, Dukagjin Gashi / shef sektori
Kontrollori – Përpunoi	
Periudha raportuese	01- 31.07.2020, muaji korrik
Menaxheret e projekteve dhe Organi mbikëqyrës	Habib Qorri Dukagjin Gashi Fatmir Bilalli Xhemshit Gashi Bashkim Gashi Enver Kadriu

	Afrim Gashi Xhevdet Ibrahimaj Halil Halili Lumnije Hyseni Xhemile Gashi Sabri Gashi
--	--

		RAPORTI MBIKËQYRËS					01	
Projekti :	Rregullimi dhe rrethimi i varrezave të komunës së Prishtinës							Vlera e projektit: 100,00.00 €
Investuesi :	Komuna e Prishtinës							Plani dinamik ditë
Operatori :	IPN "EU", SHPK							Nr.616 19 059 521 dt.29.04.2020
Menaxheri i projektit :	Habib Qorri							Projekti i vitit: 2019
Organi mbikëqyrës :	Xhemshit Gashi							
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Vendosja e rrethojave në varrezat e qytetit, në gjatësi 315m, me punët tjera përgaditore, gërmim i gropave, betonimi, vendosja e shtyllave vertikale, pastrimi fitosanitar në gjerësi prej 2m.						
	Punët në realizim	Vendosja e rrethojave në varrezat e fshatrave, me të njëjtat pozicione.						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)		
Vonesat Shkalla e cilësisë		Ka pasur vonesa për shkak të punimit të bazamentit të dobët të shtyllave						
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë		Përmirësimi i bazamenteve për shtyllat vertikale të rrethojave dhe pastrimi fitosanitar dhe largimi i mbeturinave						
Vlerësimi i progresit në projekt		Pas përmirësimit, është bërë pranimi i punëve nga menaxheri dhe mbikëqyrësi						



Rrethimi i varrezave

PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					02
Projekti :							Vlera e projektit: €
Investuesi :		Komuna e Prishtinës					Plani dinamik Ditë
Operatori :		KRM "Pastrimi"					Nr.
Menaxheri i projektit :		Lumnije Hyseni					Projekti i vitit: 2020
Organi mbikëqyrës :		Xhevdet Ibrahimaj, Qëndresa Ramadani					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	1.Mbledhja,largimi dhe transportimi i mbeturinave të amvisërisë, bizneseve dhe animale; 2.Mbledhja,largimi dhe transportimi i mbetjeve urbane-inerte dhe atyre të vëllimshme; 3.Mbledhja dhe largimi i mbetjeve inerte nga deponitë ilegale masive; 4. Faturimi dhe shpërndarje e faturave për mbeturina; 5. Larja dhe dezinfektimi i lokacioneve dhe kontejnerëve; 6.Lokimi dhe dislokimi i kontejnerëve, sipas kërkesës nga ana e Komunës.					
	Punët në realizim	Të gjitha pikat e lartcekura					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë		Për arritjen e evitimit të deponive ilegale rekomandojmë që pas largimit të mbeturinave, të vendosen rrethojat në hapësirat e pastruara dhe mundësisht gjelbërimi i tyre.					
Vlerësimi i progresit në projekt							



PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					03
Projekti :	Ngritja e vendkalimeve të këmbësorëve dhe vendosja e paneleve ndriçuese					Vlera e projektit: €	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik Ditë	
Operatori :	"Infotrast" SHPK					Nr.616-19-5692-5-2-1 dt. 04,10,2019	
Menaxheri i projektit :	Xhymshit Gashi					Projekti i vitit: 2020	
Organi mbikëqyrës :	Halil Halili						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Vendosja e paneleve ndriçuese Ngritja e vendkalimeve të këmbësorëve					
	Punët në realizim	Ndërtimi i ishujve Vendosja e zebrave drithëruese					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	
		Në këtë projekt pagesat realizohen vetëm pas përfundimit të të gjitha punimeve					
Vonesat, Shkalla e cilësisë		Punimi i ishujve, neglizhim i punës, ende nuk është mbjell bari. Problemi i vendosjes së zebrave drithëruese është që nga përshkrimi teknik i tyre, e deri te dëmtimi i tyre brenda një periudhe të shkurtër kohore. Neglizhimi i punëve dhe tejkalimi i afateve kohore për realizimin e kontratës edhe përkundër angazhimit, thirrjeve dhe vërejtjeve tona të vazhdueshme për ngritje të cilësisë së punimeve dhe për përfundim të projektit.					

<p>Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë</p>	<p>Kompania ka bërë vazhdim të sigurimit të ekzekutimit të punimeve, në bazë kërkesës sonë. Ftesa për ngritje të cilësisë së punimeve, për përmirësim të zebrave të dëmtuara dhe vazhdimi i vendosjes së zebrave drithëruese në lokacionet e reja të përcaktuara nga ana jonë. Përfundimi i punës së ishujve. Aplikimi i ndëshkimit në baza ditore, që nga data 23.06.2020, ashtu siç parashihet në kontratë. Ende nuk ka filluar me përmirësimin e zebrave të dëmtuara dhe ishujve të pa përfunduar.</p>
<p>Vlerësimi i progresit në projekt</p>	<p>Edhe pas rekomandimeve tona për përmirësim të cilësisë dhe përfundim të punimeve, ende nuk i ka filluar.</p>



PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS			04	
Projekti :	Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit – pjesa e parë				Vlera e projektit: 138,255.87 €	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës				Plani dinamik ditë	
Operatori :	“VZ Company”, SHPK				Nr. 616 18 015 211 dt. 29.05.2018	
Menaxheri i projektit :	Dukagjin Gashi				Projekti i vitit: 2018-2020	
Organi mbikëqyrës :	Halil Halili Xhemajl Vilasaliu					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara						
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në javë) : 1 rrugë; Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 6 rrugë; Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 29 rrugë; Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 166 rrugë.				
	Punët në realizim	Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në javë) : 1 rrugë; Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 6 rrugë; Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 29 rrugë; Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 166 rrugë.				
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)
		15,704.34	15,346.49			
Vonesat Shkalla e cilësisë						
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë						
Vlerësimi i progresit në projekt						

LOTI 1

PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS			05	
Projekti :	Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit – pjesa e dytë				Vlera e projektit: 113,177.98 €	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës				Plani dinamik ditë	
Operatori :	“Toifor” SHPK				Nr.616 18 015 211 dt.03/04/2019	
Menaxheri i projektit :	Dukagjin Gashi				Projekti i vitit: 2019-2020	
Organi mbikëqyrës :	Halil Halili Bashkim Sadiku					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara						
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në javë) : 2 rrugë; Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 2 rrugë; Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 27 rrugë; Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 128 rrugë.				
	Punët në realizim	Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në javë) : 2 rrugë; Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 2 rrugë; Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 27 rrugë; Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 128 rrugë.				
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)
		19,256.13	18,749.96			
Vonesat Shkalla e cilësisë						
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë						
Vlerësimi i progresit në projekt						

LOTI 2

PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS				06	
Projekti :	Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit – pjesa e tretë					Vlera e projektit: 284,997.96 €	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik ditë	
Operatori :	NPN “Dardania”					Nr.616 18 015 211 dt. 29.05.2018	
Menaxheri i projektit :	Dukagjin Gashi					Projekti i vitit: 2018-2020	
Organi mbikëqyrës :	Halil Halili Xhemajl Vllasaliu						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Larja e rrugëve të kategorisë A/ shesheve (rrugët 4 herë në javë/ sheshet 7 herë në javë) : 16 hapësira publike; Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 24 rrugë; Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 20 rrugë; Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 60 rrugë.					
	Punët në realizim	Larja e rrugëve të kategorisë A/ shesheve (rrugët 4 herë në javë/ sheshet 7 herë në javë) : 16 hapësira publike; Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 24 rrugë; Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 20 rrugë; Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 60 rrugë.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	
		24,224.48	23,515.92				
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt							

LOTI 3



PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS				07
Projekti :	Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit – pjesa e katërt					Vlera e projektit: 187,823.26 €
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik ditë
Operatori :	“Niti” - N					Nr.616 18 015 211 dt. 29.05.2018
Menaxheri i projektit :	Dukagjin Gashi					Projekti i vitit: 2018-2020
Organi mbikëqyrës :	Bashkim Sadiku Enver Kadriu					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara						
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në javë) : 2 rrugë; Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 5 rrugë; Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 35 rrugë; Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 99 rrugë.				
	Punët në realizim	Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në javë) : 2 rrugë; Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 5 rrugë; Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 35 rrugë; Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 99 rrugë.				
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)
		20,459.26	20,779.27			
Vonesat Shkalla e cilësisë						
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë						
Vlerësimi i progresit në projekt						

PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					08
Projekti :	Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit – pjesa e pestë	Vlera e projektit: 192,896.00 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik ditë					
Operatori :	NSHT “Zahiri”	Nr.616 18 015 211 dt.29,05.2018					
Menaxheri i projektit :	Dukagjin Gashi	Projekti i vitit: 2018-2020					
Organi mbikëqyrës :	Afrim Gashi Enver Kadriu						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 7 rrugë; Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 27 rrugë; Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 114 rrugë.					
	Punët në realizim	Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 7 rrugë; Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 27 rrugë; Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 114 rrugë.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	
		21,327.55	18,436.48				
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt							

LOTI 5

PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS			09	
Projekti :	Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit – pjesa e gjashtë				Vlera e projektit: 192,896.00 €	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës				Plani dinamik ditë	
Operatori :	KRM "Pastrimi"				Nr.616 18 015 211 dt.29.05.2018	
Menaxheri i projektit :	Dukagjin Gashi				Projekti i vitit: 2018-2020	
Organi mbikëqyrës :	Afrim Gashi Enver Kadriu					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara						
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në javë) : 8 rrugë; Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 5 rrugë; Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 38 rrugë; Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 116 rrugë.				
	Punët në realizim	Larja e rrugëve të kategorisë A (4 herë në javë) : 8 rrugë; Larja e rrugëve të kategorisë B (2 herë në javë) : 5 rrugë; Larja e rrugëve të kategorisë C (2 herë në muaj) : 38 rrugë; Fshirja e rrugëve të kategorisë D (2 herë në muaj) : 116 rrugë.				
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)
		24,879.59	24,624.08			
Vonesat Shkalla e cilësisë						
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë						
Vlerësimi i progresit në projekt						

LOTI 6

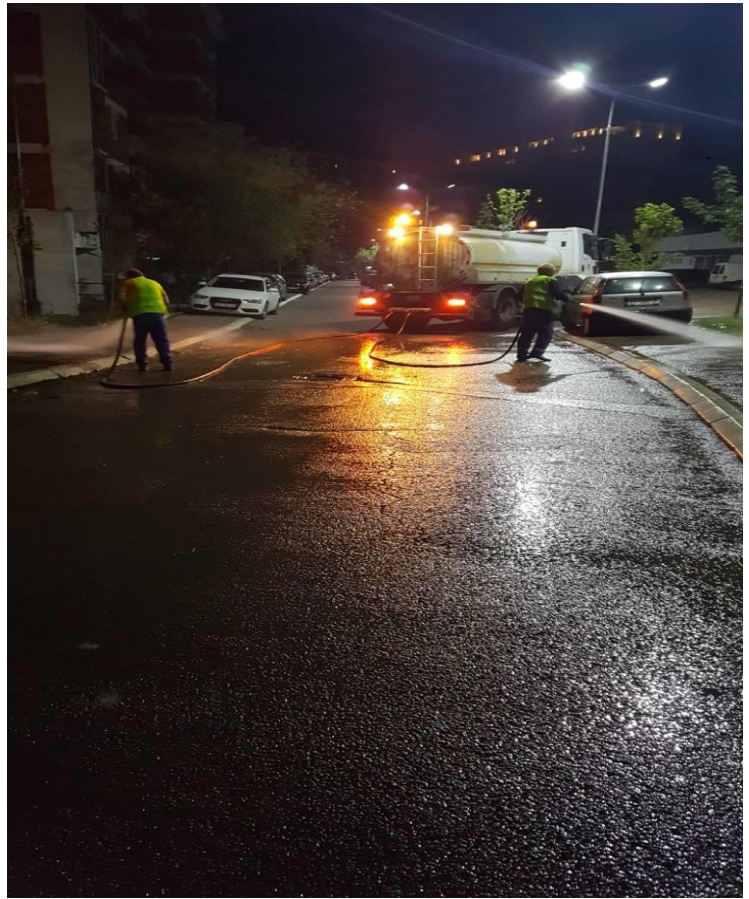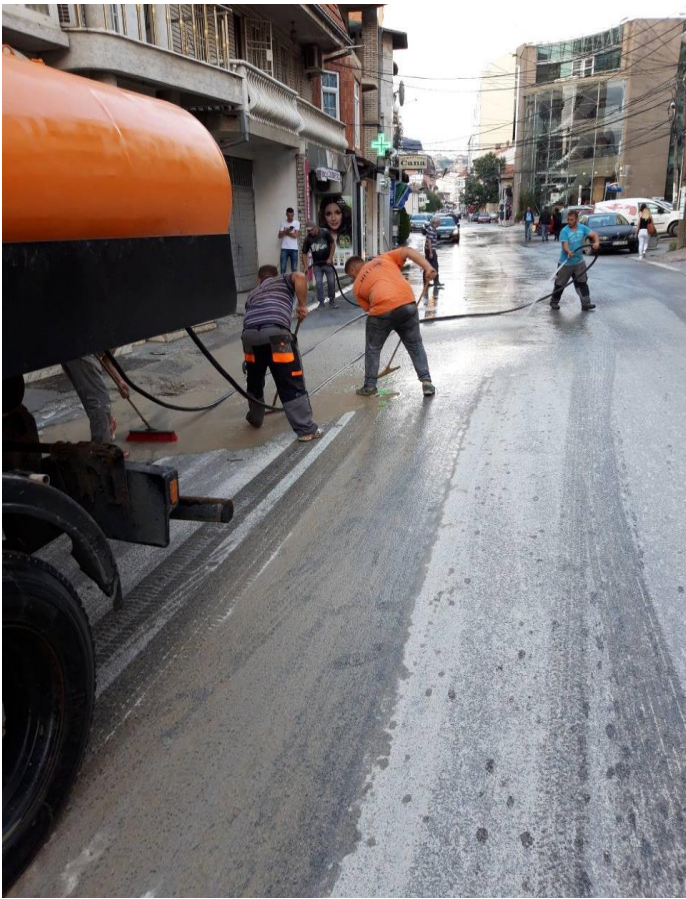




PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					10
Projekti :	Furnizimi i shtyllave antiparking dhe shtyllave lëvizëse në formë pistoni	Vlera e projektit: 41,500.00 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik ditë					
Operatori :	“Armakos” SHPK	Nr.616 19 1534 521 121 dt. 30.05.2020					
Menaxheri i projektit :	Fatmir Bilalli	Projekti i vitit: 2020					
Organi mbikëqyrës :	Xhemshit Gashi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Vendosja e shtyllave antiparking - 20 copë; Vendosja e shtyllave U-profil - 60 copë; Vendosje e rrethojave metalike - 60 m.					
	Punët në realizim						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	
Vonesat Shkalla e cilësisë	Nuk ka vonesa, por e kemi shfrytëzuar 30% për shkak të kërkesës së madhe.						
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt	Punët kanë përfunduar sipas kontratës						


 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 11				
Projekti :	Rregullimi dhe montimi i pompave për furnizim me ujë në ndërtesat kolektive	Vlera e projektit: 70,000.00 €				
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik 12 muaj				
Operatori :	“Ejona“ SHPK, rr. “Zahaq”, Pejë	Nr.616 19 047 5-2-1 dt. 01.11.2019				
Menaxheri i projektit :	Xhevdet Ibrahimaj	Projekti i vitit: 2019				
Organi mbikëqyrës :	Bashkim Sadiku					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara						
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Gjatë muajit korrik, në realizimin e kontratës “Rregullimi dhe montimi i pompave për furnizim me ujë në ndërtesat kolektive”, janë realizuar këto punë: - Furnizimi dhe montimi i pompave shtytëse të ujit në ndërtesat kolektive në Hajvali, gjithsejtë 8 copë, me elemente përcjellëse të montimit (4 hyrje nga 2 copë).				
	Punët në realizim					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)
				38,280.00 €		
Vonesat Shkalla e cilësisë		Nuk ka pasur				
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë						
Vlerësimi i progresit në projekt		Janë vendosur pompat sipas kërkesave, brenda afatit të përcaktuar				



PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					12		
Projekti :	Riparimi dhe rregullimi i ashensorëve							Vlera e projektit: 200,000.00€	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës							Plani dinamik 365 ditë	
Operatori :	SHPK "EJONA"							Nr.616 19 1538 521 dt.08.11.2019	
Menaxheri i projektit :	Bashkim Sadiku							Projekti i vitit: 2019	
Organi mbikëqyrës :	Enver Kadriu								
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara									
Vëllimi	Punët e realizuara	Janë realizuar vetëm mirëmbajtje në institucione publike komunale.							
	Punët në realizim	Mirëmbajtja në institucione publike komunale dhe fillimi i riparimit të ashensorëve në hyrjet e përcaktuara.							
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)	Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)
		8,432.00 €	8,200.80 €	4,699.00 €	5,435.00 €	2,902.00 €	3,222.80 €	4,426.00 €	3,629.40 €
Vonesat Shkalla e cilësisë	Vonesa ka pasur në caktimin e lokacioneve të ashensorëve për riparim dhe participimi nga qytetarës.								
Rekomandime, masat për t'undërmarrë	Pagesat nga banorët në hyrjet e përcaktuara.								
Vlerësimi i progresit në projekt	Pas pagesave nga 5 hyrjet, të cilaj janë kryer në pikat e caktuara, fillon pastrimi dhe largimi i pjesëve të vjetra dhe përgaditja për vendosjen e paisjeve të reja.								

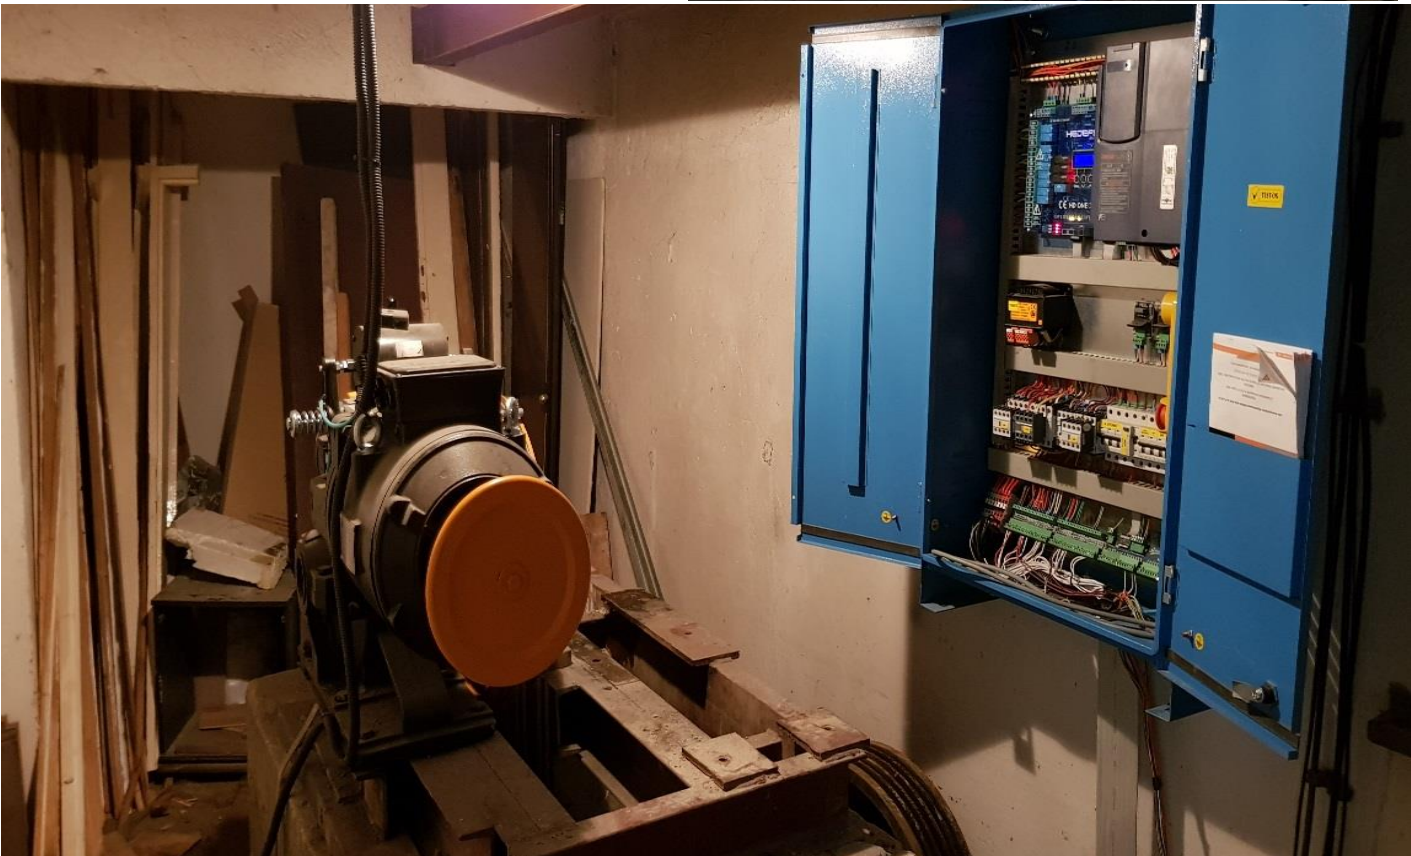

PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					13	
Projekti :	Pastrimi i shtratit të lumenjve dhe kanalizimit atmosferik nga puseta në pusetë					Vlera e projektit: 95,183.40 (30%) €		
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik ditë		
Operatori :	SHPK "Agro-Invest- 1"					Nr.616 15 040 521 dt. 30.10.2019		
Menaxheri i projektit	Enver Kadriu					Projekti i vitit: 2019		
Organi mbikëqyrës :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukagjin Gashi; 2. Siniha Bajraktari; 3. Xhemajl Vllasaliu. 							
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Pastrimi i shtratit të lumenjve dhe përroskave - 53.700m; Pastrimi i kanalizimit atmosferik nga puseta në puset - 83.178m; Porta hyrëse - 3 copë.						
	Punët në realizim	Janë përfunduar të gjitha sipas kontaktës						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)		
		17,474.50 €.						
Vonesat Shkalla e cilësisë	Nuk ka vonesa.							
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë								
Vlerësimi i progresit në projekt								

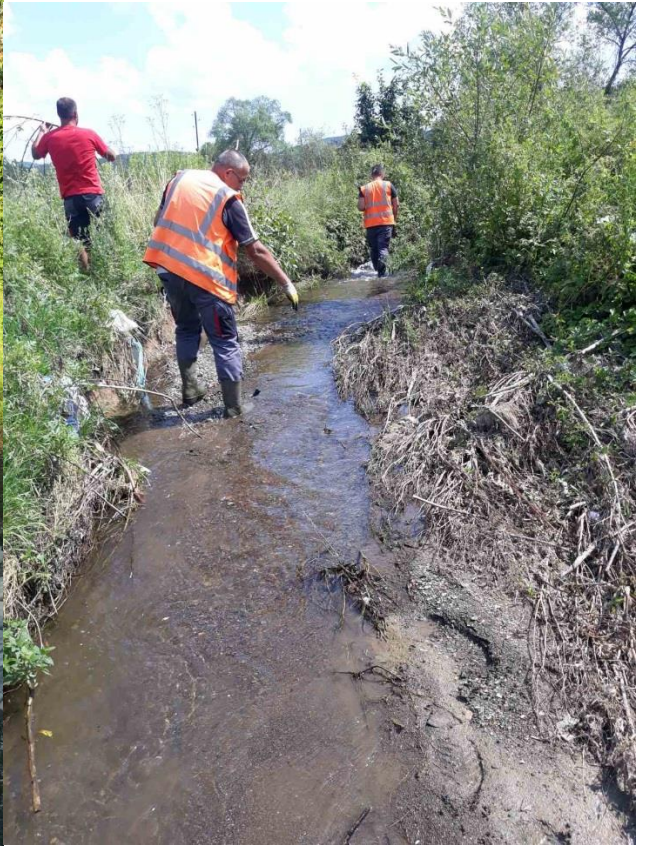


 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 14				
Projekti :	Sinjalizimi horizontal dhe vertikal i rrugëve dhe vendbanimeve	Vlera e projektit: 593,650.00 €				
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik ditë				
Operatori :	SHPK "RSM Company"	Nr.616 19 146 511 dt.31.03.2020				
Menaxheri i projektit :	Enver Kadriu	Projekti i vitit: 2020				
Organi mbikëqyrës	Halil Halili					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara						
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Sinjalizimi horizontal – vendkalimet: 400 m ² ; Sinjalizimi vertikal - 214 copë; Lokacionet : “Arbëria”, “Tophane”, rrugët: “Nazim Gafurri”, rruga”B”, “Stambolli”, “Afrim Loxha” dhe “Shpëtim Robaj”.				
	Punët në realizim	Sinjalizimi horizontal – vendkalimet, vija ndarëse e shiritave Sinjalizimi vertikal				
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)
		9,400.00				
Vonesat Shkalla e cilësisë	95% janë vonuar porositë dhe realizmi i tyre në terren					
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë	Nëse OE nuk tregohet më i përgjegjshëm në realizimin e punëve, duhet te shikohet mundësia e shkëputjes së kontratës.					
Vlerësimi i progresit në projekt						



Intervenimet emergjente



Qendra Komunale, pranimi i rasteve-thirrjeve në telefonat kujdestar pa pagesë 24/7"

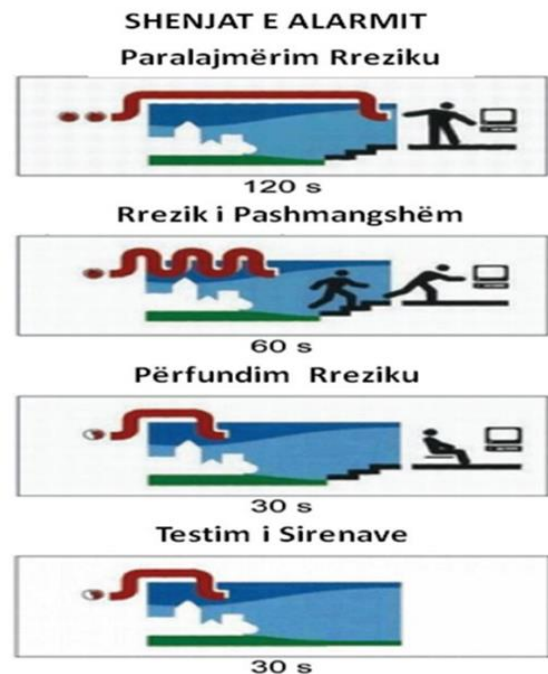

Testimi i sistemit të alarmimit publik pa zë, më 04.07.2020

RREZIK NGA AJRI - Sinjali i alarmimit rrezik nga ajri është: 60 sekonda zë valor pa ndërprerë.

RREZIK NGA MJETET KIMIKE, BIOLOGJIKE DHE RADIOLOGJIKE - Sinjali i alarmimit rrezik nga mjetet kimike, biologjike dhe radiologjike është: tre zëra valorë nga 20 sekonda, me dy pauza nga 15 sekonda në mes (20 sek. zë valor + 15 sek. pauzë + 20 sek. zë valor + 15 sek. pauzë + 20 sek. zë valor).

RREZIK NGA FATKEQËSITË ELEMENTARE DHE NATYRORE - Sinjali i alarmimit rrezik nga fatkeqësitë elementare dhe natyrore është: dy zëra të njëtrajtshëm me nga 20 sekonda dhe një zë valor prej 20 sekondave në mes (20 sek. zë i njëtrajtshëm + 20 sek. zë valor + 20 sek. zë i njëtrajtshëm).

RREZIK NGA ZJARRI - Sinjali i alarmimit rrezik nga zjarri është: tre zëra të njëtrajtshëm nga 20 sekonda dhe dy pauza nga 15 sekonda në mesë (20 sek. zë i njëtrajtshëm + 15 sek. pauzë + 20 sek. zë i njëtrajtshëm + 15 sek. pauzë + 20 sek. zë i njëtrajtshëm).

KALIMI I RREZIKUT - Sinjali i alarmimit kalimi i rrezikut është: 60 sekonda zë i njëtrajtshëm pa ndërprerë.



Mirëmbajtja e sistemit të alarmimit publik dhe testimi i tyre çdo muaj, si dhe R-L, kamerave dhe pajisjeve tjera teknike në qendër.

**Drejtores :
Medina Braha**

Prishtinë, korrik 2020
